

Zmluva o dielo č. CEZ/.....
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

objednávateľom: **Obec Veľké Úľany**
so sídlom: Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
IČO: 00306282
DIČ:2021006768
zastúpený: Ing. František Gögh DBA, starosta obce
číslo účtu: SK66 0200 0000 0000 2022 4132

(ďalej „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom: **MBM-GROUP, a.s.**
so sídlom:Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
zapísaný v: Or Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka číslo 10582/L
zastúpeným: Alenou Novákovou
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
číslo účtu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625

(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“.

I. Predmet zmluvy

- 1.1 Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v bode 1.2 tohto článku Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za dielo v súlade s čl. IV. tejto Zmluvy.
- 1.2 Dielom podľa tejto Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Cyklotrasa – III. Etapa, Veľké Úľany**“ (ďalej „**Stavba**“ alebo „**Dielo**“). Ak sa v tejto Zmluve používa pojem „**Dielo**“, myslia sa tým podľa povahy konkrétneho ustanovenia činnosti spočívajúce v uskutočnení stavebných prác vrátane dodávok materiálov, vrátane ich zabudovania v zmysle tejto Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s touto Zmluvou a projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej „**Projektová dokumentácia**“ alebo skrátené „**Projekt**“).

II. Vykonanie diela

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s Projektom za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo:
- 2.2.1 podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa,
 - 2.2.2 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 3 (ďalej len „**Rozpočet**“);
 - 2.2.3 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných prác (ďalej len „**Harmonogram**“), spracovaného Zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2;
- 2.3 Pri vykonaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však výslovne zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania Diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje čas dojednaný na jeho dokončenie, vrátane postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku II. bod 2.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhľadom na odbornosť, ktorá sa vyžaduje k realizácii diela predvídať.
- 2.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie jednotlivých položiek a vypracovanie rozpočtu tak, ako tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy zhotovenie Diela ako celku podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 2.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaistiť inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok.
- 2.7 Zhotoviteľ môže so súhlasom Objednávateľa, resp. stavebného dozoru poveriť vykonaním Diela alebo jeho častí inú osobu (ďalej „**Subdodávateľ**“) výlučne za podmienok bližšie uvedených v článku XIV tejto Zmluvy.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa a súčasne stavebný dozor na odsúhlasenie predloženého subdodávateľa na základe predložených referencií a odbornej spôsobilosti, a to minimálne 7 pracovných dní pred jeho nástupom na realizáciu jeho častí stavebných prác. Objednávateľ a stavebný dozor budú mať 5 pracovných dní na posúdenie odbornej spôsobilosti a referencií tohto subdodávateľa. V prípade že Objednávateľ, alebo stavebný dozor v stanovenom termíne neodsúhlasia takéhoto subdodávateľa, oznámia to zhotoviteľovi spolu s dôvodmi neodsúhlasenia. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na odsúhlasenie návrh nového subdodávateľa. Vykonanie akýchkoľvek prác alebo dodávok vopred riadne neodsúhlaseným subdodávateľom je zakázané, a je klasifikované ako hrubé porušenie zmluvných podmienok. Subdodávateľov, ktorých Zhotoviteľ určil vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania a títo boli prijatí spolu s ponukou, nie je potrebné opätovne predkladať na odsúhlasenie.

Zhotoviteľ bude povinný bezodkladne vymeniť akéhokoľvek subdodávateľa v celom rade ak si ten nebude plniť svoje povinnosti, najmä v oblasti bezpečnosti pri práci, pri plnení si svojich odborných povinností a bude na to upozornený písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi, alebo zápisom do stavebného denníka, a to buď stavebným dozorom, alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Na výmenu subdodávateľa sa vzťahujú schvaľovacie podmienky ako na nového subdodávateľa.

2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade:

- a) s touto Zmluvou
- b) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- c) s technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonávanie Diela,
- d) s Projektovou dokumentáciou (v poradí dôležitosti s technickými správami a následne s výkresovou dokumentáciou),
- e) s požiadavkou na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie),
- f) s Harmonogramom,
- g) s pokynmi Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy),
- h) s technologickými postupmi predpísanými výrobcou materiálu použitého pri vykonaní Diela.

2.11 Všetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarat' Zhotoviteľ.

III. Čas vykonania diela

3.1 Zhotoviteľ je povinný:

- a) začať s vykonávaním Diela podľa Harmonogramu po riadnom odovzdaní staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnutý pri podpise tejto Zmluvy ako príloha s prihliadnutím na možný termín odovzdania a prevzatia staveniska,
- b) vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme a
- c) vykonať celé Dielo v dojednanom čase podľa Harmonogramu, najneskôr do: štyroch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, a to vrátane protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov,
- d) začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prevzatia staveniska, ktoré sa uskutočnia do piatich pracovných dní po doručení výzvy na začatie stavebných prác,
- e) zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska,
- f) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré bude očiachované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatnú dohodu na odber elektrickej energie a vody, ak tieto bude zhotoviteľ odoberať z rozvodov Objednávateľa. Bez takejto písomnej dohody nebude odber vody a elektriny možný, a bude považovaný za tzv. čierny odber.

3.2 Ak Zhotoviteľ ukončí Dielo pred dojednaným časom, je Objednávateľ povinný riadne ukončené Dielo prevziať.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že čas dojednaný na vykonanie Diela a postupové termíny vykonania jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu sa predlžujú o dobu trvania nasledovných prekážok:

- a) nevhodné pokyny Objednávateľa prekážajú v riadnom vykonávaní Diela v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy;
- b) iná prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto prekážku mohol predvídať.

3.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením svojho záväzku vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Rovnako je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním Diela ako celku

Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 písm. c) tohto článku Zmluvy o viac ako 30 dní.

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške 174 166,67 EUR (slovom jednosedemdesiatštyritisícstošesťdesiatšesť/100) bez DPH 209 000,00 EUR vrátane DPH (ďalej „**Cena za dielo**“). Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z Projektu a rozpočtu, ktorý bol na základe Projektu zostavený a je prílohou č. 3 tejto Zmluvy (ďalej „**Rozpočet**“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať, aby sa určilo zvýšenie Ceny za dielo o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, náklady zahrnuté do Rozpočtu) a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať zvýšenia Ceny za dielo z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s podkladmi uvedenými v článku II. bod 2.2 tejto Zmluvy a stavom staveniska na mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhľadom na odbornosť, ktorá sa vyžaduje k realizácii diela predvídať, a to s poukazom na vyhlásenie v bode 2.4 čl. II. tejto Zmluvy). Vzhľadom na uvedené, v prípade, že vznikne potreba vykonania prác alebo dodávok pre riadne zhotovenie a ukončenie Diela, tieto je Zhotoviteľ povinný vykonať v rámci dohodnutej Ceny diela, t.j. bez nároku na jej zvýšenie.
- 4.2 Cena za dielo podlieha nasledovným úpravám:
- a) v prípade obmedzenia rozsahu Diela, rozšírenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v dôsledku pokynov Objednávateľa (bod 3 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvných strán sa Cena za dielo zníži o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela nebude vykonávať a zvýši sa o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela bude navyiac vykonávať, určenú na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak je cenu týchto častí Diela takto možné zistiť, inak o cenu určenú na základe aktuálneho cenníka stavebných prác vydávaného spoločnosťou KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak; ak zmena Diela spočíva v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela použiť, Cena za dielo sa zníži o cenu nepoužitého materiálu alebo technológie uvedenú v Rozpočte a zvýši sa o cenu použitého materiálu alebo technológie dojednanú medzi Zhotoviteľom a dodávateľom a odsúhlasenú vopred Objednávateľom,
- b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa Cena za dielo zníži (i) o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku Zmluvy vykonané, určenú podľa Rozpočtu, a (ii) v prípade, že k zániku tejto Zmluvy dôjde v dôsledku odstúpenia Objednávateľa, aj o 5% z ceny podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy; rozsah Diela vykonaného k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe Objednávateľom schválených Súpisov prác (bod 4.34 tohto článku Zmluvy); rozsah Diela vykonaného v kalendárnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe súpisu prác potvrdeného stavebným dozorcom Objednávateľa a schváleného Objednávateľom v súlade s bodom 4.3 tohto článku Zmluvy; Zhotoviteľovi nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela prípadne obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného zákonníka), ani ďalšia úhrada ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zákonníka); § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
- 4.3 Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 4.2 písm. a) tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť dohodu Zmluvných strán v písomnej forme, zohľadňujúci zmenu Ceny za Dielo vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela a postupovať podľa bodu 16.3 článku XVI. Zmluvy.
- 4.4 Nárok na zaplatenie ceny Diela vzniká Zhotoviteľovi vykonaním Diela, t.j. jeho riadnym ukončením bez väd a nedorobkov a odovzdaním Diela Objednávateľovi podľa čl. VIII. tejto Zmluvy. Cena Diela môže byť zaplatená aj na základe čiastkových faktúr za zrealizovanú časť Diela podľa rozsahu vykonania Diela v jednotlivých etapách podľa Harmonogramu. Rozsah vykonania Diela vykáže Zhotoviteľ súpisom prác potvrdeným stavebným dozorcom Objednávateľa a zostaveným v súlade s jednotlivými položkami Rozpočtu (ďalej „**Súpis prác**“),

ktorý bude tvoriť prílohu príslušnej faktúry Zhotoviteľa. Ak stavebný dozor vyjadří nesúhlas s predloženým Súpisom prác, Zmluvné strany sa dohodli, že sa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesúhlase stavebného dozoru Zhotoviteľovi stretnú za účasti: poverený zástupca Objednávateľa, stavebný dozor, stavbyvedúci a prerokujú dôvody nesúhlasu stavebného dozoru so Súpisom prác alebo jeho časťou a dohodnú sa na ďalšom postupe.

4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia, za podmienky že bola doručená kompletná, so všetkými jej náležitosťami a prílohami.

4.6 Cena za Dielo je splatná nasledovne:

- a) za vykonanie Diela alebo jeho časti na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom najskôr po vykonaní fakturovanej časti Diela podľa tejto Zmluvy, a to do 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr, ako po odstránení väd Diela zistených pri odovzdaní Diela (alebo jeho časti) v súlade s Odovzdávacím protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);
- b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa za vykonanie Diela v určitom rozsahu podľa písm. a) považuje deň zániku Zmluvy.

4.7 Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak prílohou zálohovej faktúry nie je stavebným dozorom odsúhlasený Súpis prác, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. Za deň doručenia faktúry podľa tohto článku Zmluvy sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy na základe vyzvania Objednávateľom

a) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny za Dielo, alebo

b) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo

a to ako výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

Výkonová záruka vo výške 5 % bude vystavená do odovzdania diela ako zádržné podľa všeobecných podmienok bánk. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.

4.9 Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zabezpečenia nárokov Objednávateľa z väd Diela. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené.

4.10 V prípade, ak Objednávateľovi nevznikne pohľadávka podľa bodu 4.9 v priebehu trvania Zmluvy a Zhotoviteľ odstráni všetky prípadné vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených

v odovzdávacom a preberacom protokole a Dielo bude skolaudované, bude mu Zádržné vrátené. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu zmluvných pokút, iných sankcií alebo odstránenia väd jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa.

V.

Spôsob vykonávania diela

- 5.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím dôkladne preskúmal podklady, ktoré mu Objednávateľ poskytol v rámci procesu verejného obstarávania na základe ktorého vzišiel Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy, prípadne si pozrel priamo predmet diela na tvare miesta, a že tento neobsahuje žiadne prekážky vykonania Diela. V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje upozorniť Objednávateľa na časti Projektovej dokumentácie, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce alebo dodávky, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Zmluve a Projektovej dokumentácii.
- 5.2 Objednávateľ podľa tejto Zmluvy odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa má Dielo vykonať a v čase dohodnutom podľa čl. III. bod 3.1 písm. c) tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska podľa tohto bodu Zmluvy spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol, v ktorom uvedú najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na vykonanie Diela. Nenastúpenie na odovzдание staveniska Zhotoviteľom a jeho neprevzatie sa bude považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy.
- 5.3 Pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa takého odovzdania je Zhotoviteľ povinný dôkladne stavenisko preskúmať a oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ak tieto prekážky znemožňujú vykonať Dielo dohodnutým spôsobom, a navrhnúť Objednávateľovi primeranú zmenu Diela. Akékoľvek prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ktoré neboli zistené alebo oznámené Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady.
- 5.4 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať ochranu staveniska, vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na stavenisku, pred zásahom a vstupom nepovolaných osôb vznikom škody. Objednávateľ rovnako nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prívod a dodávky elektriny, vody a ďalších energií na stavenisku po dobu vykonávania Diela, vrátane zariadenia prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými technickými normami.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť o vykonávaní Diela príslušnú dokumentáciu – stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek komplikácie vzniknuté pri vykonávaní Diela bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi a zapíše ich do stavebného denníka.
- 5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotoviteľ oprávnený postupovať pri vykonaní Diela v súlade s dielčou dokumentáciou vypracovanou Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom podľa Projektu, ak túto dokumentáciu vopred schváli Objednávateľ prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor [bod 5.14 písm. 5.14 tohto článku Zmluvy] a ak takáto dokumentácia nebude mať vplyv na zmenu Ceny diela a Harmonogramu práv na Diela.
- 5.8 Použitie zariadení a materiálov, ktoré (i) môžu mať vplyv na vonkajší alebo vnútorný vzhľad Diela, a to najmä náterov na fasádu a interiér, dlažieb, obkladov, dverí, kovaní, spínačov, vodovodných batérií, umývadiel a pod., podlieha predchádzajúcemu schváleniu vzorky takýchto

zariadení a materiálov stavebným dozorum. Doklady preukazujúce kvalitatívne parametre materiálov alebo zariadení je povinný Zhotoviteľ doručiť stavebnému dozoru min. 7 pracovných dní pred ich plánovaným dodaním, resp. zabudovaním. Ten bude mať 5 pracovných dní na ich posúdenie. Bez takéhoto schválenia nie je Zhotoviteľ oprávnený zariadenia a materiály podľa predchádzajúcej vety pri vykonávaní Diela použiť. Používanie materiálov alebo zariadení Zhotoviteľom, ktoré neboli stavebným dozorum vopred skontrolované z hľadiska kvalitatívnych parametrov a neboli odsúhlasené, bude hrubým porušením zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa.

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) na vlastné náklady vybudovať, prevádzkovať a zlikvidovať zariadenie staveniska a vypratať pozemok po vykonaní Diela,
- b) na vlastné náklady vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií, ich skladovanie a presun na stavenisko,
- c) zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach,
- d) zabezpečiť vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov,
- e) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pred zriadením staveniska vypracovať pre Objednávateľa plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- f) udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii,
- g) dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v stavebnom povolení na Dielo.

5.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela nasledovne:

- a) priebežne prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor [bod 5.14 písm. a) tohto článku Zmluvy];
- b) v dohodnutých časových obdobiach vo forme kontrolných dní, ktoré podľa potreby zvoláva stavebný dozor;
- c) na určitom stupni vykonávania Diela prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, a to vždy pred zakrytím niektorej práce pri vykonávaní Diela; na kontrolu podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a súčasne stavebný dozor pozvať najneskôr päť(5) pracovných dní pred kontrolou;
- d) dodatočne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak Zhotoviteľ v rozpore s písm. c) nepozval Objednávateľa na kontrolu na určitom stupni vykonávania Diela alebo ak účasť na kontrole podľa písm. b) alebo c) znemožnila Objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť a o ktorej informoval Zhotoviteľa do 12 hodín od zmeškanej kontroly a ak Objednávateľ o uskutočnenie dodatočnej kontroly Zhotoviteľa požiadal; Zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s vykonaním dodatočnej kontroly, vrátane nákladov na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace; Objednávateľ nemá právo na uskutočnenie dodatočnej kontroly podľa tohto písmena Zmluvy, ak ho Zhotoviteľ riadne a včas pozval na kontrolu podľa písm. c), Objednávateľ sa na tejto kontrole nezúčastnil a nepožiadaval Zhotoviteľa o uskutočnenie dodatočnej kontroly do 24 hodín od zmeškanej kontroly;
- e) mimoriadne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly majú byť zakryté práce pri vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný tieto práce odkryť; Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky náklady na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace, ibaže sa pri kontrole ukážu vady Diela týkajúce sa kontrolovaných zakrytých prác alebo dodávok.

5.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, o výsledku kontroly podľa bodu 5.10 písm. b) až e) tohto článku Zmluvy spíše zápisnicu, obsahujúcu najmä čas vykonania kontroly, údaj o tom, o aký typ kontroly podľa bodu 5.10 tohto článku Zmluvy išlo, osoby, prostredníctvom ktorých Objednávateľ kontrolu vykonal, osoby zúčastnené na kontrole za Zhotoviteľa, rozsah vykonania kontroly a výsledné zistenia.

5.12 Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo

vykonával riadnym spôsobom. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v čase stanovenom Objednávateľom a ďalej vykonávať Dielo riadnym spôsobom a v dohodnutej dobe.

- 5.13 Na základe odôvodneného pokynu Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný odvolať z práce na vykonávaní Diela určenú osobu alebo zabezpečiť, aby takúto osobu odvolal z práce na vykonávaní Diela príslušný Subdodávateľ. Pokyn podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ odôvodniť len tým, že určená osoba nevykonáva zverené práce riadne, pričom uvedie aj konkrétny príklad.
- 5.14 Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak, Stavebný dozor a zároveň osobou oprávnenou zastupovať Objednávateľa vo veciach technických bude Szabó Lászlo (tel.: 0907 155 358, adresa doručovania Kráľov Brod 291, 920 541); táto osoba je oprávnená najmä udeľovať Zhotoviteľovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovať aktualizáciu Harmonogramu (bod tejto Zmluvy), dodatok k Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadení a materiálov (bod 5.8 tohto článku Zmluvy), odsúhlasovať subdodávateľov, prijímať oznámenia a upozornenia Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a prebrať Dielo po jeho ukončení, prípadne prebrať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením.
- 5.15 Pokiaľ Zhotoviteľ neurčí inak, osobou oprávnenou zastupovať Zhotoviteľa vo veciach technických bude Ľubomír Gluščík vo funkcii stavbyvedúci, (tel.: 0903 378 759); táto osoba je oprávnená najmä prijímať pokyny Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotoviť aktualizáciu Harmonogramu (bod tejto Zmluvy), aktualizáciu Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy), dávať Objednávateľovi oznámenia a upozornenia, odovzdať Dielo Objednávateľovi po jeho ukončení, prípadne odovzdať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že (i) je ohrozená bezpečnosť Diela, životy alebo zdravie osôb pracujúcich na vykonávaní Diela alebo iných osôb, alebo hrozí iná závažná ujma a (ii) Objednávateľ nemôže osobu oprávnenú zastupovať Zhotoviteľa vo veciach technických zastihnúť, prijala pokyn Objednávateľa na okamžité prerušenie prác pri vykonávaní Diela v mene Zhotoviteľa iná osoba nachádzajúca sa na stavenisku.
- 5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný za účelom zistenia jeho spoľahlivosti a jeho trvalej spôsobilosti dodávať mu produkty a práce pri realizácii Diela v požadovanej kvalite strieť vykonanie tzv. zákaznickeho auditu svojej spoločnosti audítormi, ktorých určí Objednávateľ.

VI.

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

- 6.1 Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s Dielom a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že riadne vykonané Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.

VII.

Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy až do jeho riadneho ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi alebo tretím osobám pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy. Poistenie podľa predchádzajúcej vety nesmie byť uzavreté za nevýhodných podmienok a obsahovať ustanovenia mimo bežného rámca a musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám, a to s poistným plnením minimálne vo výške 10 % z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.
Odobzdanie diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov. Dielo sa považuje za odovzdané, keď Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s riadne ukončeným Dielom a o odovzdaní spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol v súlade s bodom 8.5 tohto článku Zmluvy.
- 8.2 Bez zbytočného odkladu po ukončení Diela je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa a súčasne stavebný dozor na prevzatie Diela, a to najneskôr pätnásť (15) pracovných dní vopred pred odovzdaním. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ písomne nevyzve Objednávateľa v zmysle tohto bodu, odovzdanie a prevzatie sa začne v pätnásty pracovný deň odo dňa keď Zhotoviteľ preukázateľne oznámi stavebnému dozoru, že Dielo má ukončené bez väd a nedorobkov. Dielo sa považuje za ukončené v zmysle tejto Zmluvy jeho odovzdaním a prevzatím, ktorého výsledkom bude protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela podpísaný: stavbyvedúcim (za zhotoviteľa), splnomocneným zástupcom Objednávateľa a stavebným dozorom.
- 8.3 Objednávateľ je povinný na výzvu Zhotoviteľa Dielo prevziať len v prípade, že:
- a) neboli zistené žiadne nedorobky
 - b) neboli zistené žiadne vady Diela; to sa netýka väd, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie) a nebránia riadnej kolaudácii Diela,
 - c) Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach a
 - d) Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov.
 - e) Zhotoviteľ zlikvidoval všetok odpad vzniknutý počas realizácie zákonným spôsobom a predložil o tom doklady
- 8.4 Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi:
- a) protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na skúšky Diela a na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri vykonaní Diela. Toto sa týka tých, ktoré nebol povinný odovzdať či už k odsúhlaseniu vopred, alebo k súpisu prác na preukázanie splnenia podmienok tejto Zmluvy, kvalitatívnych parametrov a pod.
 - b) dokumentáciu o skutočnom vyhotovení Diela vypracovanú Zhotoviteľom v jej fyzickom vyhotovení (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (formát AutoCad) a
 - c) prevádzkový manuál objektov v delení na jednotlivé funkčné časti Diela s nasledovným minimálnym obsahom:
 1. revízie a kontroly,
 2. údržba vyplývajúca z revízií a kontrol,
 3. preventívna údržba, - celkový prehľad činností,
 4. preventívna údržba – časový plán,
 5. zoznam nutných náhradných dielov, čas ich životnosti,
 6. adresy Subdodávateľov a ďalších dodávateľov,
- 8.5 O odovzdaní Diela alebo jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- a) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo alebo jeho časť vykonané v súlade s touto Zmluvou (sProjektovou dokumentáciou, pokynmi Objednávateľa, staveným povolením na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
 - b) zhodnotenie akosti odovzdávaného Diela alebo jeho časti a prípadný súpis zistených väd Diela v zmysle bodu 8.3 písm. b) tejto zmluvy,
 - c) dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených väd Diela alebo jeho časti podľa písm. b) tohto bodu a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd nebude dlhšia ako do 30 kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
 - d) zoznam protokolov, atestov a certifikátov odovzdaných spolu s Dielom alebo jeho časťou,
 - e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
 - f) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán

(ďalej „**Odovzdávací protokol**“).

- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace zariadenie staveniska najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd Diela, a to po dobu určenú v Odovzdávacom protokole.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre kolaudačné konanie týkajúce sa odovzdaného Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho Objednávateľ o poskytnutie takej súčinnosti požiada.

IX.

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela

- 9.1 Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve a ak Zhotoviteľ porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve [čl. II. bod 2.100 písm. e) tejto Zmluvy] alebo ak existujú vady v dokumentácii odovzdanej spolu s Dielom [čl. VIII. bod 8.4 tejto Zmluvy].
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie väd Diela zistených pri odovzdávaní Diela spôsobom a v lehote uvedenej v Odovzdávacom protokole. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených väd Diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstránenie zistených väd Diela, je Objednávateľ oprávnený započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
- 9.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov; záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na vykonanom Diele) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok. V prípade zariadení použitých pri vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste, platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu; táto záručná doba začne však plynúť najskôr dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu.
- 9.5 Objednávateľ je povinný podať Zhotoviteľovi správu o vadách vykonaného Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad väd Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady Diela bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady Diela v lehote primeranej povahe vady; v opačnom prípade je oprávnený zabezpečiť jej odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, primeranou lehotou pre odstránenie vady podľa predchádzajúcej vety je v prípade:
- bežných porúch, ktoré nebránia prevádzke Diela, 21 dní od podania správy o vade,
 - havarijných porúch 12 hodín od podania správy o vade.

X.
Porušenie povinností zmluvných strán

- 10.1 V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhou Zmluvnou stranou v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže Objednávateľovi vzniknúť škoda veľkého rozsahu, ktorej výšku by bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Preto si pre prípad porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako paušalizované náhrady škody) nasledovne:
- a) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vykonať Dielo v dojednanom čase v jednotlivých etapách podľa dohodnutého Harmonogramu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v prípade neodovzdania ukončeného Diela ako celku zo strany Zhotoviteľa do užívania do termínu uvedenému v čl. III. bod 3.1 písm. c) sa zmluvná pokuta stanovuje na 50% z celkových nákladov na zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania,
 - b) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku zabezpečiť odstránenie vady Diela vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade Diela až do jej odstránenia,
 - c) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vypratať stavenisko v súlade s čl. VIII. bodom 8.6 tejto Zmluvy vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania.
 - d) pre prípad porušenia povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvné pokuty tak ako je uvedené v Prílohe č.4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.2 tohto článku Zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dní od jej doručenia.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.6 Ak Zhotoviteľ zmení bez vedomia Objednávateľa technické riešenie alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s platnou dokumentáciou, určenou pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitatívne parametre hotového Diela, zaplatí Zhotoviteľ pokutu vo výške 5% z Ceny diela za každý zistený prípad. Objednávateľ má v tom prípade právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť uviesť predmet Diela, jeho zmenené riešenie, do pôvodného stavu podľa platnej Projektovej dokumentácie bezplatne.
- 10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje § 301 Obchodného zákonníka.

XI.
Záväzok mlčanlivosti

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaníach o uzavretí tejto Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto Zmluvou tretím osobám,

ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú jej z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto Zmluvy a Zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej strany.

- 11.2 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.

XII. Doručovanie a ďalšia komunikácia

- 12.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 12.2 tohto článku Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú Zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto Zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 12.2 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Adresa doručovania stavebnému dozoru je uvedená v bode 5.14 tejto zmluvy
- 12.3 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
- 12.4 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 12.1 alebo bodu 12.2 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene Zmluvnej strany písomnosti.
- 12.5 Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto Zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplatí o odstúpení od Zmluvy a iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa Zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto Zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.
- 12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa (t.z. neplatí to napr. v prípade odstúpenia od Zmluvy a v prípade iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku) a príslušné osoby sa na tom dohodnú. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 12.2 sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu Zmluvy.

- 12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Zmluvné strany vo veciach realizácie tejto Zmluvy alebo iných osôb, ak to ich povaha pripúšťa (t. z. neplatí to napr. v prípade odstúpenia od Zmluvy a v prípade iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku) a ak to pripúšťa zákon alebo táto Zmluva.
- 12.8 Každá Zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri, osobách oprávnených konať v jej mene, počte akcií, ktorých je majiteľom, a ich číselnom označení.
- 12.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy

XIII. Zánik zmluvy

- 13.1 Táto Zmluva zaniká jej zrušením dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy alebo omeškania Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním Diela ako celku Objednávateľovi o viac ako 60 dní oproti termínu uvedenému v čl. III. bod 3.1 písm. c) tejto Zmluvy,
 - b) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol,
 - c) ak nedôjde k prevzatiu staveniska Zhotoviteľom v súlade s čl. V. bod 5.2 tejto Zmluvy a začatiu stavebných prác podľa čl. III. bod 3.1 písm. a) tejto Zmluvy,
 - d) ak v prípade podľa bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotoviteľ ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednávateľom neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela alebo po ich odstránení Dielo nevykonával riadnym spôsobom a takýto postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy,
 - e) z dôvodu porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a nevykonania nápravy v lehote stanovenej Objednávateľom alebo opakovaného porušovania povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo
 - f) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela formou dodatku k Zmluve podľa čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol, alebo
 - b) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
- 13.4 Právo na odstúpenie podľa bodu 13.2 alebo 13.3 tohto článku Zmluvy alebo podľa zákona môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
- 13.5 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až od odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
- 13.6 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela,
- 13.7 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny za dielo v súlade s čl. IV. bod 4.2 písm. b) tejto Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za dielo je Objednávateľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na vrátenie zaplatených Preddavkov podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
- a) Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi všetky zaplatené Preddavky,

- b) Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti podľa tohto písmena Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
- d) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko primerane podľa článku VIII. tejto Zmluvy; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy.

XIV. Osobitné dojednania

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditú Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditú, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditú) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

14.2 Zhotoviteľ bude dodávať predmet zmluvy v rozsahu 0 % prostredníctvom subdodávateľov.

14.3 Subdodávateľa a rozsah subdodávky podľa bodu 2 tohto článku je:

Identifikácia subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO)	Rozsah plnenia subdodávateľom v (%)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Druh prác, dodávok a pod.

14.4 Na zmenu subdodávateľa sa vzťahujú podmienky uvedené v bode 2.9 tejto Zmluvy.

Článok XV. Ochrana dôverných informácií

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej Zmluvnej strany alebo inej tretej osoby (ďalej len „Dôverné informácie“), a tieto chrániť pred ich zverejnením, sprístupnením alebo poskytnutím tretej osobe. Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy, prijať

všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením, sprístupnením alebo poskytnutím tretej osobe a Dôverné informácie nezneužiť a nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami druhej Zmluvnej strany v prospech svoj alebo tretích osôb. Všetky osoby, ktoré v súvislosti s plnením tejto Zmluvy prídu alebo môžu prísť do styku s Dôvernými informáciami, je povinná každá zo Zmluvných strán zaviazat' povinnosťou ochraňovať Dôverné informácie za podmienok rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť Zmluvných strán za záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku týmto nie je dotknutá.

- 15.2 Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže Zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej Zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu. Týmto nie je dotknutá povinnosť Zmluvných strán v nevyhnutnom a v odôvodnenom rozsahu poskytnúť Dôverné informácie v prípade, ak im takúto povinnosť ukladá zákon, alebo ak na to budú zaviazaní rozsudkom, alebo akýmkoľvek iným rozhodnutím alebo aktom subjektu, ktorý je na základe zákona oprávnený prijímať takéto rozsudky, rozhodnutia alebo akty, a ak nemajú podľa zákona právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií z dôvodu porušenia záväzku mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy.
- 15.3 Záväzok mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy platí po dobu existencie Dôverných informácií, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, pokiaľ nebude záväzku mlčanlivosti Zmluvná strana skôr písomne zbavená.
- 15.4 Pre účely tejto Zmluvy výraz „Dôverné informácie“ znamená:
- a) všetkyskutočnosti, údaje a informácie obchodnej, výrobnjej, technickej, finančnej, organizačnej, marketingovej alebo akejkoľvek inej povahy súvisiace s podnikom a podnikaním Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, ktoré majú skutočnú a preukázateľnú materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch, v ktorých Objednávateľ alebo Zhotoviteľ pôsobí alebo bude pôsobiť, bežne dostupné a ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka; tieto skutočnosti nemusia byť výslovne označené ako dôverné; alebo
 - b) všetky iné skutočnosti, údaje a informácie obchodnej, výrobnjej, technickej, finančnej, organizačnej, marketingovej alebo akejkoľvek inej povahy súvisiace s podnikom a podnikaním Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, ktoré podľa vôle Objednávateľa alebo Zhotoviteľa majú byť utajené a sú označené ako dôverné;
 - c) všetky údaje o Zmluvných stranách, či tretích osobách, majúcich charakter osobných údajov podľa ustanovení platných právnych predpisov;
 - d) informácie, ktoré sú legislatívou definované ako dôverné.
- 15.5 Dôverné informácie sú v plnom rozsahu dôverné a tajné, bez ohľadu na ich pôvod, povahu, druh, obsah a/alebo formu.
- 15.6 Pri ochrane Dôverných informácií sú Zmluvné strany povinné najmä sa zdržať konania, ktorým by tretej osobe neoprávnene, t.j. bez predošlého písomného súhlasu štatutárneho orgánu druhej Zmluvnej strany, poskytlí, oznámili, sprístupnili, pre seba alebo pre tretiu osobu využili Dôverné informácie, o ktorých sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom.
- 15.7 Zmluvná strana je oprávnená použiť Dôverné informácie výlučne v rámci plnenia tejto Zmluvy, pričom je povinná dodržiavať všetky postupy a pravidlá druhej Zmluvnej strany určené na ochranu Dôverných informácií a kedykoľvek vykonať akékoľvek dodatočné opatrenia potrebné na zachovanie a ochranu akejkoľvek Dôvernej informácie.
- 15.8 V prípade, že si Zmluvná strana nie je istá, či majú byť akékoľvek skutočnosti alebo informácie podľa vôle druhej Zmluvnej strany utajené, je povinná si pred ich poskytnutím, oznámením alebo sprístupnením tretej osobe na to vyžiadať písomný súhlas druhej Zmluvnej strany.
- 15.9 Zmluvné strany sú v plnom rozsahu zodpovedné za akékoľvek porušenie záväzkov uvedených v tomto článku Zmluvy alebo v právnych predpisoch, ktoré môžu byť spôsobené nimi samými, ako aj ich zamestnancami, manažérmi alebo inými fyzickými osobami, právnickými osobami a/alebo subjektmi najatými alebo používanými v akejkoľvek forme alebo na základe akýchkoľvek dôvodov druhou zmluvnou stranou.
- 15.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu a táto Zmluva vrátane jej príloh bude zverejnená na webovom sídle v zmysle platných právnych predpisov, s čím Zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Zhotoviteľ výslovne potvrdzuje, že Zmluva vrátane jej príloh neobsahuje Dôverné informácie. Ak ku zverejneniu dôjde, Zhotoviteľovi

nevznikajú v dôsledku tejto skutočnosti žiadne nároky vyplývajúce mu z tohto článku Zmluvy voči Objednávateľovi, nakoľko táto skutočnosť sa nepovažuje za porušenie záväzku mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy.

XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) príloha č. 1 – Projektová dokumentácia,
 - b) príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavebných prác,
 - c) príloha č. 3 – Rozpočet
 - d) príloha č. 4 – Zmluvné pokuty týkajúce sa ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, ako i iných povinností
 - e) Príloha č. 5 – Poistenie zodpovednosti za škody
- Prílohy č. 2 až 5 sú fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiež fyzicky pripojený obsah prílohy č. 1, z ktorého vyplýva základné členenie a rozsah Projektovej dokumentácie; skutočnosť, že príloha č. 1 nie je fyzicky pripojená k tejto Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 16.3 Túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona.
- 16.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahraďovať neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku.
- 16.5 Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a tri rovnopisy pre Objednávateľa.
- 16.6 Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
- 16.7 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy, alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy predložia na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu SR.
- 16.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a konečným prijímateľom pomoci.
- 16.9 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle (internetovej stránke) Obce Veľké Úľany.
- 16.10 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovanej zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (príp. v Obchodnom vestníku).

Vo Veľkých Mníchoch, dňa 04.12.2020

V Námestove, dňa 09.09.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Alena Nováková,
predseda predstavenstva MBM – GROUP, a. s.



Handwritten signature of Alena Nováková.

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ⑩

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020/025ZM
Stavba: Cyklotrasa -III etapa Veľké Úľany

JKSO:
Miesto: Veľké Úľany

Objednávateľ:
Obec Veľké Úľany

Zhotoviteľ:
MBM- GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 23. 10. 2020

IČO: 00306282
IČ DPH:

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			174 166,67
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	174 166,67	34 833,33
Cena s DPH v EUR			209 000,00

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ¹⁰

C

O

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020/025ZM

Stavba: Cyklotrasa -III etapa Veľké Úľany

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 23. 10. 2020

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		174 166,67	209 000,00
1	SO 01 Búracie práce	28 396,63	34 075,96
2	SO 02 Cyklotrasa architektúra	145 770,04	174 924,05


MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 

C

C

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa -III etapa Velké Úľany

Objekt:

1 - SO 01 Búracie práce

JKSO:

Miesto: Velké Úľany

KS:

Dátum: 23. 10. 2020

Objednávateľ:

Obec Velké Úľany

IČO:

00306282

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 396,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	28 396,63	20,00%	5 679,33

Cena s DPH v EUR 34 075,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 (10)

(

(

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa -III etapa Velke Úľany

Objekt:

1 - SO 01 Búracie práce

Miesto: Velké Úľany

Dátum: 23. 10. 2020

Objednávateľ: Obec Velké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 396,63

HSV - Práce a dodávky HSV

28 396,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 396,63


MBM GROUP, a.s.
Hviezdoslavská nám. 213
029 01 Námestovo
IČO 36 740 519 ⑩

C

C

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa -III etapa Velke Úľany

Objekt:

1 - SO 01 Búracie práce

Miesto: Velké Úľany

Dátum: 23. 10. 2020

Objednávateľ: Obec Velké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 396,63

D HSV Práce a dodávky HSV

28 396,63

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 396,63

1	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 798,000	4,21	7 569,58
2	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 798,000	1,09	1 959,82
3	K	113202110	Prekladka telefónneho stĺpa a osadenie	ks	1,000	800,00	800,00
4	K	1132021112	Ostranenie stromov a koreňe kmeňov do 250 mm	ks	56,000	20,15	1 128,40
5	K	1132021113	Odstranenie betónové stĺpy - podperny	ks	6,000	150,00	900,00
6	K	1132021114	Odstranenie stĺp pre verejného rozhlasu	ks	1,000	701,87	701,87
7	K	1132021115	Odstranenie sriňa domového plynomeru a spätná montáž plynomeru	ks	5,000	550,00	2 750,00
8	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2 103,634	2,21	4 649,03
9	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1 529,465	0,45	688,26
10	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 11,5 km	t	1 529,465	1,37	2 095,37
11	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 529,465	1,37	2 095,37
12	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1 529,465	2,00	3 058,93

C

C

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa -III etapa Velké Úřany

Objekt:

2 - SO 02 Cyklotrasa architektúra

JKSO:

Miesto: Velké Úřany

KS:

Dátum: 23. 10. 2020

Objednávateľ:

Obec Velké Úřany

IČO:

00306282

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM- GROUP, a.s

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **145 770,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	145 770,04	20,00%	29 154,01

Cena s DPH **v EUR** **174 924,05**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

C

(

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa -III etapa Veľke Úľany

Objekt:

2 - SO 02 Cyklotrasa architektúra

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 23. 10. 2020

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

145 770,04

HSV - Práce a dodávky HSV

145 770,04

1 - Zemné práce

8 786,73

2 - Zakladanie

354,84

5 - Komunikácie

123 460,48


9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 364,27

99 - Presun hmôt HSV

803,72

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

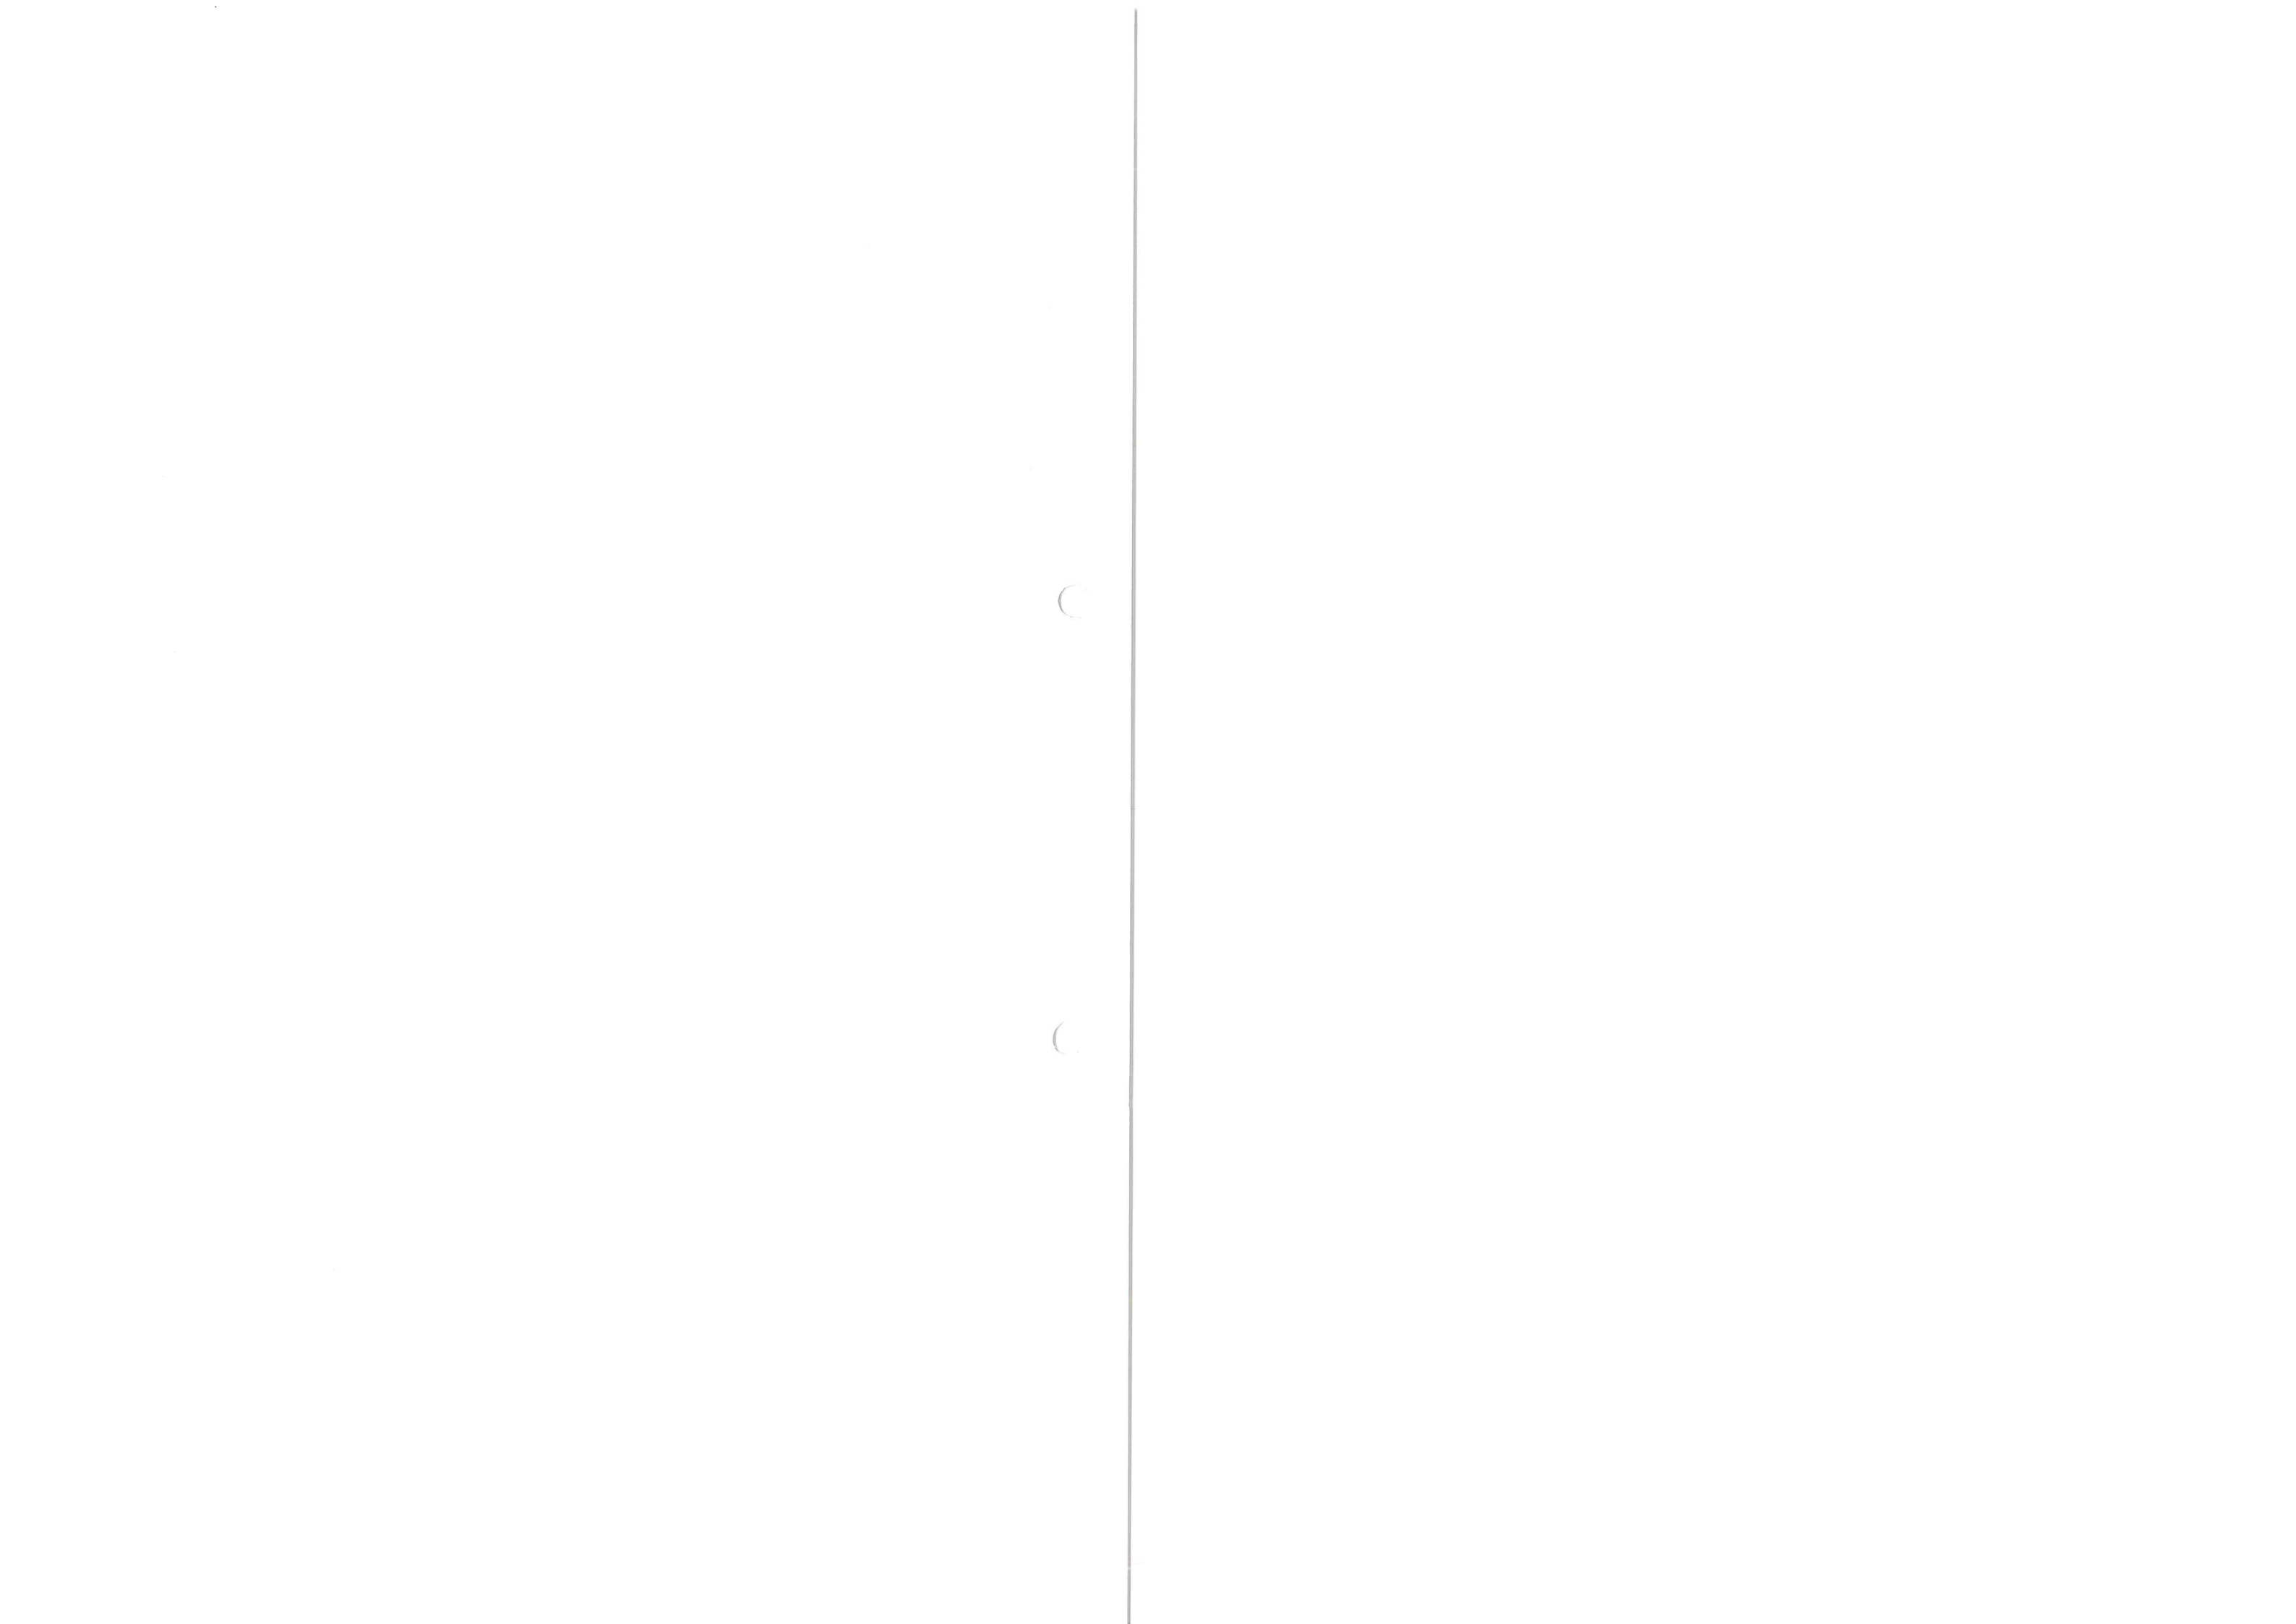

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa -III etapa Veľké Úľany

Objekt:

2 - SO 02 Cyklotrasa architektúra

Miesto: Veľké Úľany

Dátum: 23. 10. 2020

Objednávateľ: Obec Veľké Úľany

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM- GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

145 770,04

D HSV Práce a dodávky HSV **145 770,04**

D 1 Zemné práce **8 786,73**

1	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 034,950	1,56	1 614,52
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	1 034,950	0,10	103,50
3	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1 034,950	1,40	1 448,93
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 11,5 km	m3	1 034,950	2,04	2 111,30
5	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 034,950	0,19	196,64
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 655,920	2,00	3 311,84

D 2 Zakladanie **354,84**

7	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 957,000	0,12	354,84
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

D 5 Komunikácie **123 460,48**

8	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 0-32 hr. 150 mm	m2	2 957,000	5,90	17 446,30
9	K	567123811	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 mm	m2	2 957,000	6,80	20 107,60
	K	573231109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	5 914,000	0,30	1 774,20
11	K	577144451	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P, II. v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 957,000	10,50	31 048,50
12	K	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 957,000	11,60	34 301,20
13	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 840,000	7,00	12 880,00
14	M	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	1 858,400	1,35	2 508,84
15	K	916361111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	240,000	10,00	2 400,00
16	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, 1xšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	242,400	4,10	993,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **12 364,27**

17	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	7,000	39,46	276,22
18	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	7,000	6,14	42,98
19	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	7,000	3,15	22,05
20	M	404440000200	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	7,000	2,63	18,41
21	M	404410113600	информативна превозкова знака tr 1 (pre cestu pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	25,39	50,78
22	M	404410095900	Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	31,30	31,30

C

C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	404410098900	Príkazová značka C18 (Koniec príkazu), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	31,30	31,30
24	M	404410097100	Príkazová značka C12 (Cestička pre vyznačených užívateľov), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	31,30	62,60
25	M	404410090900	Príkazová značka C18 (Koniec príkazu), rozmer 500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	25,20	25,20
26	K	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	206,107	11,70	2 411,45
27	M	246110000200	Lak olejový, živičný, bezfarebný O 1103	kg	927,482	3,60	3 338,94
28	K	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	155,988	17,82	2 779,71
29	M	246110000200	Lak olejový, živičný, bezfarebný O 1103	kg	701,946	3,60	2 527,01
30	K	914811111	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	8,000	0,20	1,60
31	M	404450006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	8,000	15,00	120,00
32	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	38,000	1,44	54,72
33	M	404410054400	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	7,000	15,00	105,00
34	M	404410054700	Zákazová značka B31b (Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	7,000	15,00	105,00
35	M	404410000500	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	11,000	15,00	165,00
36	M	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	11,000	15,00	165,00
37	M	404410086900	Príkazová značka C6b (Príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	15,00	30,00
D	99		Presun hmôt HSV				803,72
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 771,445	0,29	803,72

Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3 Rozpočet

Príloha č. 4 Zmluvné pokuty

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo			
Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom v prípade, že je relevantné			
	Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €)	Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)
	Zhotoviteľ svojvoľne zabuduje iný materiál alebo zariadenie ako to ktoré vyplýva zo zmluvy o dielo alebo z projektovej dokumentácie. Táto pokuta nemá vplyv na skutočnosť že zhotoviteľ bude povinný dodať alebo namontovať to, čo vyplýva zo zmluvy o dielo alebo PD. Toto sa vzťahuje na každý materiál alebo zariadenie jednotlivo a samostatne.	10% z hodnoty takéhoto materiálu	50% z hodnoty takéhoto materiálu
	Dokumentácia, pracovné povolenia		
	Zhotoviteľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Zhotoviteľa preukázateľne zúčastnil školenia o BOZP (v súlade s internými smernicami Zhotoviteľa)	200 €	500 €
	Zhotoviteľ nemá plán BOZP, alebo tento plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom Objednávateľa.	200 €	500 €
	Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje Zhotoviteľovi právny predpis), alebo Zhotoviteľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklad o ohlásení.	200 €	500 €
	Pracovníci Zhotoviteľa nedisponujú platným lekárskeym posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	150 €/osoba	250 €/osoba
	Zhotoviteľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na	200 €	500 €

obsluhu VTZ, strojov, zväračský preukaz a pod.)		
Zhotoviteľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.	150 €	200 €
Pracovný poriadok na mieste výkonu práce –pracovisku/stavenisku		
Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený činnosťou Zhotoviteľa	150 €	200 €
Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku/stavenisku sú blokované, pričom uvedené spôsobil Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ	150 €	200 €
Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	150 €	200 €
Uskladnenie materiálov na pracovisku/stavenisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klince alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie sú k dispozícii pracovníci Zhotoviteľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.	150 €	200 €
Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnička - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	150 €	200 €
Na stavenisku nemajú pracovníci Zhotoviteľa k dispozícii toalety a hygienické prípravky.	150 €	200 €
Pracovníci Zhotoviteľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu.	150 €	200 €

Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.)	200 €	500 €
Zhotoviteľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil šatne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie - chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.	200 €	500 €
Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybujú vysokozdvížne vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	150 €	200 €
Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku, alebo sa nezdržuje na mieste.	150 €	200 €
Chemická bezpečnosť		
Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	150 €	200 €
Zhotoviteľ nemá kartu bezpečnostných údajov (KBU) nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBU preukázateľne oboznámený	150 €	200 €
Rebríky		
Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	150 €	200 €
Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmyklivé.	150 €	200 €
Päty rebríka nie sú stabilné.	150 €	200 €

Diely viacdielných rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.	150 €	200 €
Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	150 €	200 €
Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	150 €	200 €
Oporný rebrík neprevyšuje miesto dôrazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytka.	150 €	200 €
Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytanie.	150 €	200 €
Pojazdné rebríky nie sú zabrzdzené.	200 €	500 €
Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	150 €	200 €
Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarom		
Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	450 €	1000 €
Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Zhotoviteľa.	200 €	500 €
Zhotoviteľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	200 €	500 €
Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.	150 €	200 €
V prípade oblúkového zvárania sa nepoužíva ochranný štít a zväračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky	200 €	500 €

	(vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).		
	Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zváranie.	150 €	200 €
	Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z dôvodu na strane Zhotoviteľa.	150 €	200 €
	Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	500 €
	Neakčieschopný hasiaci prístroj.	150 €	200 €
	Fajčenie.	500 €	1000 €
Plynové fľaše			
	Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).	150 €	200 €
	Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.	150 €	200 €
	Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.	150 €	200 €
	V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.	150 €	200 €
Pracovná plocha			
	Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.	150 €	200 €

	Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zapríčinené Zhotoviteľom.	150 €	200 €
	Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	200 €	500 €
Práce vo výškach			
	Chýba dvojradové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).	200 €	500 €
	Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	500 €
	Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	200 €	500 €
	Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná: Náčrt konštrukcie Návrh lešenia, Všeobecná dokumentácia o konštrukcii, Uvedenie do prevádzky Periodická revízia.	200 €	500 €
	Voľná, nezhutnená pôda pod lešením.	150 €	200 €
	Nie je vyvesená nosnosť a Zhotoviteľ lešenia.	150 €	200 €
	Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	200 €	500 €
	Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	500 €	1000 €
	Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	150 €	200 €
	Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému	200 €	500 €

	bodú upevnenia.		
	Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	150 €	200 €
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)			
	Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	150 €	200 €
	Každý pracovník nemá ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	150 €	200 €
	Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
	Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	150 €	200 €
	Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
	Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
	Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka: antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
	Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Zemné práce			
	Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	500 €

	Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HS E je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	200 €	500 €
Presun materiálu, žeriavové práce			
	Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	500 €	1000 €
	Oblasť zdvíhu nie je ohraničená.	200 €	500 €
	Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	150 €	200 €
	Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výt'ah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	90 €	200 €
	Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	150 €	200 €
	Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).	200 €	500 €
	Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	150 €	200 €
	V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).	200 €	500 €

Elektrické zariadenia, elektrické prístroje			
	Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	200 €	500 €
	Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	200 €	500 €
	Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.	200 €	500 €
	Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.	150 €	200 €
	Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni pôdy.	200 €	500 €
	Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.	150 €	200 €
	Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	200 €	500 €
Mechanické ručné náradie			
	Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, mastné -špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).	150 €	200 €
Ochrana životného prostredia			
	Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny Zhotoviteľa.	2000 €	15 000 €

	Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.	200 €	500 €
	Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.	200 €	500 €
	Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného Objednávateľom.	200 €	500 €
	Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou Zhotoviteľa.	200 €	500 €

V *Veľkých Úľanoch* dňa *09.09.2020*

V Námestove, dňa 09.09.2020

Objednávateľ:







Zhotoviteľ: Alena Nováková, predseda predstavenstva MBM – GROUP, a. s.




Poistný certifikát

k poistnej zmluve č.: 421-L-17-54-0608

Poisťovateľ: MSIG Insurance Europe AG so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika, číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277, IČO: DE815374655 Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Akihiko Ikeno podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) so sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169 Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura		
Poistník/ poistený: MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo IČO: 36 740 519		
Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:		
Poistná zmluva č.: 421-L-17-54-0608	Začiatok poistenia: 22.03.2017, 00:00 hod.	Koniec poistného obdobia: 21.03.2021, 24:00 hod. Poistná zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie poistné obdobie, pokiaľ nie je písomne vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
Druh poistenia: Zodpovednosť z prevádzky a za výrobok	Poistná suma/ limit poistného plnenia: Eur 1.370.000,- paušálne pre škody na zdraví a vecné škody spolu, max. 2 krát za poistné	
Popis rizika/ poistené činnosti Pod poistenie v rozsahu podmienok, poistných súm/ limitov a sublimitov podľa poistnej zmluvy, poistných podmienok a osobitných dojednaní, spadá zodpovednosť za škody z prevádzky a z vadného výrobku, vrátane zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľností a priamych následných škôd (ušlý zisk). Rozšírenia poistného krytia obsahujú: - regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní Sublimit: Eur 60.000,- - škody na nadzemných alebo podzemných vedeniach Sublimit: Eur 100.000,- - škody v dôsledku vibrácií, demolačných alebo búracích prác alebo škody z odstrelovania Sublimit: Eur 100.000,-		
Územná pôsobnosť: Poistná ochrana platí pre škody, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky	Poistné podmienky: Všeobecné a doplnujúce všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ H0904.3.2 SK)	
Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedoplnuje, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.		
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2110/B  Mgr. Radovan Figura vedúci organizačnej zložky		 V Bratislave dňa 30.07.2020  Ing. Vladimír Galanda underwriter

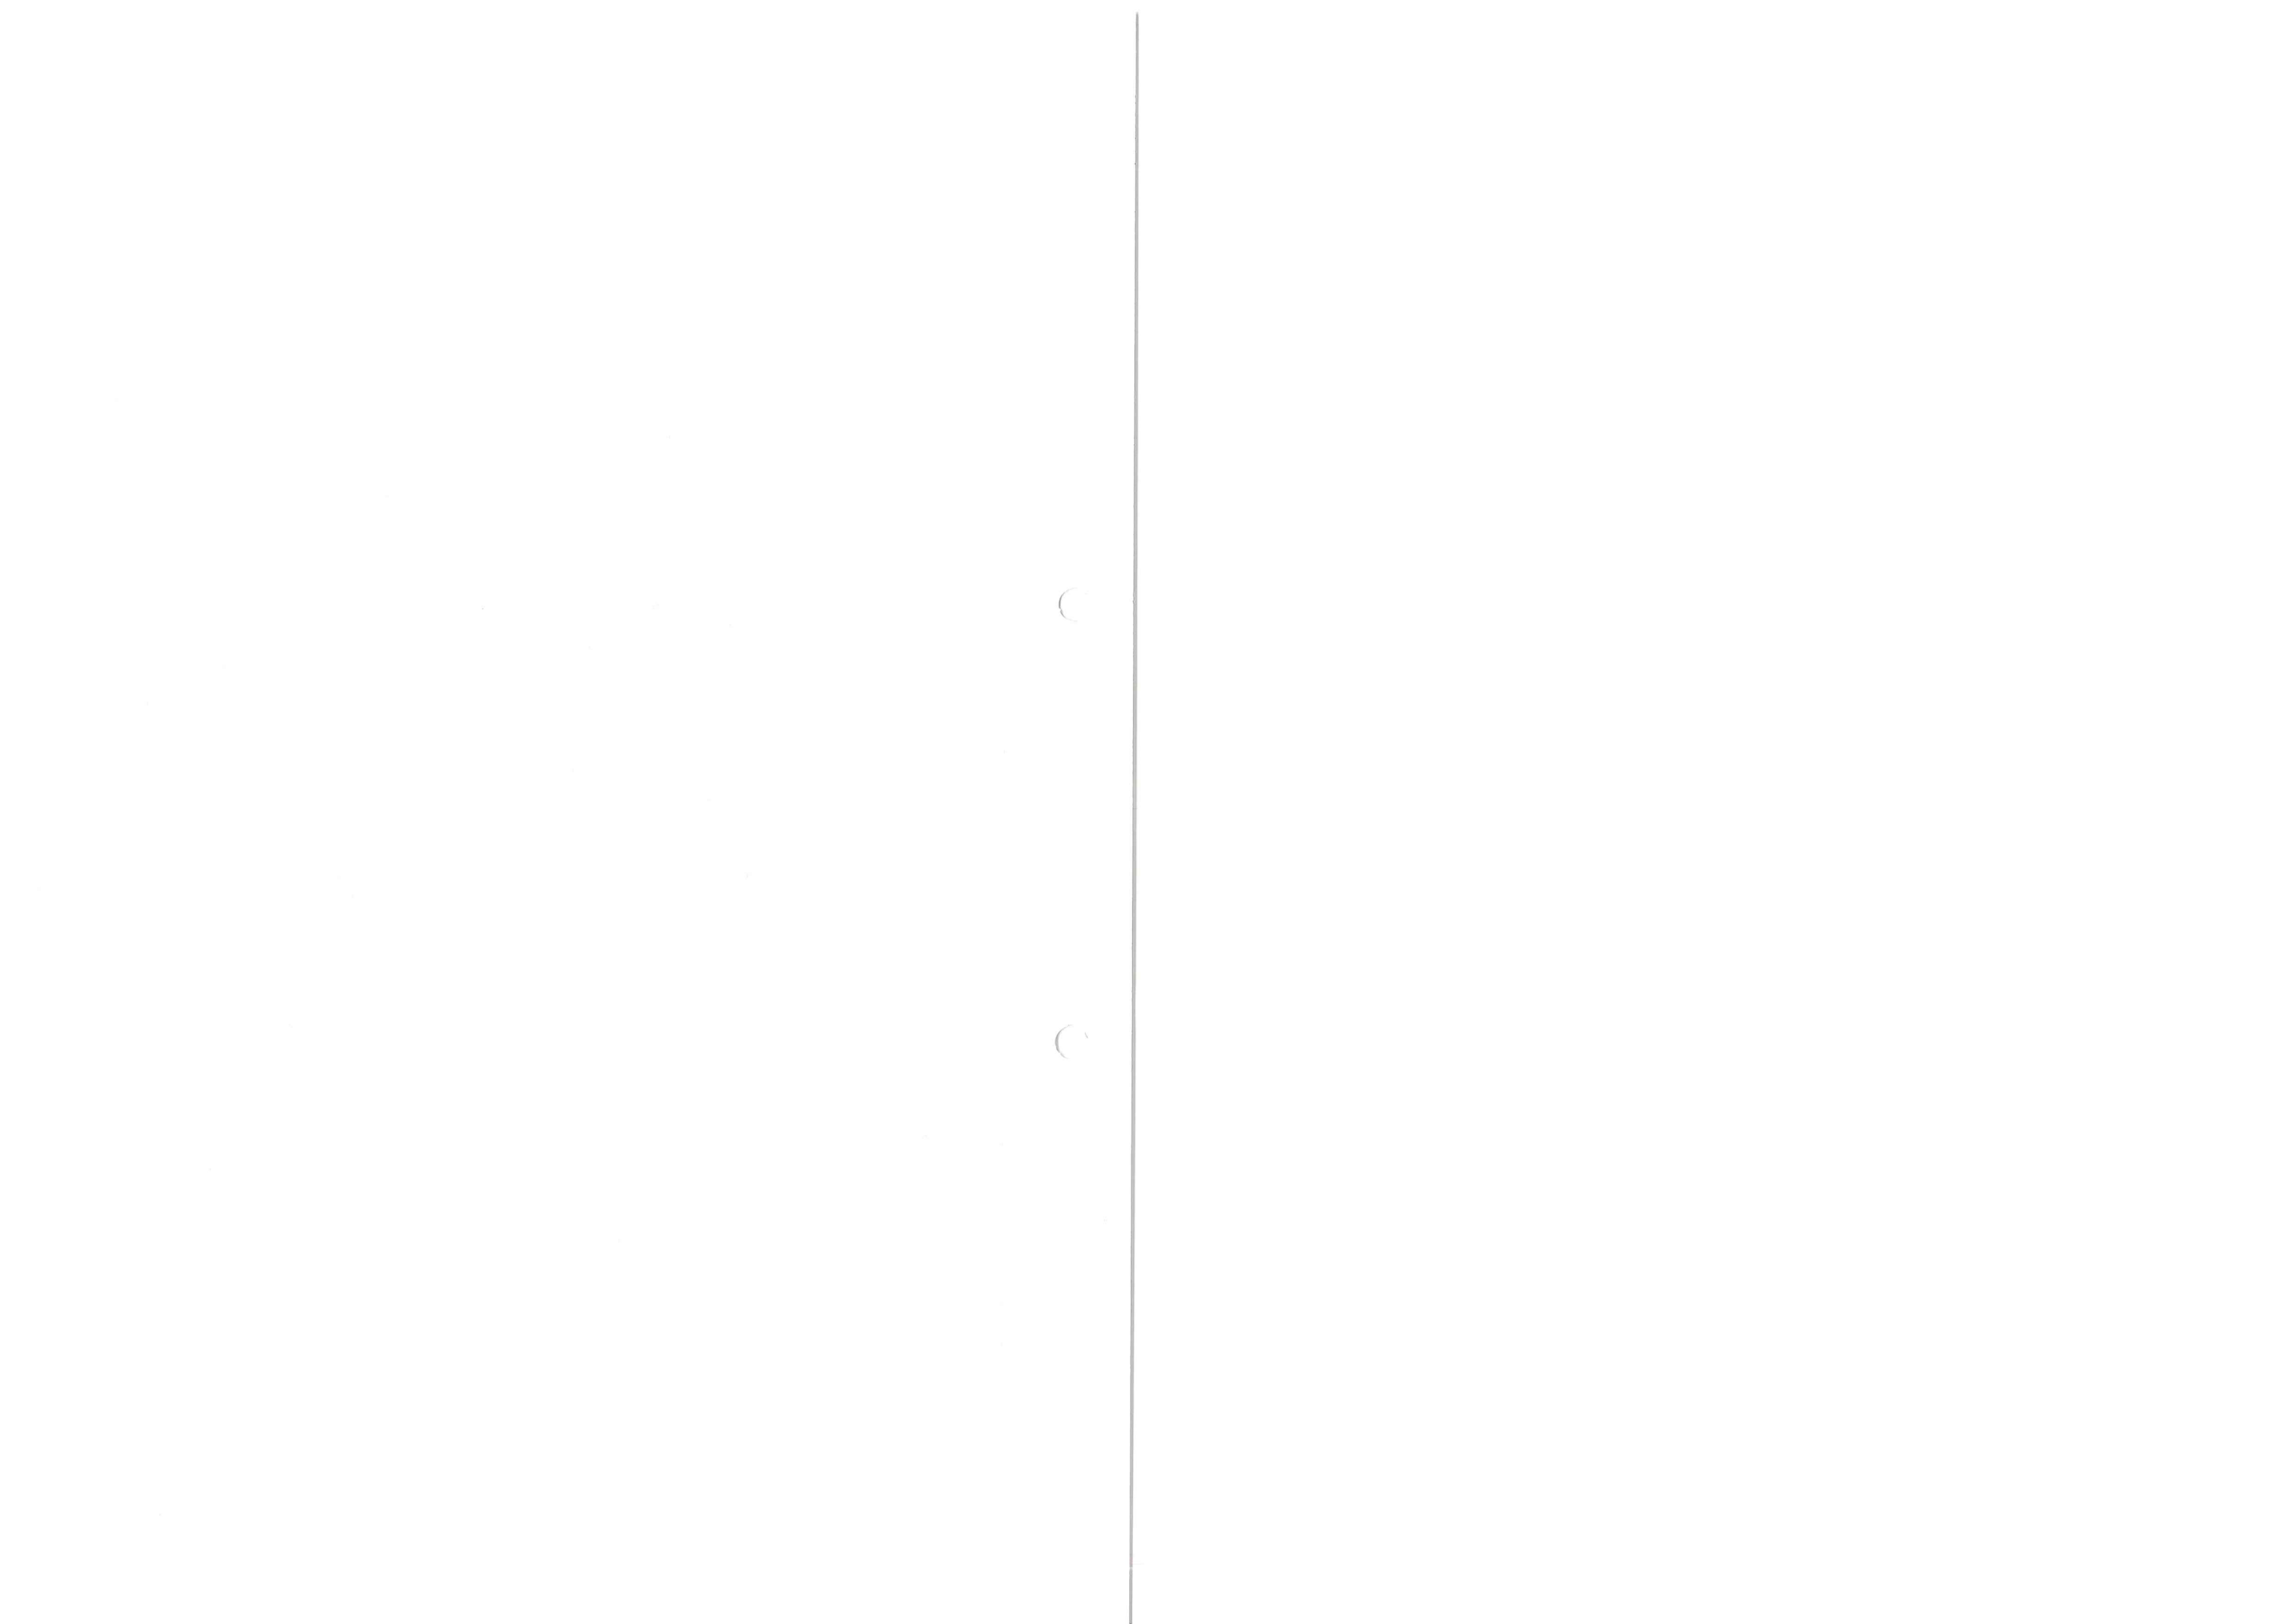

nbn-group a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
ICO: 36 740 519 ⑦






CYKLOTRASA – III. ETAPA, VELKÉ ÚLANY

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE

V Topolnici, Október 2019

Ing. Zoltán Zeman



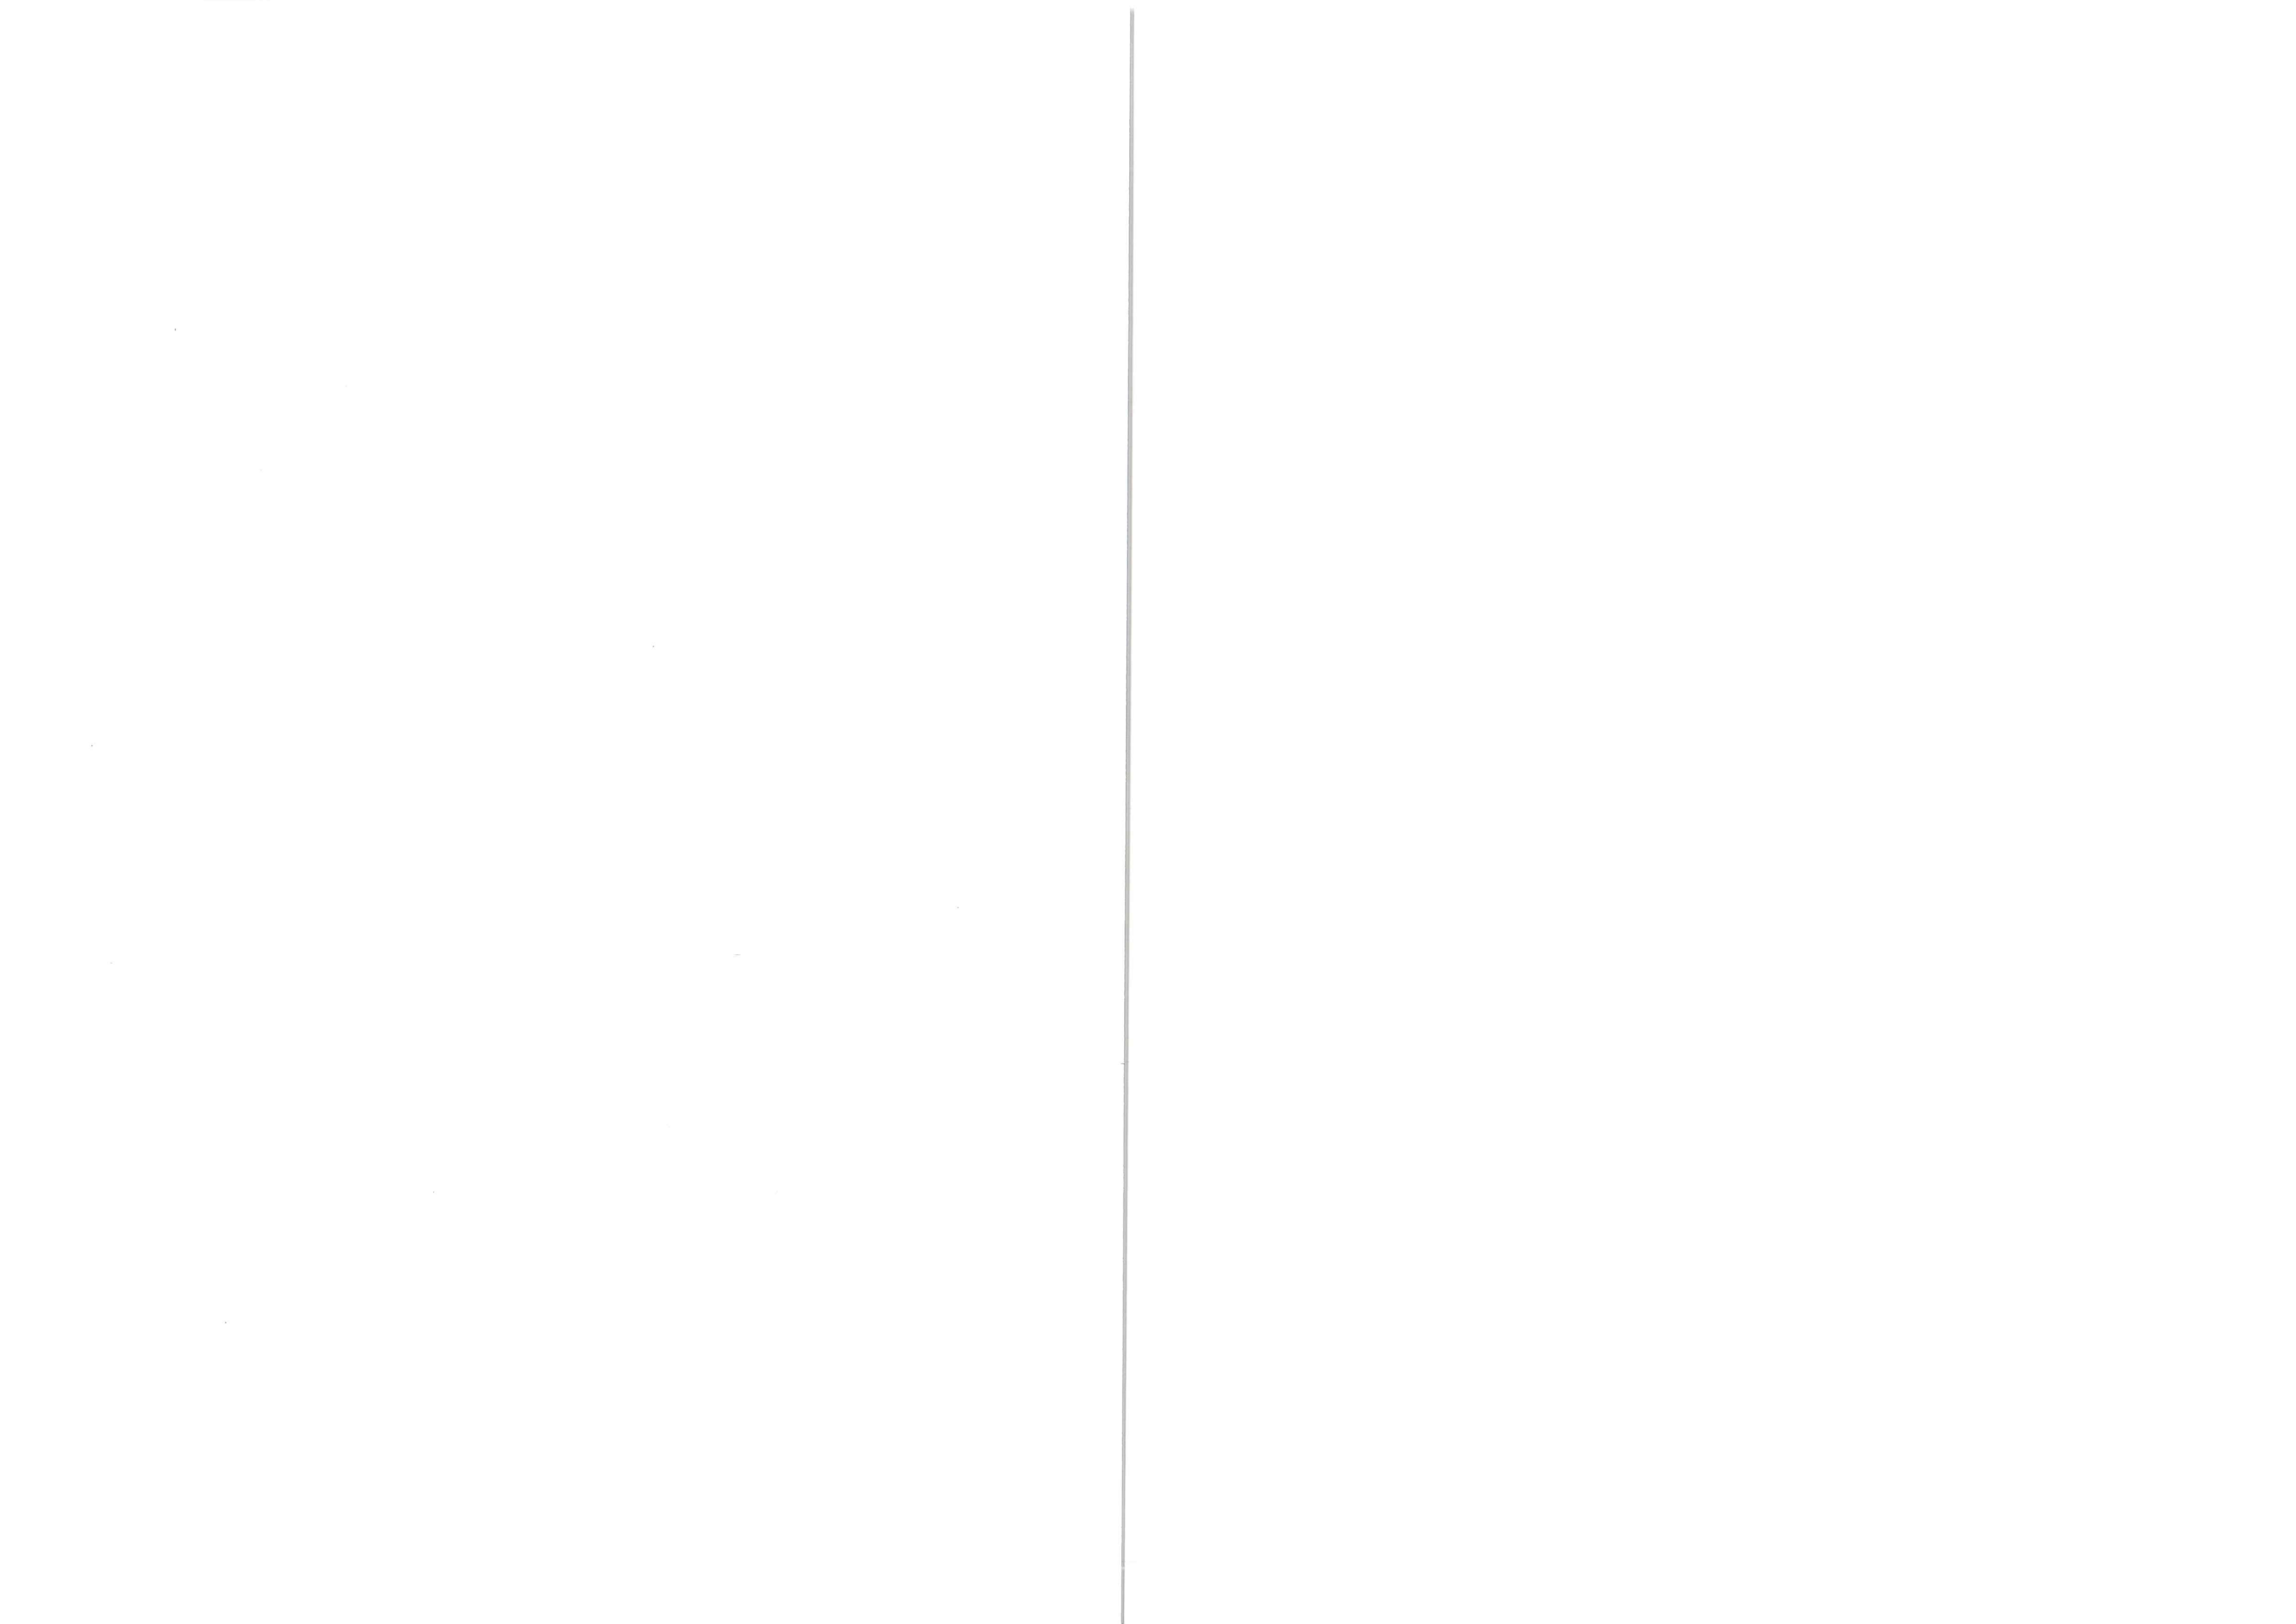


CYKLOTRASA – III. ETAPA, VEĽKÉ ÚĽANY

Technická správa


**1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY
A INVESTORA**

Názov stavby	CYKLOTRASA – III. ETAPA, VEĽKÉ ÚĽANY
Miesto stavby	k. ú. Veľké Úľany
Parcely č.	KN-E: 601/3, 4996/1 KN-C: 4870/4, 4870/11, 4870/12, 4955/2
Kraj	Trnavský
okres	Galanta
Katastrálne územie	k. ú. Veľké Úľany

Objednávateľ	Obec Veľké Úľany	
Hlavný projektant stavby:	Ing. arch. Ing. Ján Kováč	
Zodpovedný projektant:	<p>DOPRAVA</p> <p>K&Z Project, s.r.o. Topoľnica 28 925 92 Topoľnica</p> <p>kzproject@wmx.sk tel. 0918 371 959</p>	
Zodp. projektant	Ing. Z. Zeman	
Kreslili	K. Zemanová M. Zeman	
		<p>Spracovateľ projektovej dokumentácie má v zmysle zákona č. 138/1992 Z. z. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. oprávnenie vykonávať túto činnosť a je zapísaný v zozname autorizovaných inžinierov pod č. 1560*Å*4-21 v kategórii Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská a je registrovaný v príslušnom registri SKSI.</p>
Stupeň dokumentácie	Projektstavby pre stavebné konanie	
Druh stavby	Inžinierska stavba	

PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE



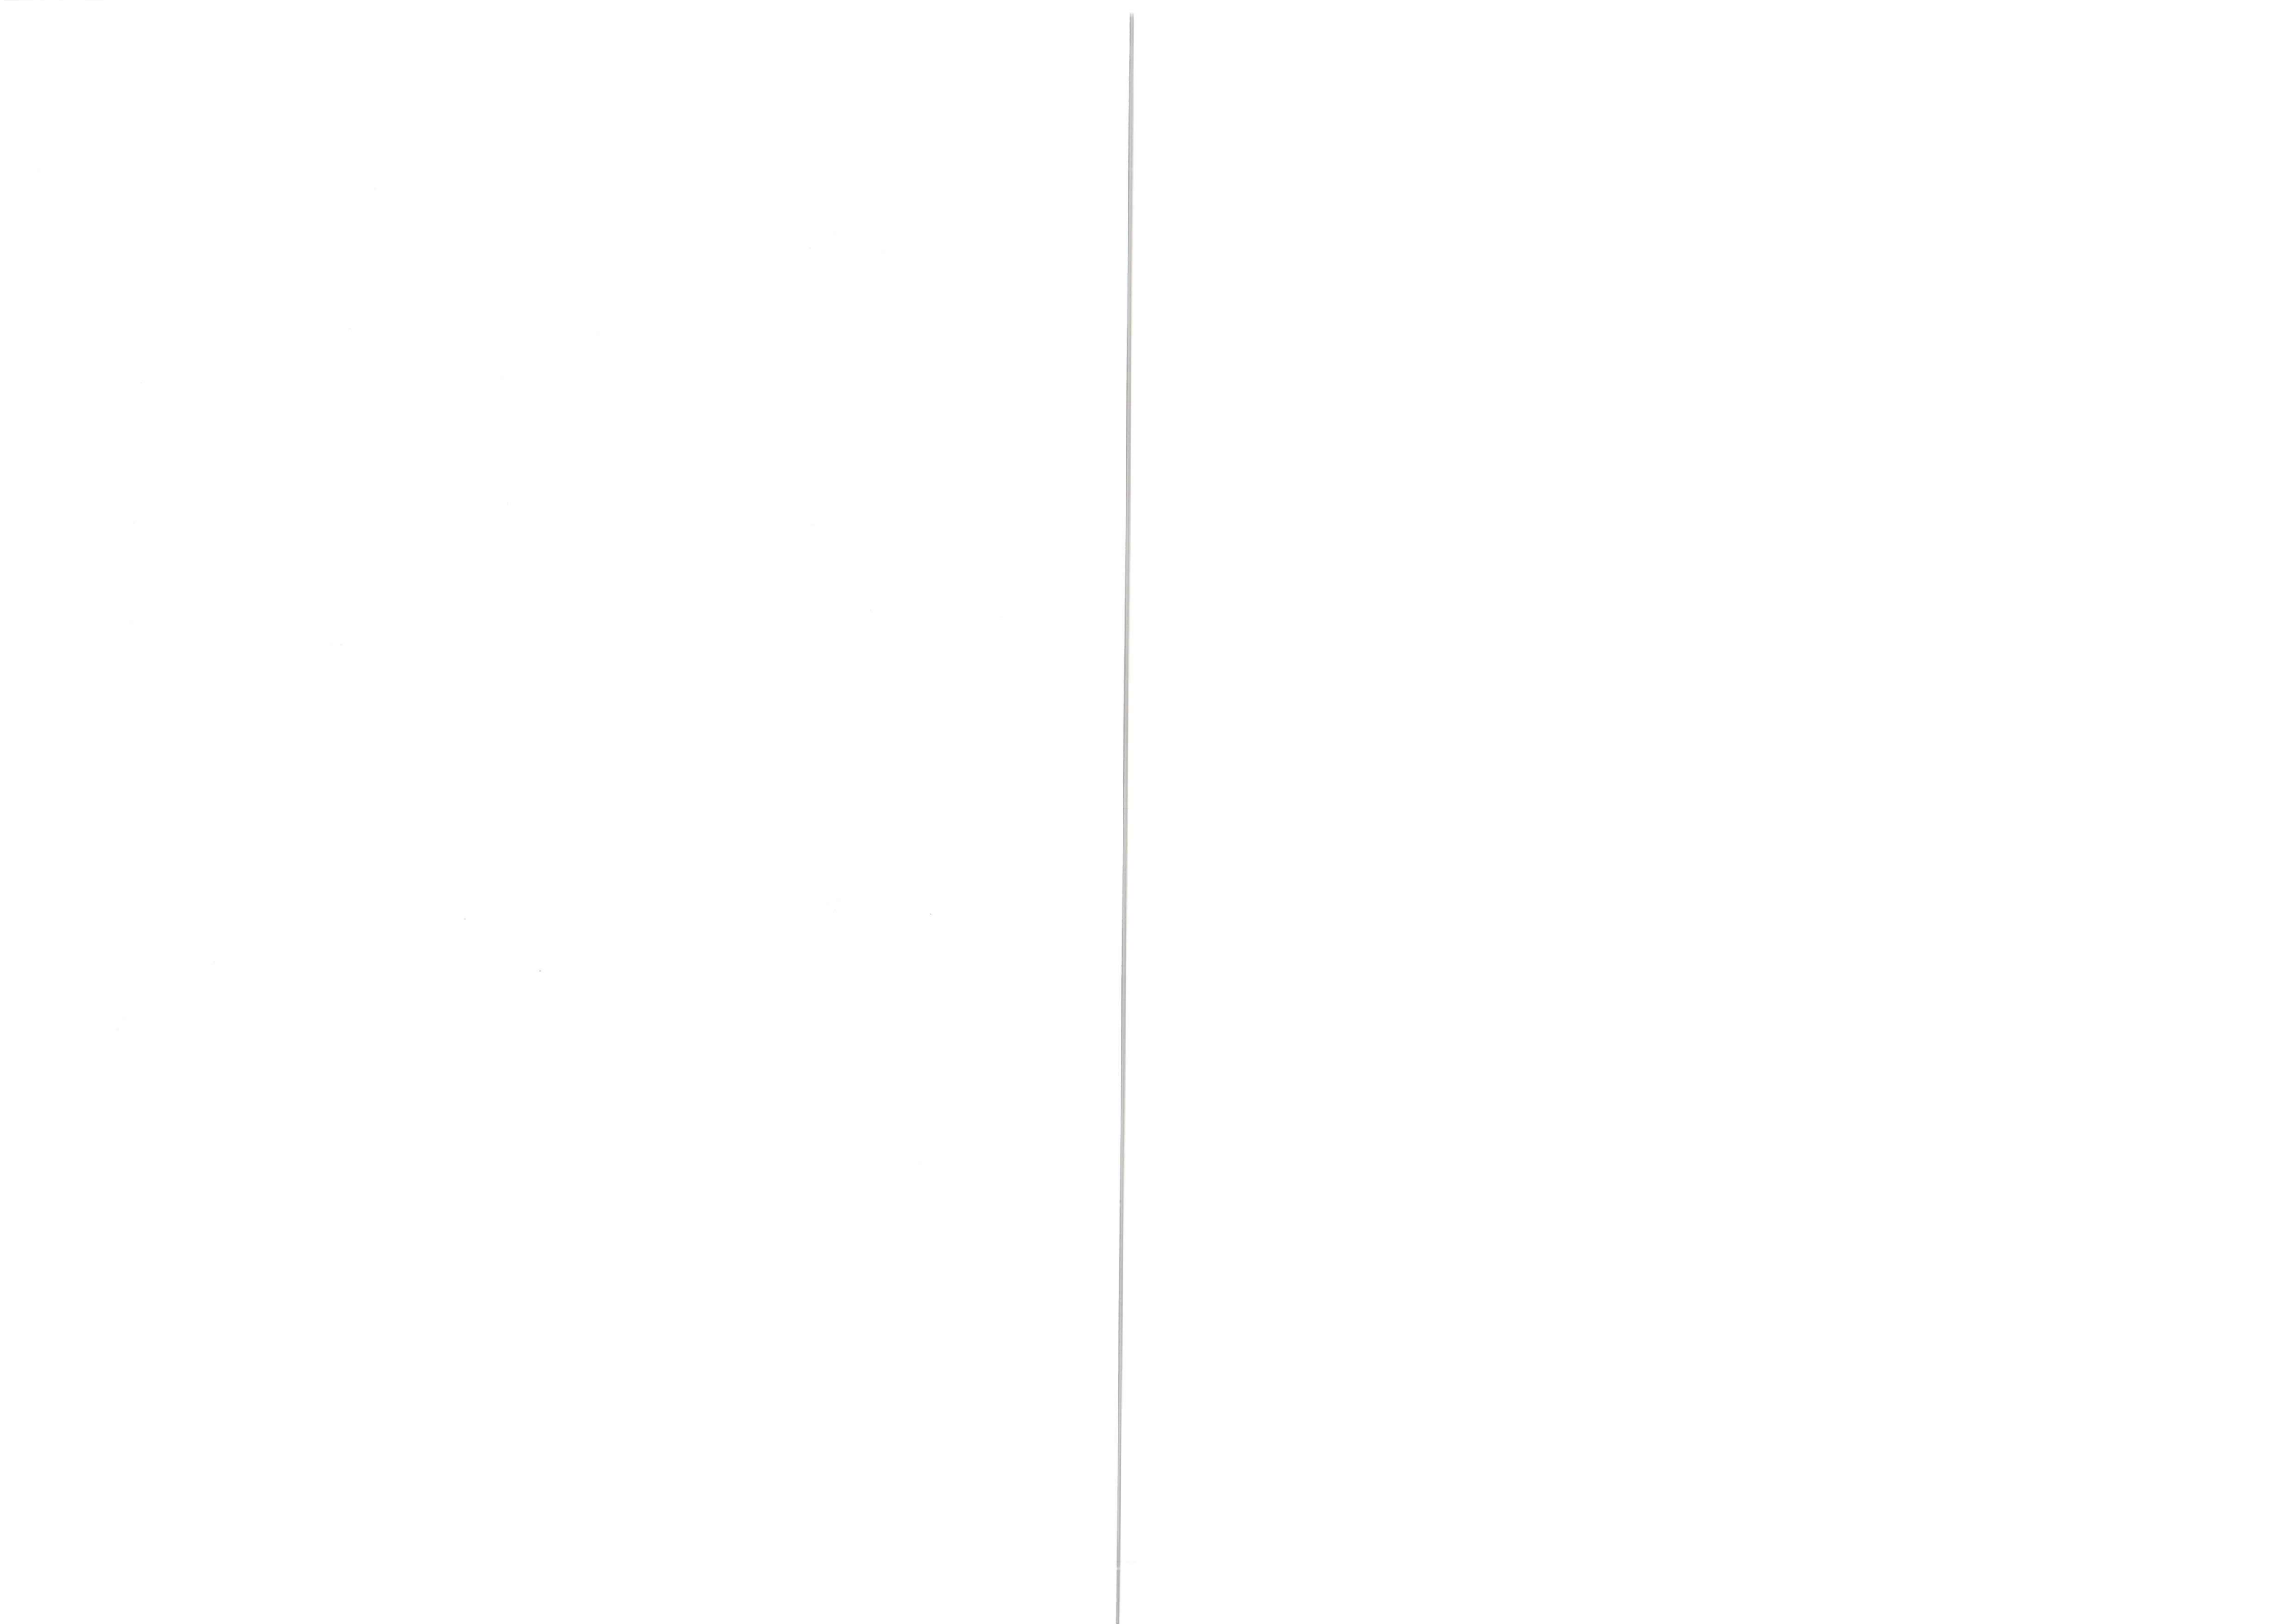

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1.1 Prehľad východiskových podkladov

Podklady pre spracovanie projektu boli požiadavky stavebníka, obhliadka terénu, pracovné rokovania, výškopisný a polohopisný plán. Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem a vyhlášok. Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok.

2.1.2 Údaje o súlade návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou

Charakteristika funkčných plôch v dotknutom území podľa platnej ÚPD v rámci prípustného funkčného využitia dotknutého územia umožňuje umiestnenie predmetnej stavby a zariadení, vedení technickej vybavenosti pre obsluhu územia.

2.2 ÚČEL STAVBY

Cieľom riešenia je vybudovanie cyklotrasy, resp. spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov pre cyklistov v obci Veľké Úľany. Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho chodníka na ulici Leninova v úseku od okružnej križovatky pozdĺž štátnej cesty III. triedy č. 1356 smer Nové Osady. Existujúci chodník bude rekonštruovaný a rozšírený na spoločný chodník pre chodcov a cyklistov v úseku medzi rodinnými domami s. č. 172 a 16. Za rodinným domom s. č. 16 prechádza cez miestnu verejnú komunikáciu a ďalej pokračuje ako cyklochodník, napája sa na existujúci cyklochodník pred bytovým domom s. č. 1476. Celková dĺžka je 1,039 km. Výstavba cyklotrasy v katastri obce Veľké Úľany predpokladá ukladanie dopravy so zvýšením bezpečnosti a komfortu. Projekt uvažuje s vybudovaním obojsmerného spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov s jednotným šírkovým usporiadaním v šírke spevneného povrchu 3,0 m.

V rámci stavby sa uvažuje s rekonštrukciou existujúcich chodníkov, odstránením a vybúraním existujúcich podkladov a krytov pre navrhované rozšírenie a vybudovanie novej trasy. Cieľom riešenia je vybudovanie cyklotrasy a osadenie dopravného značenia.

2.3 STRUČNÝ POPIS STAVBY A ÚDAJE O PREVÁDZKE

2.3.1 Stručný popis stavby

Plánovaná stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami investora. Ide o vybudovanie cyklotrasy v intraviláne a extraviláne obce. Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy je 1,039 km.


Poloha staveniska je dokumentovaná na priloženom situačnom výkrese. Plánovaný zámer bude realizovaný v zastavanom území v juhovýchodnej časti obce na ulici Leninova, pozdĺž štátnej cesty III. triedy č. 1356 a pozdĺž miestnej verejnej komunikácie. Navrhovaná cyklotrasa napája na I. etapu cyklotrasy.

3. Vymedzenie riešeného územia z pohľadu dopravných vzťahov

Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka širšie ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie novonavrhovaného súboru na nadradený komunikačný systém a územie priamo súvisiace s vnútornými prevádzkovými vzťahmi. Stavba bude umiestnená na pozemkoch vhodných z hľadiska polohy a veľkosti, aby umožnili prístup pre zásobovanie a dopravnú obsluhu všetkých objektov.

Navrhovaná stavba sa nachádza v obci Veľké Úľany v zastavanom území v juhovýchodnej časti obce na ulici Leninova, pozdĺž štátnej cesty III. triedy č. 1356 a pozdĺž miestnej verejnej komunikácie.

Užšie vymedzenie riešeného územia sa viaže priamo na priestor definovaný hranicou vlastníckych vzťahov a prispôbuje sa požiadavkám susedných parciel. Umiestnením navrhovanej stavby nebudú dotknuté žiadne doterajšie, ani žiadne predpokladané ochranné pásma v zmysle platných STN. Pred začatím prác na inž. sieťach, investor je povinný požiadať o vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí.

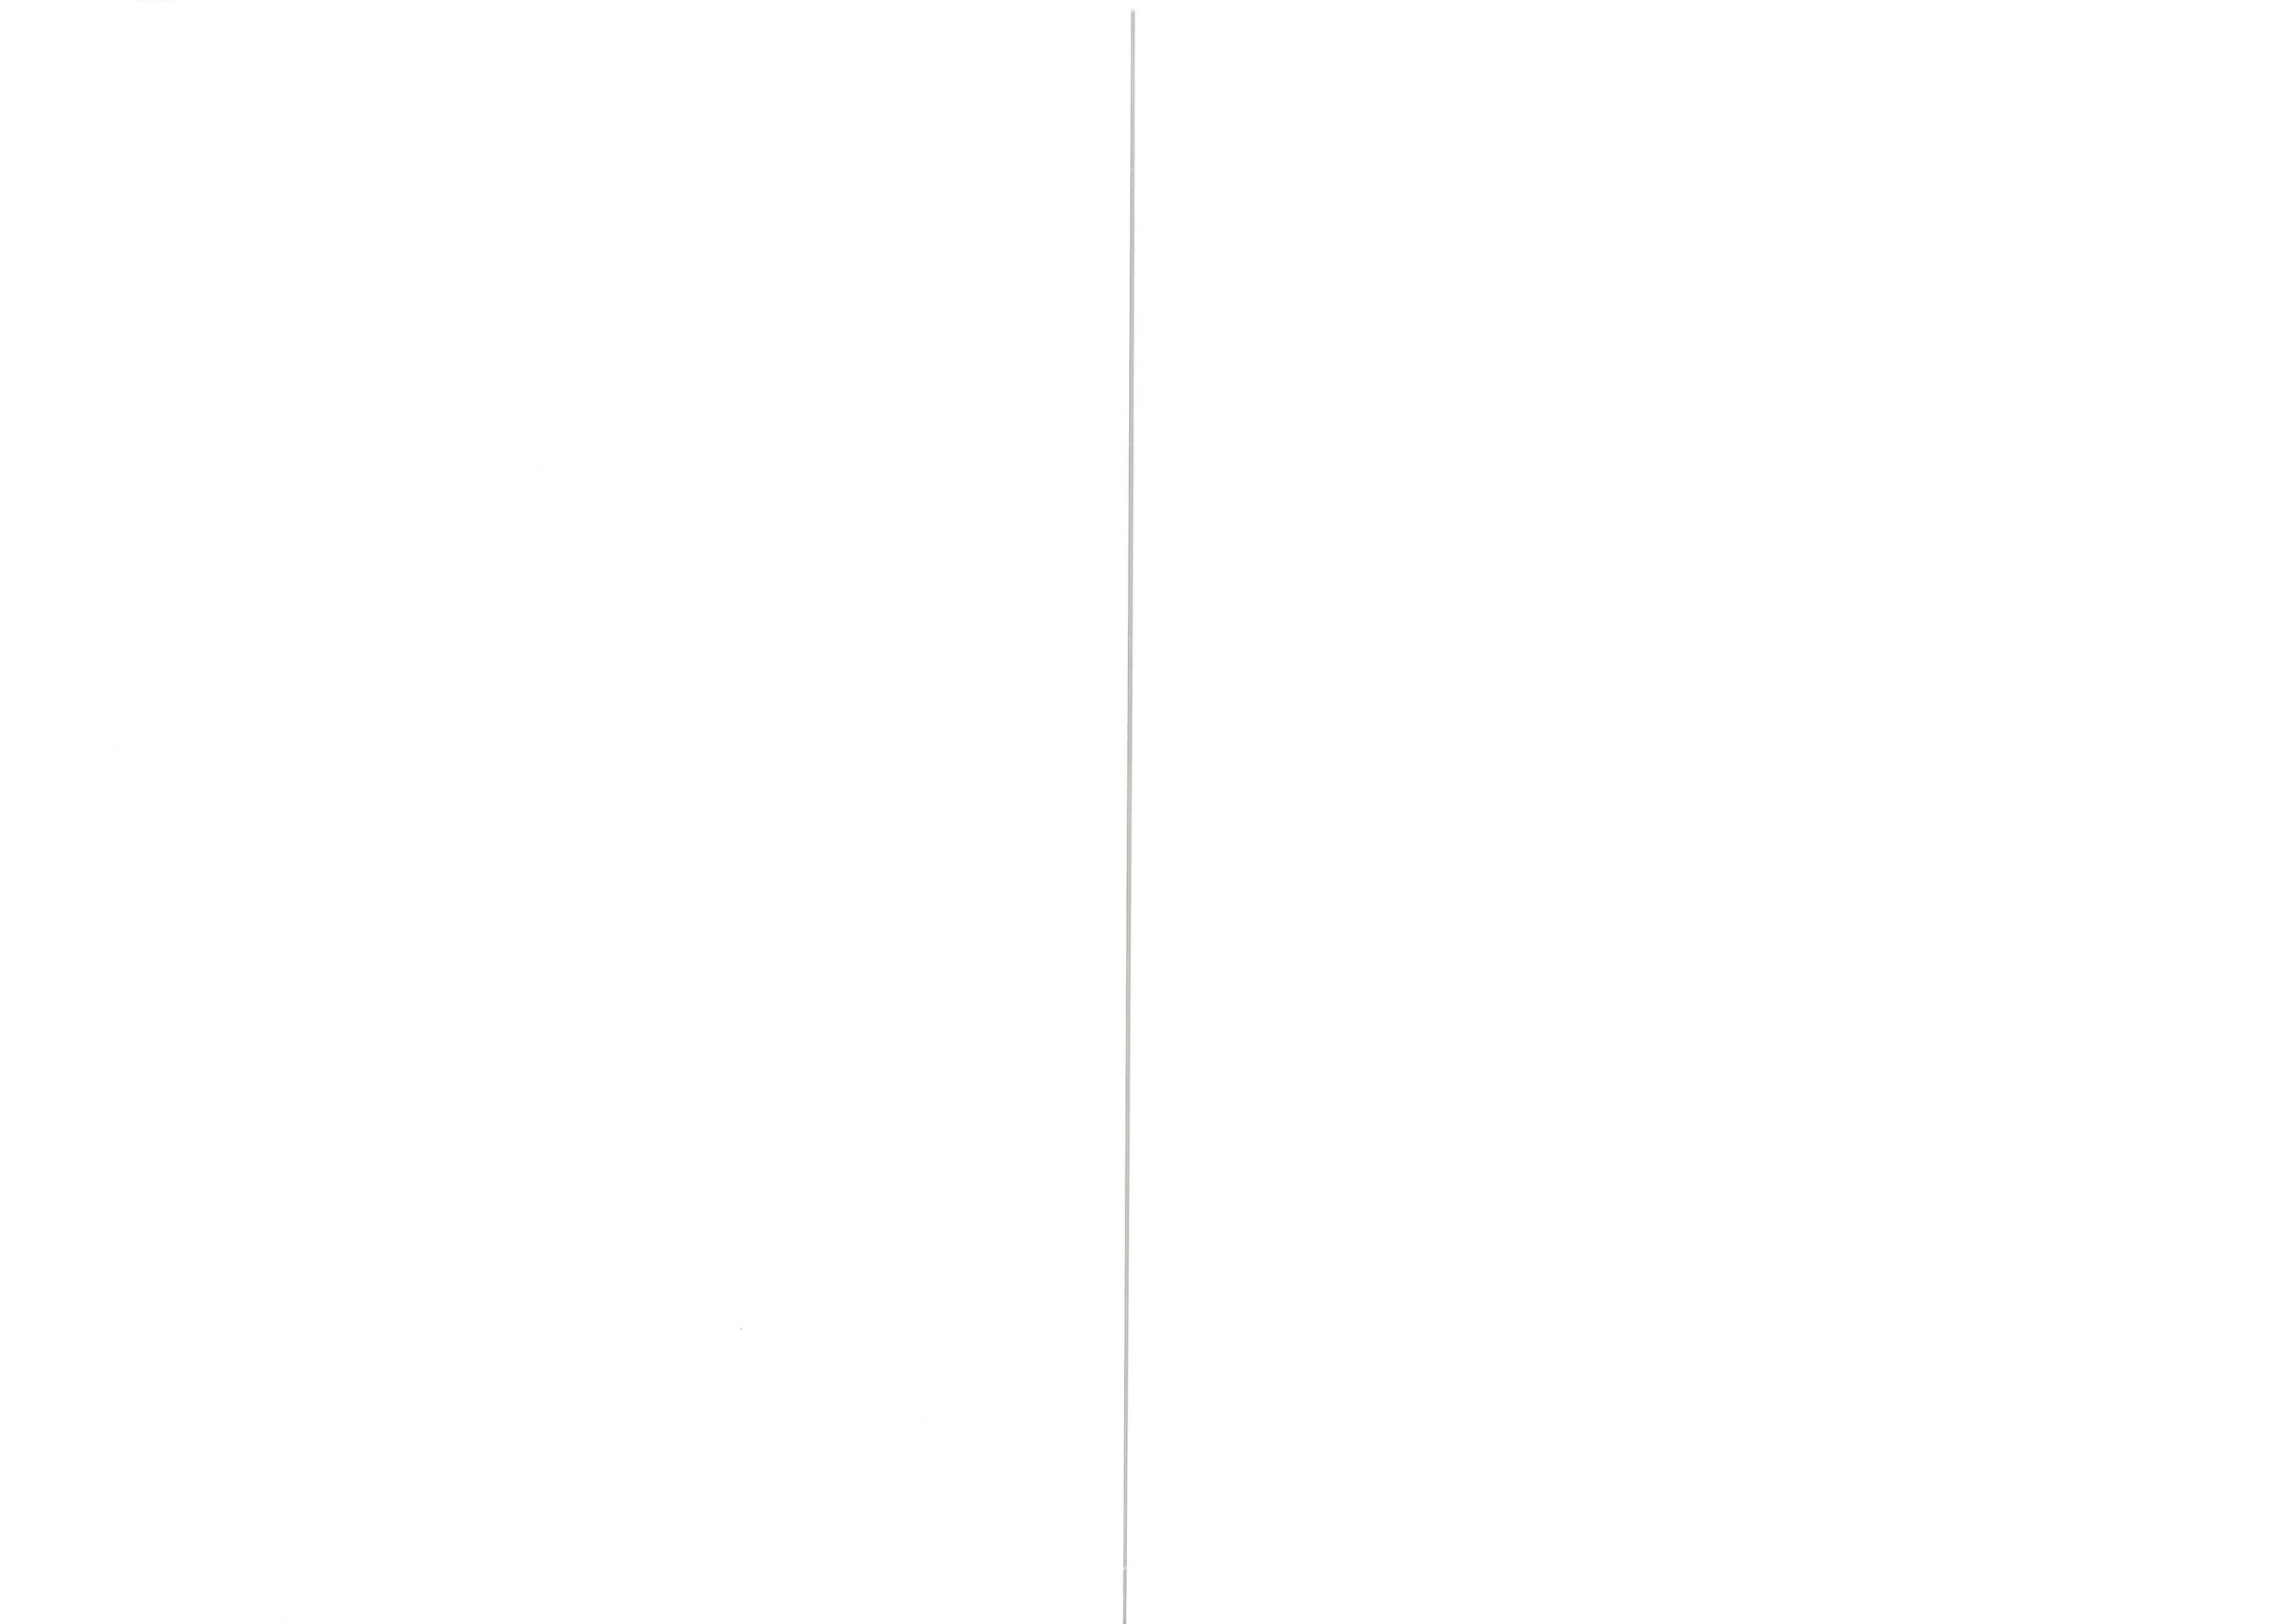

V rámci stavby sa vybudujú nové plochy, ako sú:

Ukazovateľ	povrch	Plocha (m ²)
Cyklotrasa	Asfaltový povrch	2957

Osadenie spevnených plôch v rámci pozemku vid'. situačný výkres.

4, Konštrukcia vozovky

Konštrukčné riešenie

Nová skladba cyklotrasy sa realizuje v nasledovnom rozsahu:

Navrhované základné údaje o konštrukcii	Konštrukcia 01
---	----------------

SP1 – NAVRHOVANÝ VJAZD:

číslo	Označenie materiálu	Hrúbka vrstvy (mm)	Názov materiálu
1	ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 0,1I	40	
2	POSTREK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ PS 0,7 kg/m ²		
3	ASFALTOVÝ BETÓN AC 22 P,II	50	
4	POSTREK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÝ PS 0,7 kg/m		
5	KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM CBGM CB/10	100	
6	ŠTRKODRVINA 0-32 ŠD	150	
7	Upravený terén		
Hrúbka celej vozovky (mm)		340	
Modul pružnosti podložia E (MPa)		60	

ODVODNENIE

Odvodnenie bude riešené do okolitého nespevneného terénu. Jednotlivé úseky cyklotrasy sa napájajú na existujúce komunikácie, pričom sa zohľadňuje aj okolitá zástavba.

V rámci prípravných prác sa vytýči smerové a výškové vedenie. Súčasťou prác je odstránenie požadovanej hrúbky zeminy, podkladov, krytov s odvozom na skládku.

Navrhovaná cyklotrasa bude rešpektovať trasovanie a výškové vedenie existujúcej štátnej cesty pri zohľadnení konfigurácie terénu a nivelety okolitých objektov.

Napojenie na existujúce komunikácie

Jednotlivé úseky cyklotrasy budú súčasťou obytnej zóny obce, spájajú jednotlivé časti obce.

Prístup na pozemky

Jednotlivé úseky komunikácií pre peších sú prístupné po štátnych a miestnych cestách. Zájmy cudzích vlastníkov s rekonštrukciou ciest nebudú dotknuté. Prístup na okolité pozemky nebude narušený.

Väzby na existujúce inžinierske siete


Existujúce inžinierske siete nebudú narušené, k prekládke nedôjde.

Úprava režimu povrchových vôd

Režim spodných vôd nebude navrhovaným objektom dotknutý.

5. DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v základnom rozmere s ochranným okrajom a reflexnou fóliou tr. 1. Všeobecne platí, že dopravná značka musí byť osadená svojou hranou mín.

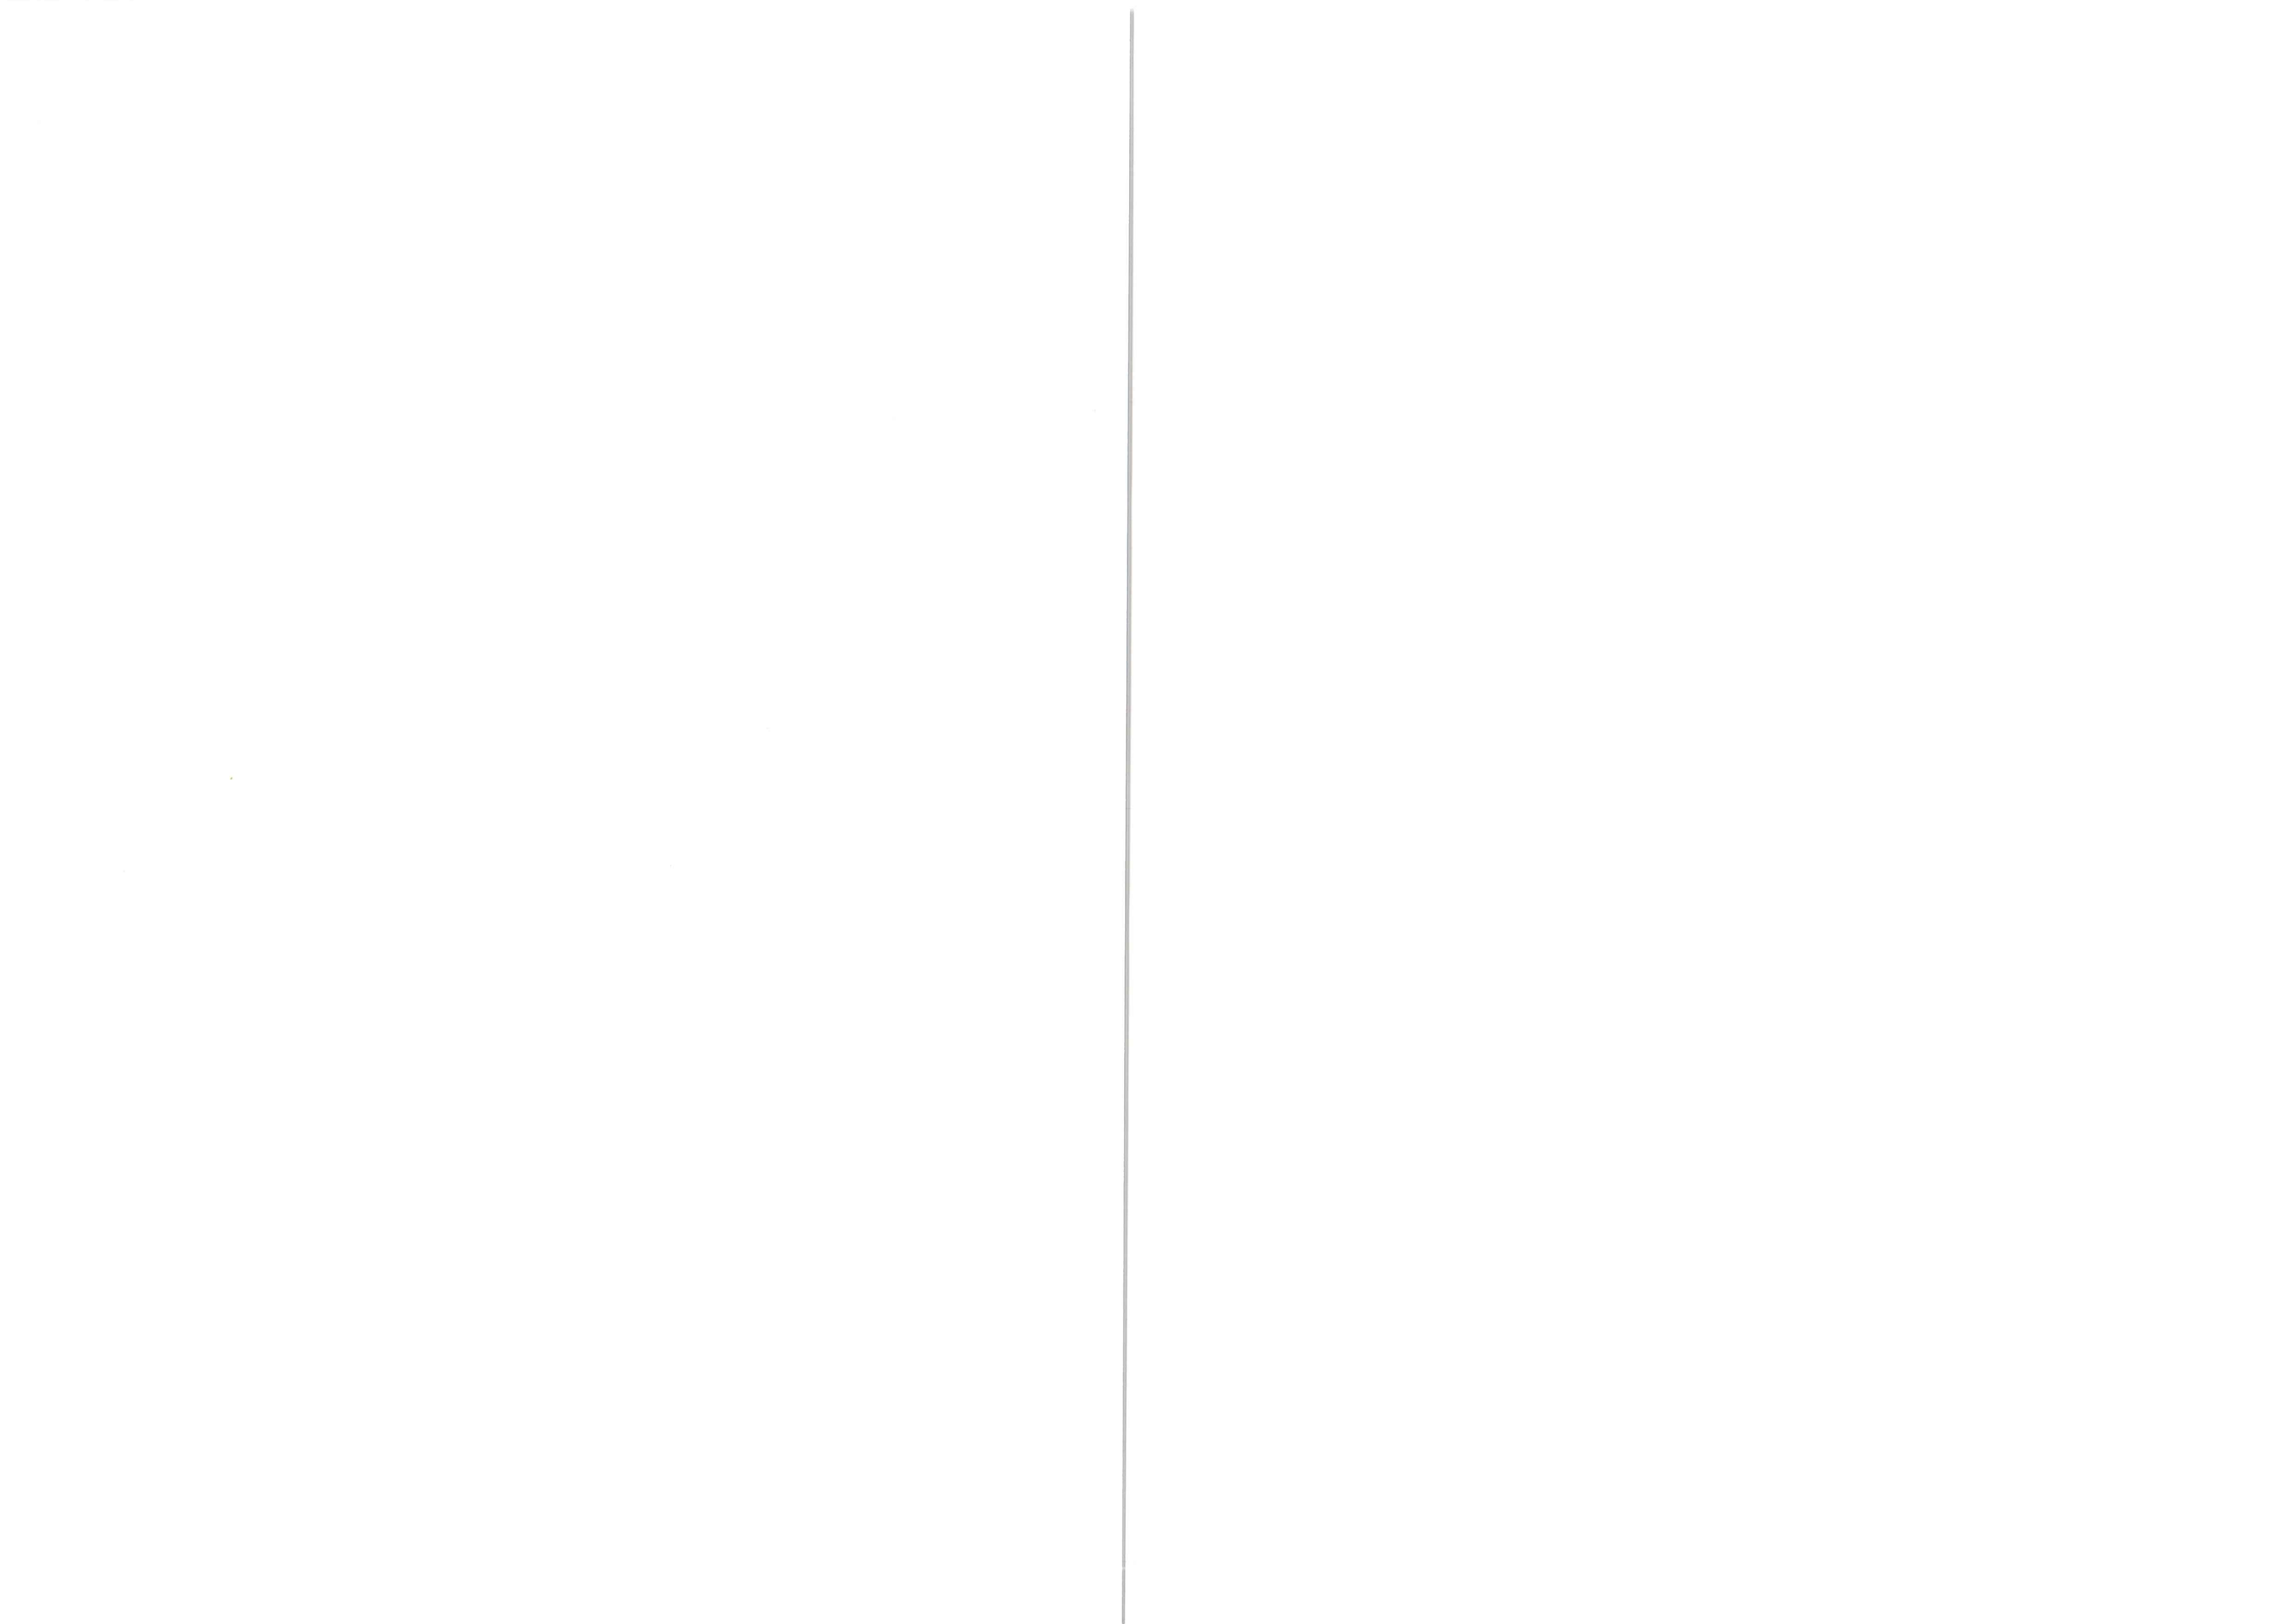

0,5 m od okraja komunikácie. Výška spodného okraja značky sa navrhuje 2,2 m od úrovne komunikácie. Natočenie značky na os komunikácie 5,0 %. U dopravnej značky C 6a sa navrhuje spodná hrana 0,6 m nad úrovňou ostrovčeka.

a/ Trvalé dopravné značky:

Na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa použili dopravné značky ako zvislé tak i vodorovné. Pozri výkresovú dokumentáciu.

Pri použití zvislých dopravných značiek je potrebné dodržať nasledovné základné požiadavky:

- musia mať príslušný certifikát zhody stavebných výrobkov – patria v zmysle vyhl. 158/2004 Z.z. do skupiny stavebných výrobkov č. 0514,
- ich vyobrazenie musí byť vyhotovené v zmysle vyhl. č.9/2009 Z.z.,
- rozmery musia zodpovedať STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2,
- polomer zaoblenia prednej (čelnej strany musí byť väčší ako 10 mm – STN EN 12899-1,
- materiál konštrukcií a upevňovacích prvkov a nosičov musí zodpovedať STN EN 12 899-1 a STN EN ISO 12 944-5.

b/ Prenosné dopravné značky zvislé:

Pri výstavbe spevnených plôch bude nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej pomocou zvislého dopravného značenia. Ich osadenie od okraja vozovky a vzdialenosti medzi nimi musia spĺňať predpísané rozmery. Pred realizáciou musí byť určenie použitia dopravných značiek vydané príslušným cestným správnym orgánom. Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty zhody stavebných výrobkov v zmysle platných právnych predpisov platných v SR. Obdobné zásady platia aj pri použití prenosného dopravného značenia počas výstavby.


Pri dočasnom dopravnom značení musia byť dopravné značky umiestnené v podstavcoch s príslušnou stabilitou tak aby nedochádzalo k ich prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok. Navrhuje sa použiť podstavce 16,5 kg typu CZ, Maibach, Klemfix, resp. podobné. Pri dopravných značkách Z4 sa použijú značky vyrobené z plastu, obojstranné s reflexnou fóliou a môžu byť umiestnené v podstavcoch – zmenšených tzv. baby, tých istých typov.

Dodávateľ prác je povinný vykonávať priebežné kontroly stavu dočasného dopravného značenia, zabezpečovať jeho správnosť a funkčnosť. Použité dopravné značky nesmú byť poškodené, znečistené a ani inak znehodnotené aby bol jednoznačný ich význam, čitateľnosť a viditeľnosť. Označenie pracoviska je zrealizované pomocou *dlhodobého pracovného miesta*. Pri označovaní pracovného miesta – v zmysle spracovanej dokumentácie (pozri PD) musia byť dodržané nasledovné podmienky:

- osadzovanie dopravných značiek môže byť vykonané až po určení použitia dopravných značiek príslušným cestným správnym orgánom,
- o čase začatia osadzovania dopravných značiek musí byť informovaný príslušný cestný správny orgán a Dopravná polícia PZ SR minimálne 24 hod. vopred, (osobne, faxom, e-mailom a pod.),
- osadzovanie dopravných značiek môže byť vykonané len za účasti odborne znalej osoby (stavbyvedúci, majster, projektant a pod.), ktorá preberá zodpovednosť za správnosť ich umiestnenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. V prípade potreby – neočakávaných zmien je možné POD upraviť podľa skutočnej situácii. O uvedenom je potrebné neodkladne informovať cestný správny orgán a dopravnú políciu PZ SR,
- pri osadzovaní dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy vozidiel, pri odstraňovaní proti smeru jazdy. V prípade vytvárania dočasnej jednosmernej ulice sa postupuje opačne.
- dopravné značenie a všetky dopravné zariadenia musia byť po celé obdobie vykonávania prác plne funkčné. Dopravné značky nesmú byť znečistené, poškodené a musia byť zabezpečené proti prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok, resp. cestnej premávky v mieste ich umiestnenia.

Rozmery určuje STN 01 8020 v kapitole 4 a normatívna príloha A. Na dočasné dopravné značenie sa nesmú použiť zmenšené veľkosti DZ. Musia byť dodržané rozmery určené vo výkresovej časti tejto PD.

Samotné dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať predpísané parametre, vyobrazenie (vyhl. č. 9/2009 Z.z.) a vyhotovenie (STN 01 8020),

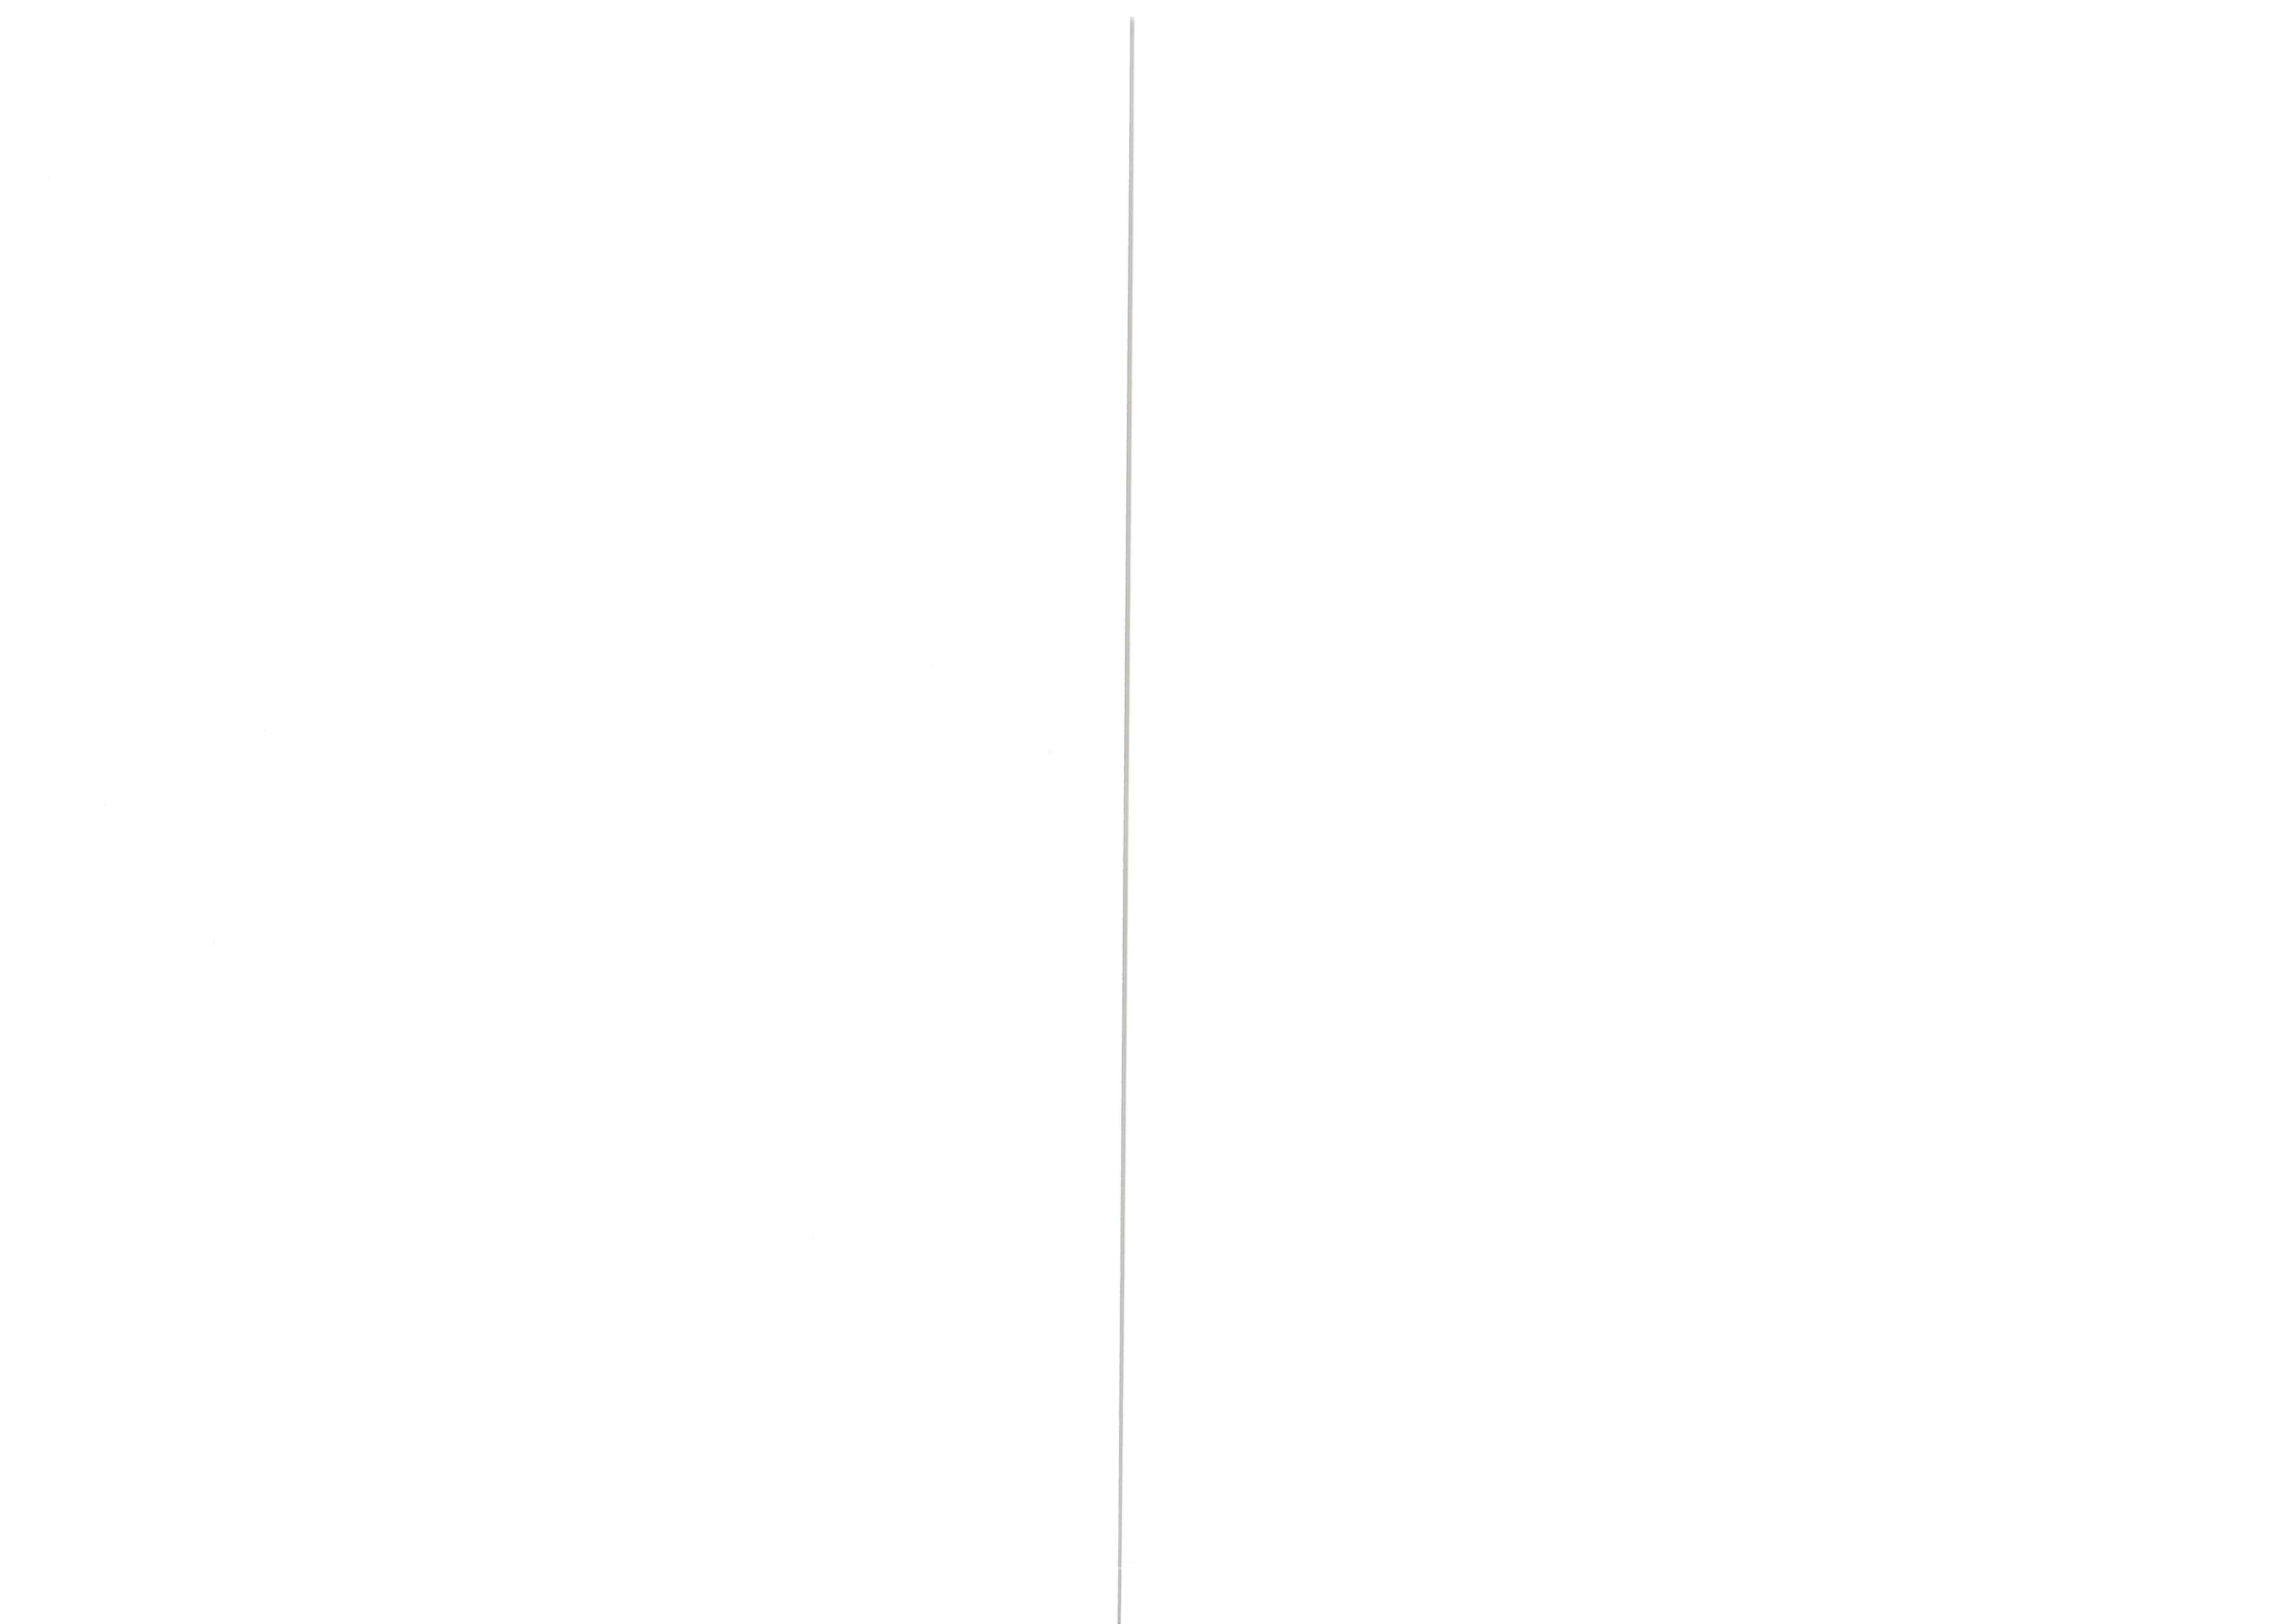

c/ Vodorovné dopravné značky dočasné:

Materiál na výrobu dočasných VDZ musia byť rozpúšťadlové alebo vodou riediteľné jednozložkové náterové látky, vopred pripravené na dočasné VDZ. Prechodná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje oranžovou farbou. Tieto vodorovné dopravné značky sa musia dať po ukončení prác z povrchu komunikácie úplne odstrániť, bez zanechania trvalej farebnej stopy a hlavne bez poškodenia povrchu komunikácie.

Rozmery, geometrická presnosť, tvary a vzhľad dočasných VDZ musia byť v súlade s čl. 5.1 STN 01 8020. Dočasné VDZ musia byť funkčné počas trvania pracovnej činnosti na komunikácii.

Ľhneď po ukončení prác tieto dopravné značky dodávateľ prác odstráni a o tejto skutočnosti bude informovať príslušný dopravný inšpektorát PZ SR a cestný správny orgán.

Dĺžky a časové intervaly jednotlivých etáp pri výstavbe pripojenia a samotného objektu stanoví dodávateľ prác s investorom. Umiestnenie dopravných značiek je potrebné oznámiť na príslušný dopravný inšpektorát PZ SR minimálne 3 dni pred začatím ich osadzovania.

6. Zemné a búracie práce

Zemné práce pozostávajú z odstránenia ornice a úpravy podlažia v zmysle projektovej dokumentácie. Investor zabezpečí uskladnenie vybúranej stavebnej suťi na príslušnej skládke.

7. Vytýčenie

Stavba sa vytýči v zmysle výkresovej dokumentácie od stávajúcich charakteristických bodov a objektov.

8. Nároky stavby na odpadové hospodárstvo


Stavba je navrhnutá tak, aby svojimi vplyvmi zasiahla do bezprostredného, ale i širšieho okolia iba minimálne, resp. v súlade s platnou legislatívou o ŽP.

Z hľadiska odpadového hospodárstva sa jedná o stavbu, ktorá nezaťažuje zvláštnym spôsobom splaškovú vodu, resp. skládku TKO, nakoľko ide o odpady z budovania ciest a chodníkového telesa (spevnených plôch). Stavebná suť a ostatný stavebný odpad bude pravidelne odváňaný na základe zmluvy investora na príslušnú skládku komunálneho odpadu.

V rámci stavebných a technických prác budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné práce z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie. Zhromaždenie a zneškodnenie odpadkov v zmysle zákona o odpadkoch č.223/2001 bude zmluvne zabezpečené.

Kategorizácia odpadov produkovaných počas výstavby zaradené v zmysle vyhlášky č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

č.odpadu	názov odpadu	kat.odpadu
17 01 01	betón	0
17 01 07	zmesi betónu, tehál obkladačiek, dlaždíc a keramiky	0
17 02 03	plasty	0
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170504	0
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05	0

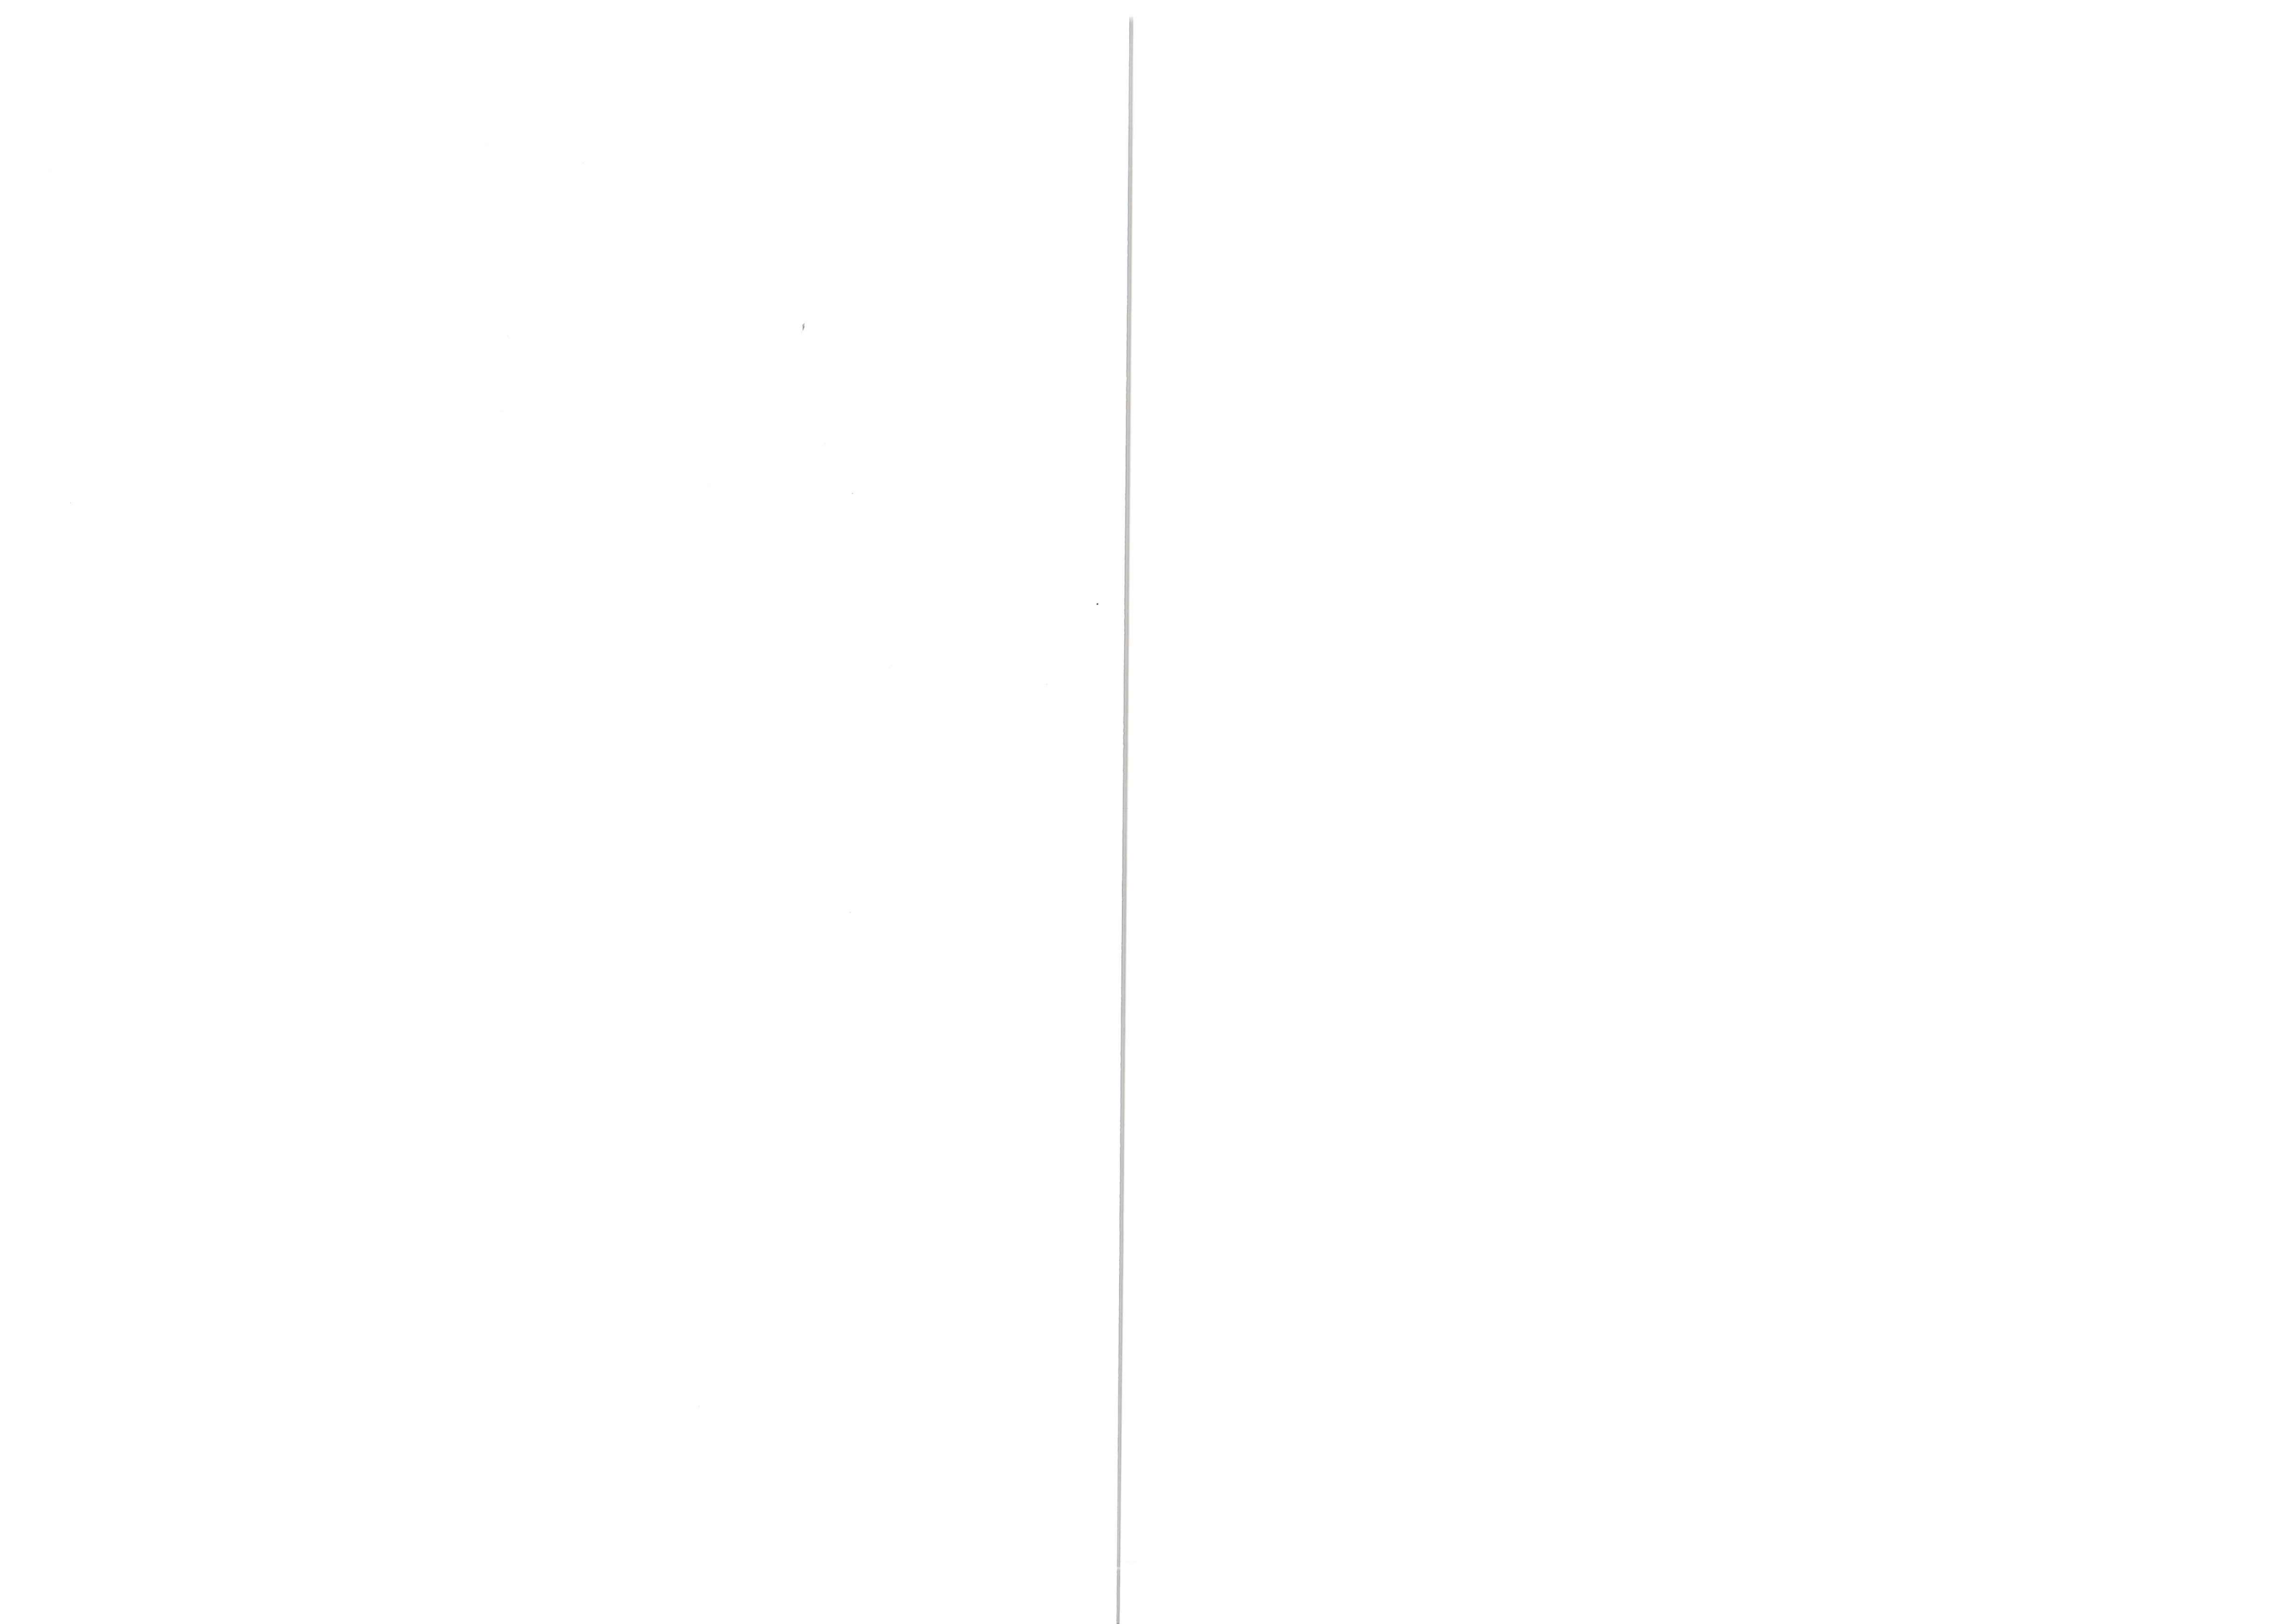

Odpady 170504 a 170506 budú využívané pri zásypoch a Ďalších stavebných prácach na stavbe. V prípade prebytku budú zneškodnené na skládke na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom skládky TKO.

V prípade, že počas výstavby stavby budú vznikať ďalšie odpady stavebného charakteru, ich zhodnocovanie alebo zneškodnenie zabezpečia jednotliví dodávatelia individuálne.

9. Zazeleneenie plôch

Parková úprava nezastavaných plôch bude po ukončení výstavby vrátená do pôvodného stavu.

10. Starostlivosť o životné prostredie

Výstavba komunikácie a výstavba spevnených plôch je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutá na princípe maximálnej ochrany životného prostredia. V konečnom dôsledku nebude negatívne vplyvať na životné prostredie v predmetnej lokalite. Očakávané čiastkové krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s realizáciou stavby sa prejaví hlavne :

- vyšším hlukom (hluk stavebných strojov)
- čiastočným znečistením miestnej komunikácie s obmedzením dopravy

V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie eliminovať organizačnými opatreniami pri prevádzke výstavby (pravidelné čistenie MK a pod.) . Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia v dôsledku vzniku odpadov

- stavebné odpady

Stavebný odpad bude pravidelne odváňaný v zmysle programu odpadového hospodárstva obce. V rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné úpravy z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.

11. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečí investor spolu s dodávateľom prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov. Priebeh stavebných prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ vyhláška č.374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

12. Zariadenie civilnej obrany a jej mierové využitie

V rámci spevnených plôch a komunikácií nie sú špecifikované osobitné požiadavky z hľadiska záujmov civilnej obrany. V rámci navrhovaného riešenia sú dodržané všeobecné podmienky vyplývajúce z potrieb civilnej ochrany.


13. Zvláštnie upozornenie

Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom spevnených plôch tieto preložiť alebo uložiť do chráničiek.

14. Postup výstavby

Pre výstavbu platia štandardné postupy budovania:

- vytýčenie staveniska,
- preložky alebo ochrana inžinierskych sietí

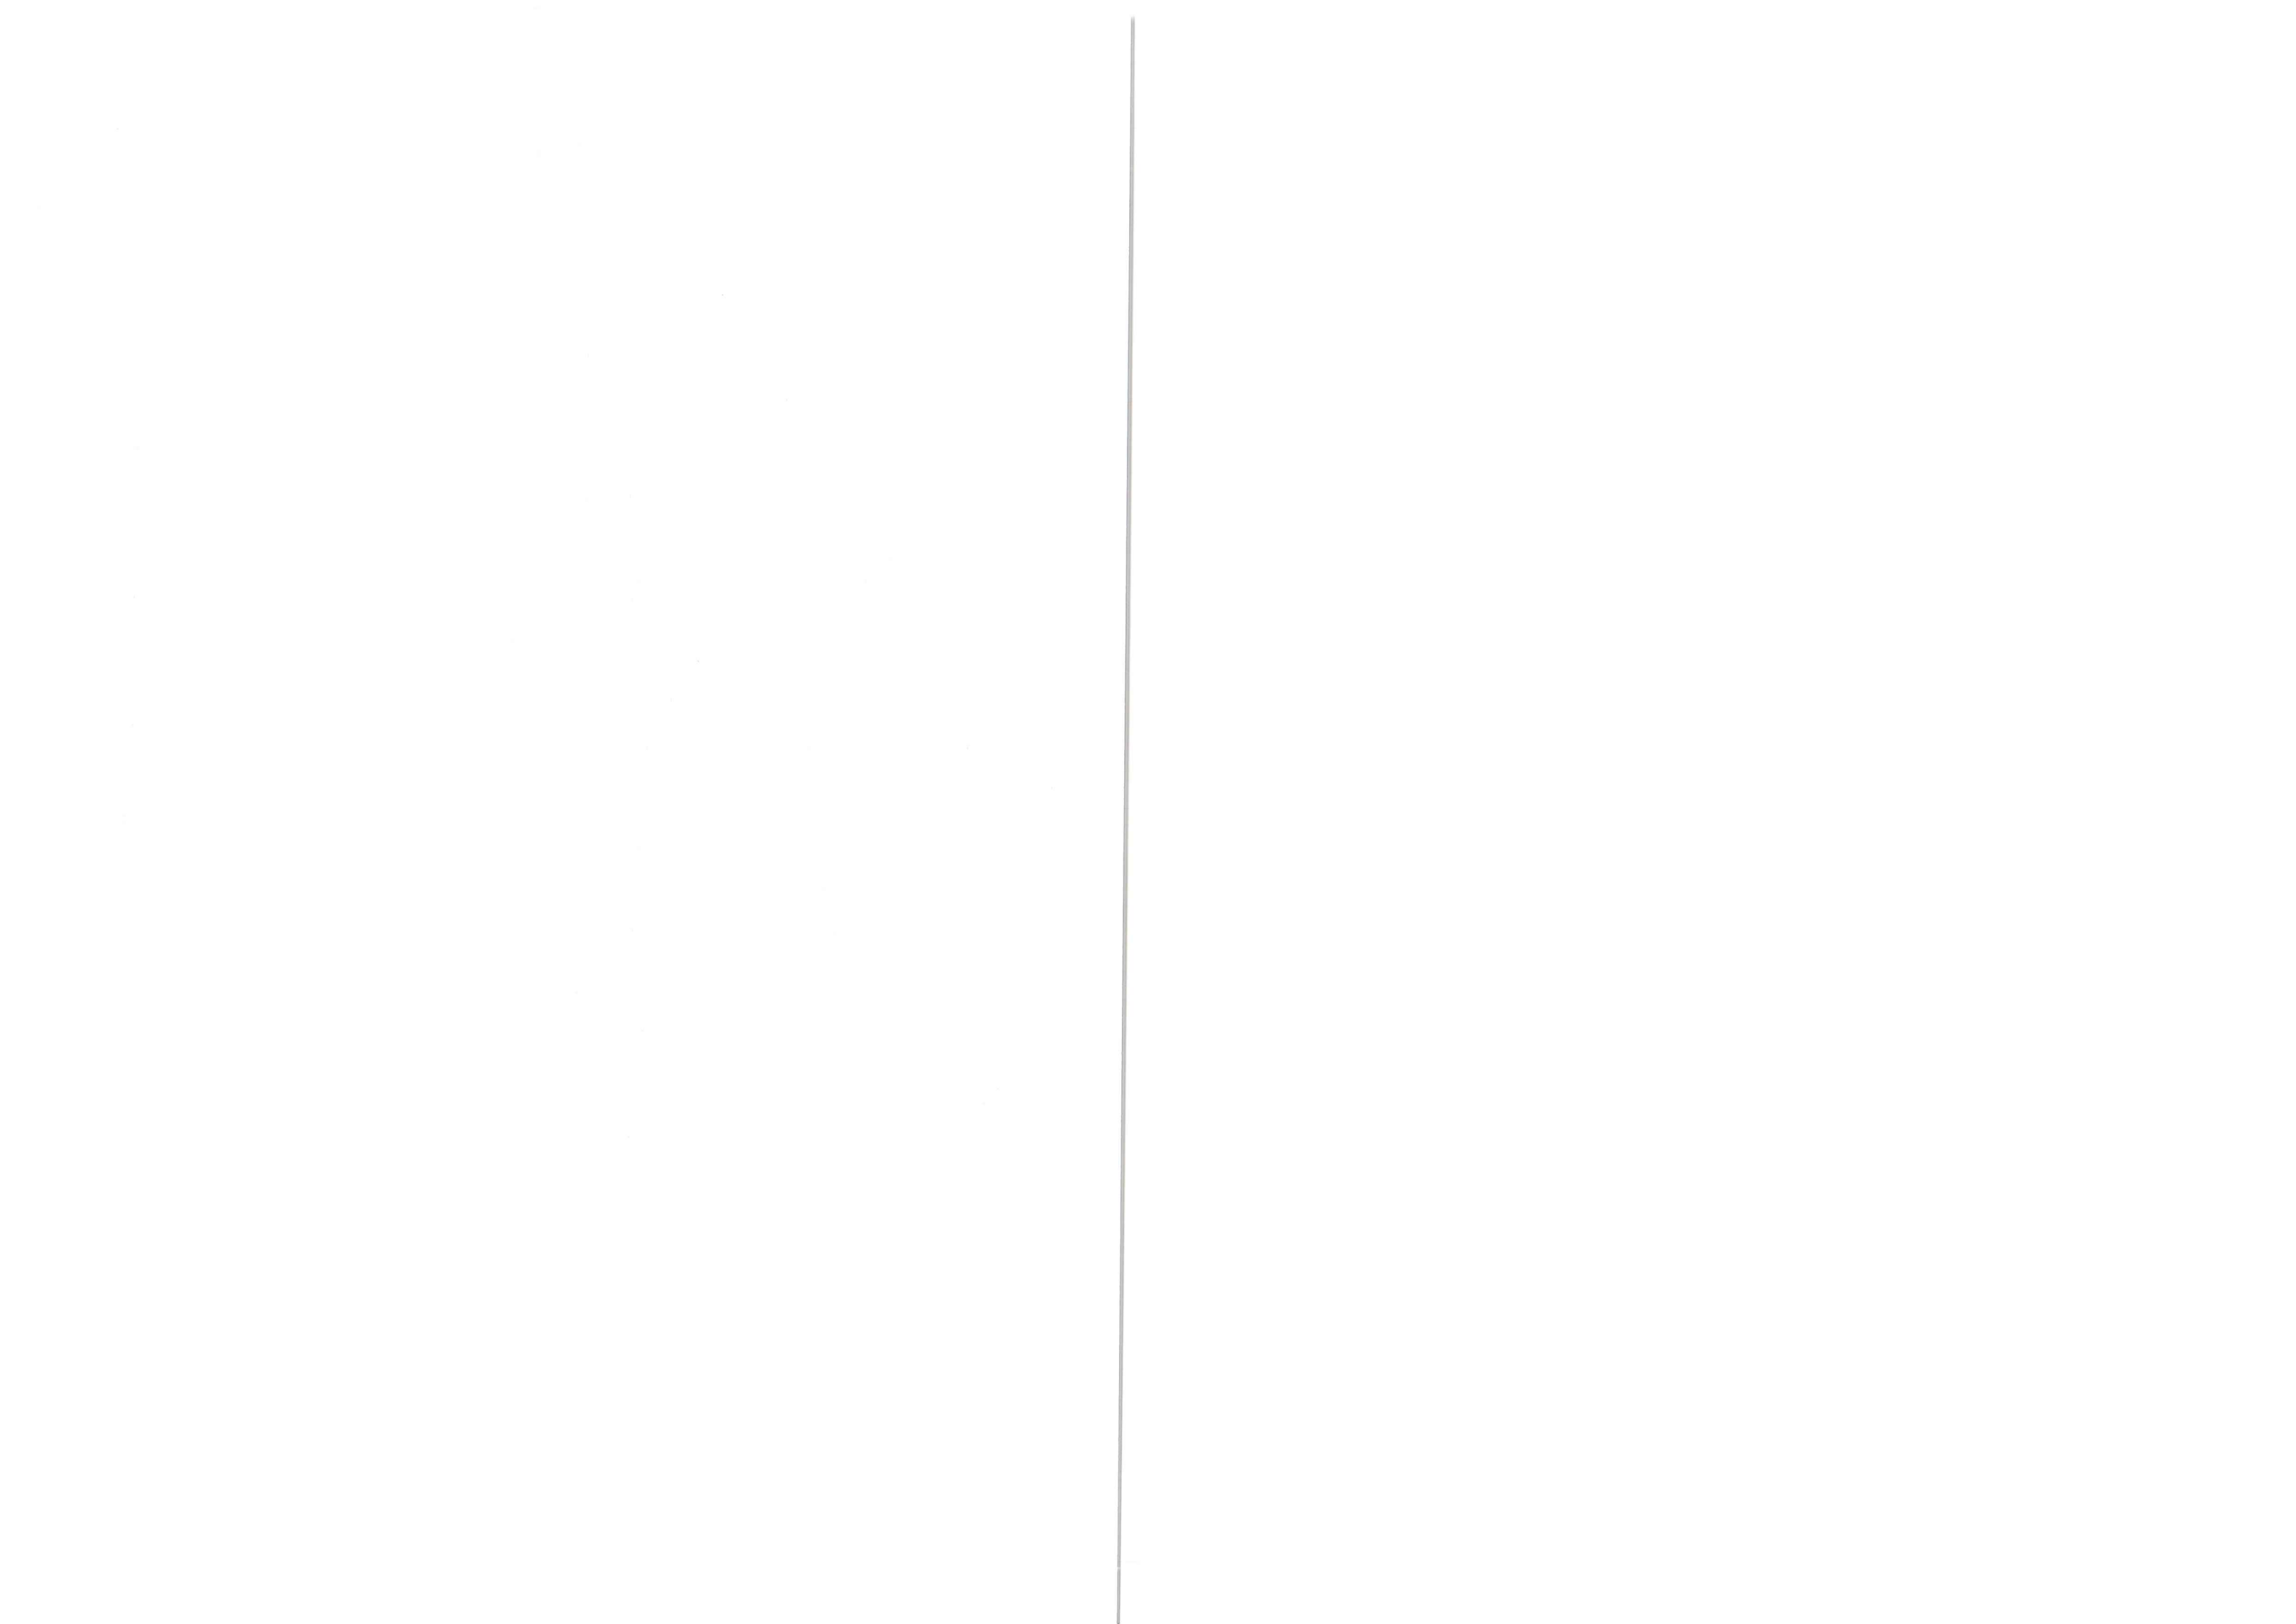

- zemné práce
- polozenie konštrukčných vrstiev


Spracoval:


Ing. Zoltán Zeman





PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ KONANIE

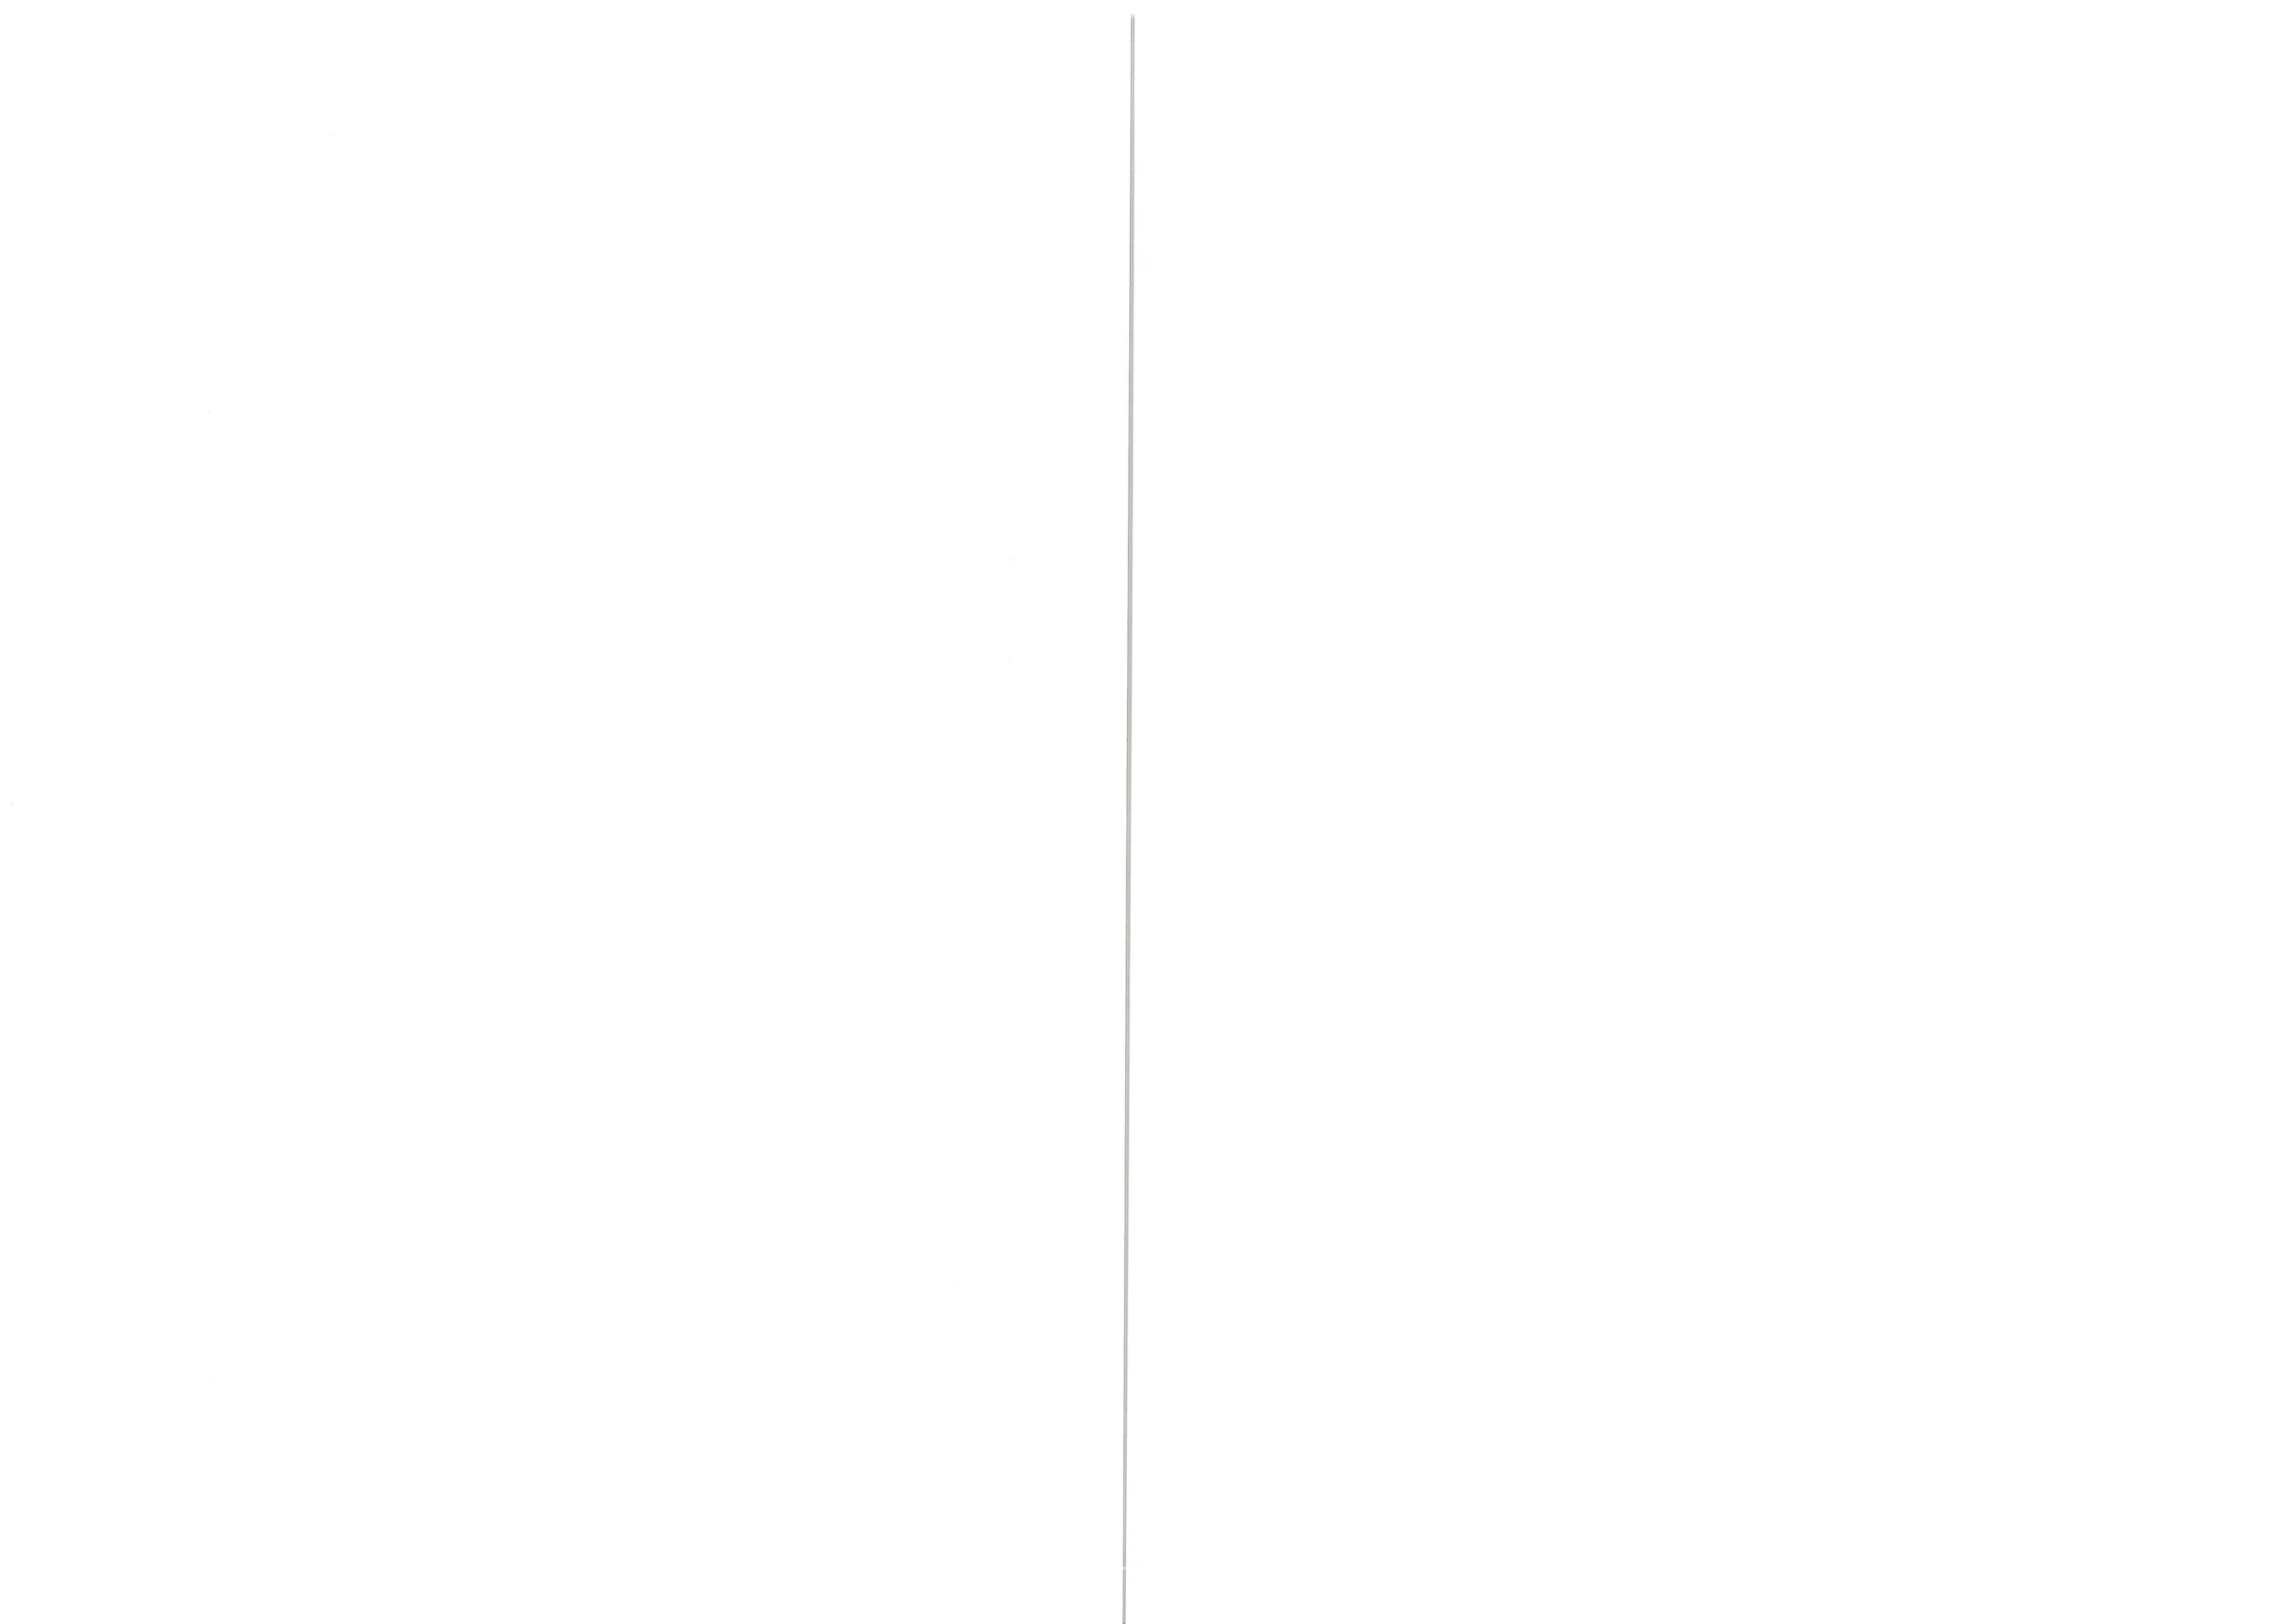

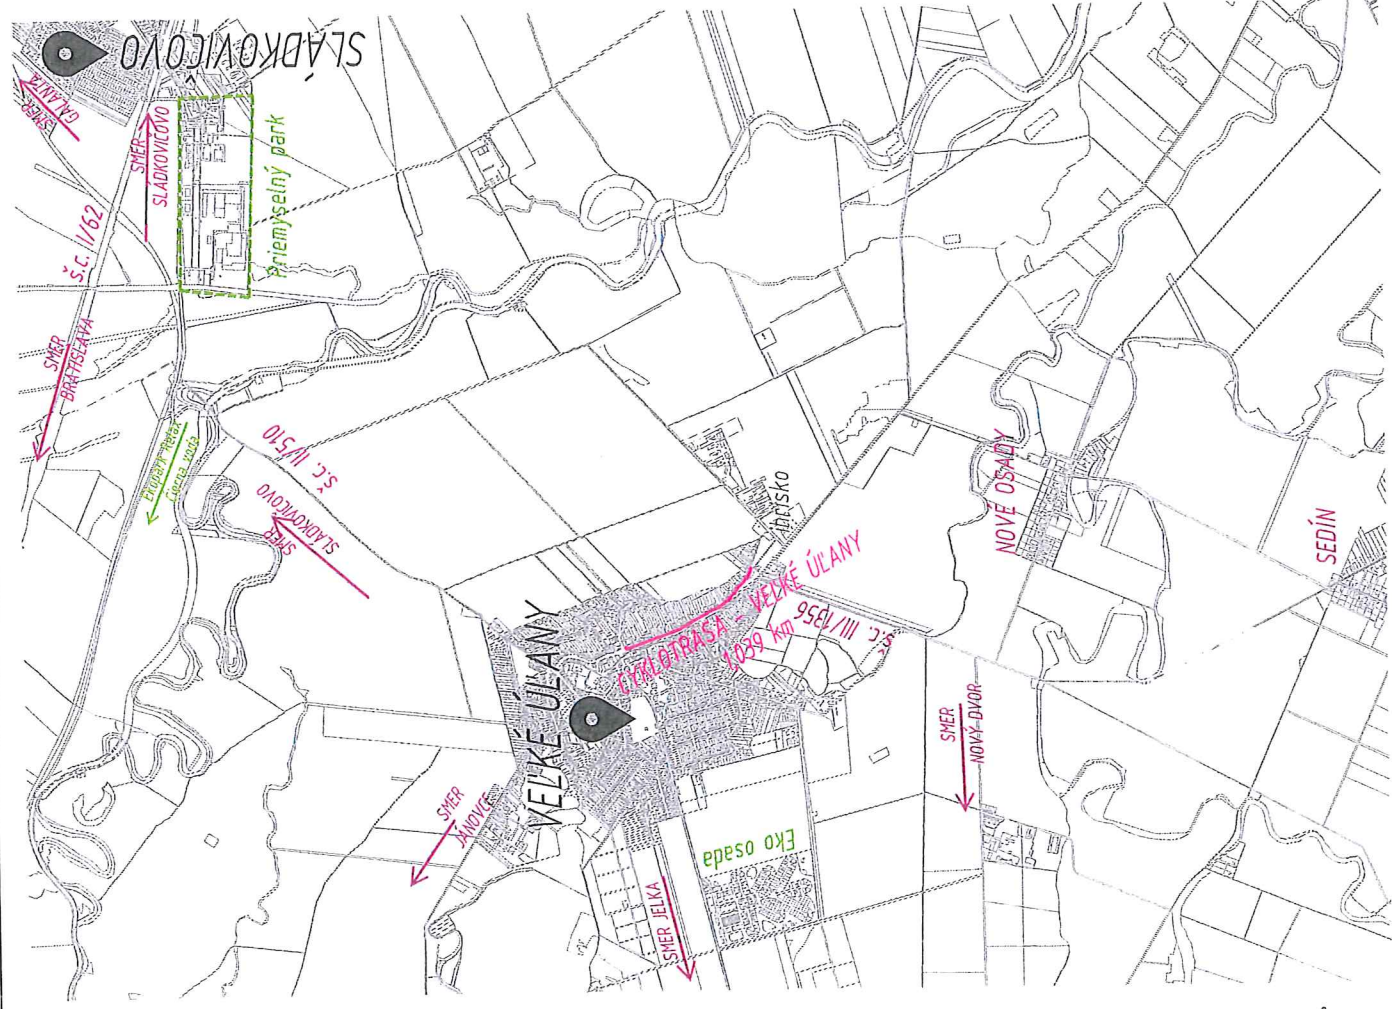






Projekt stavby pre stavebné konanie

Stavba Building		CYKLOTRASA - III. ETAPA, VEĽKÉ ÚĽANY	
Stav. objekt Part building	Objekt Part No.		
Miesto stavby Area	KM: 68034, 68011, 487012, 48552		
Investor Investor building	OBEC VEĽKÉ ÚĽANY		
Hlavný projektant Chief designer	 Kováč Architects s.r.o. Štef. ŠUP 68711, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 535 mail: ofice@kovacsarchitects.sk		
Projektant časti Executor part	 DOPRAVA ROADS kzprojek@vwm.sk 0918 371 939		
Zodpov. projektant Approved by	Ing. Zolán ZEMAN, a. i.		
Vypracoval Criminated by and paling	Ing. Zolán ZEMAN, Martin Zeman		
SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV		č. výkresu DRWG No.	01
Stupeň Level	Archívne číslo Part No.	Profesia Profession	Revízia Revision
P - SP		DOPRAVA	2x4
Mierka Scale			
Datum Date			10/2019

Podľa zákona o autorských právach je bez súhlasu autora zakázané akokoľvek šírenie alebo kopírovanie tohto projektu. Tento projekt je vypracovaný ako **PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE**. Nepreberáme zodpovednosť za jeho použitie na iný ako tento účel.

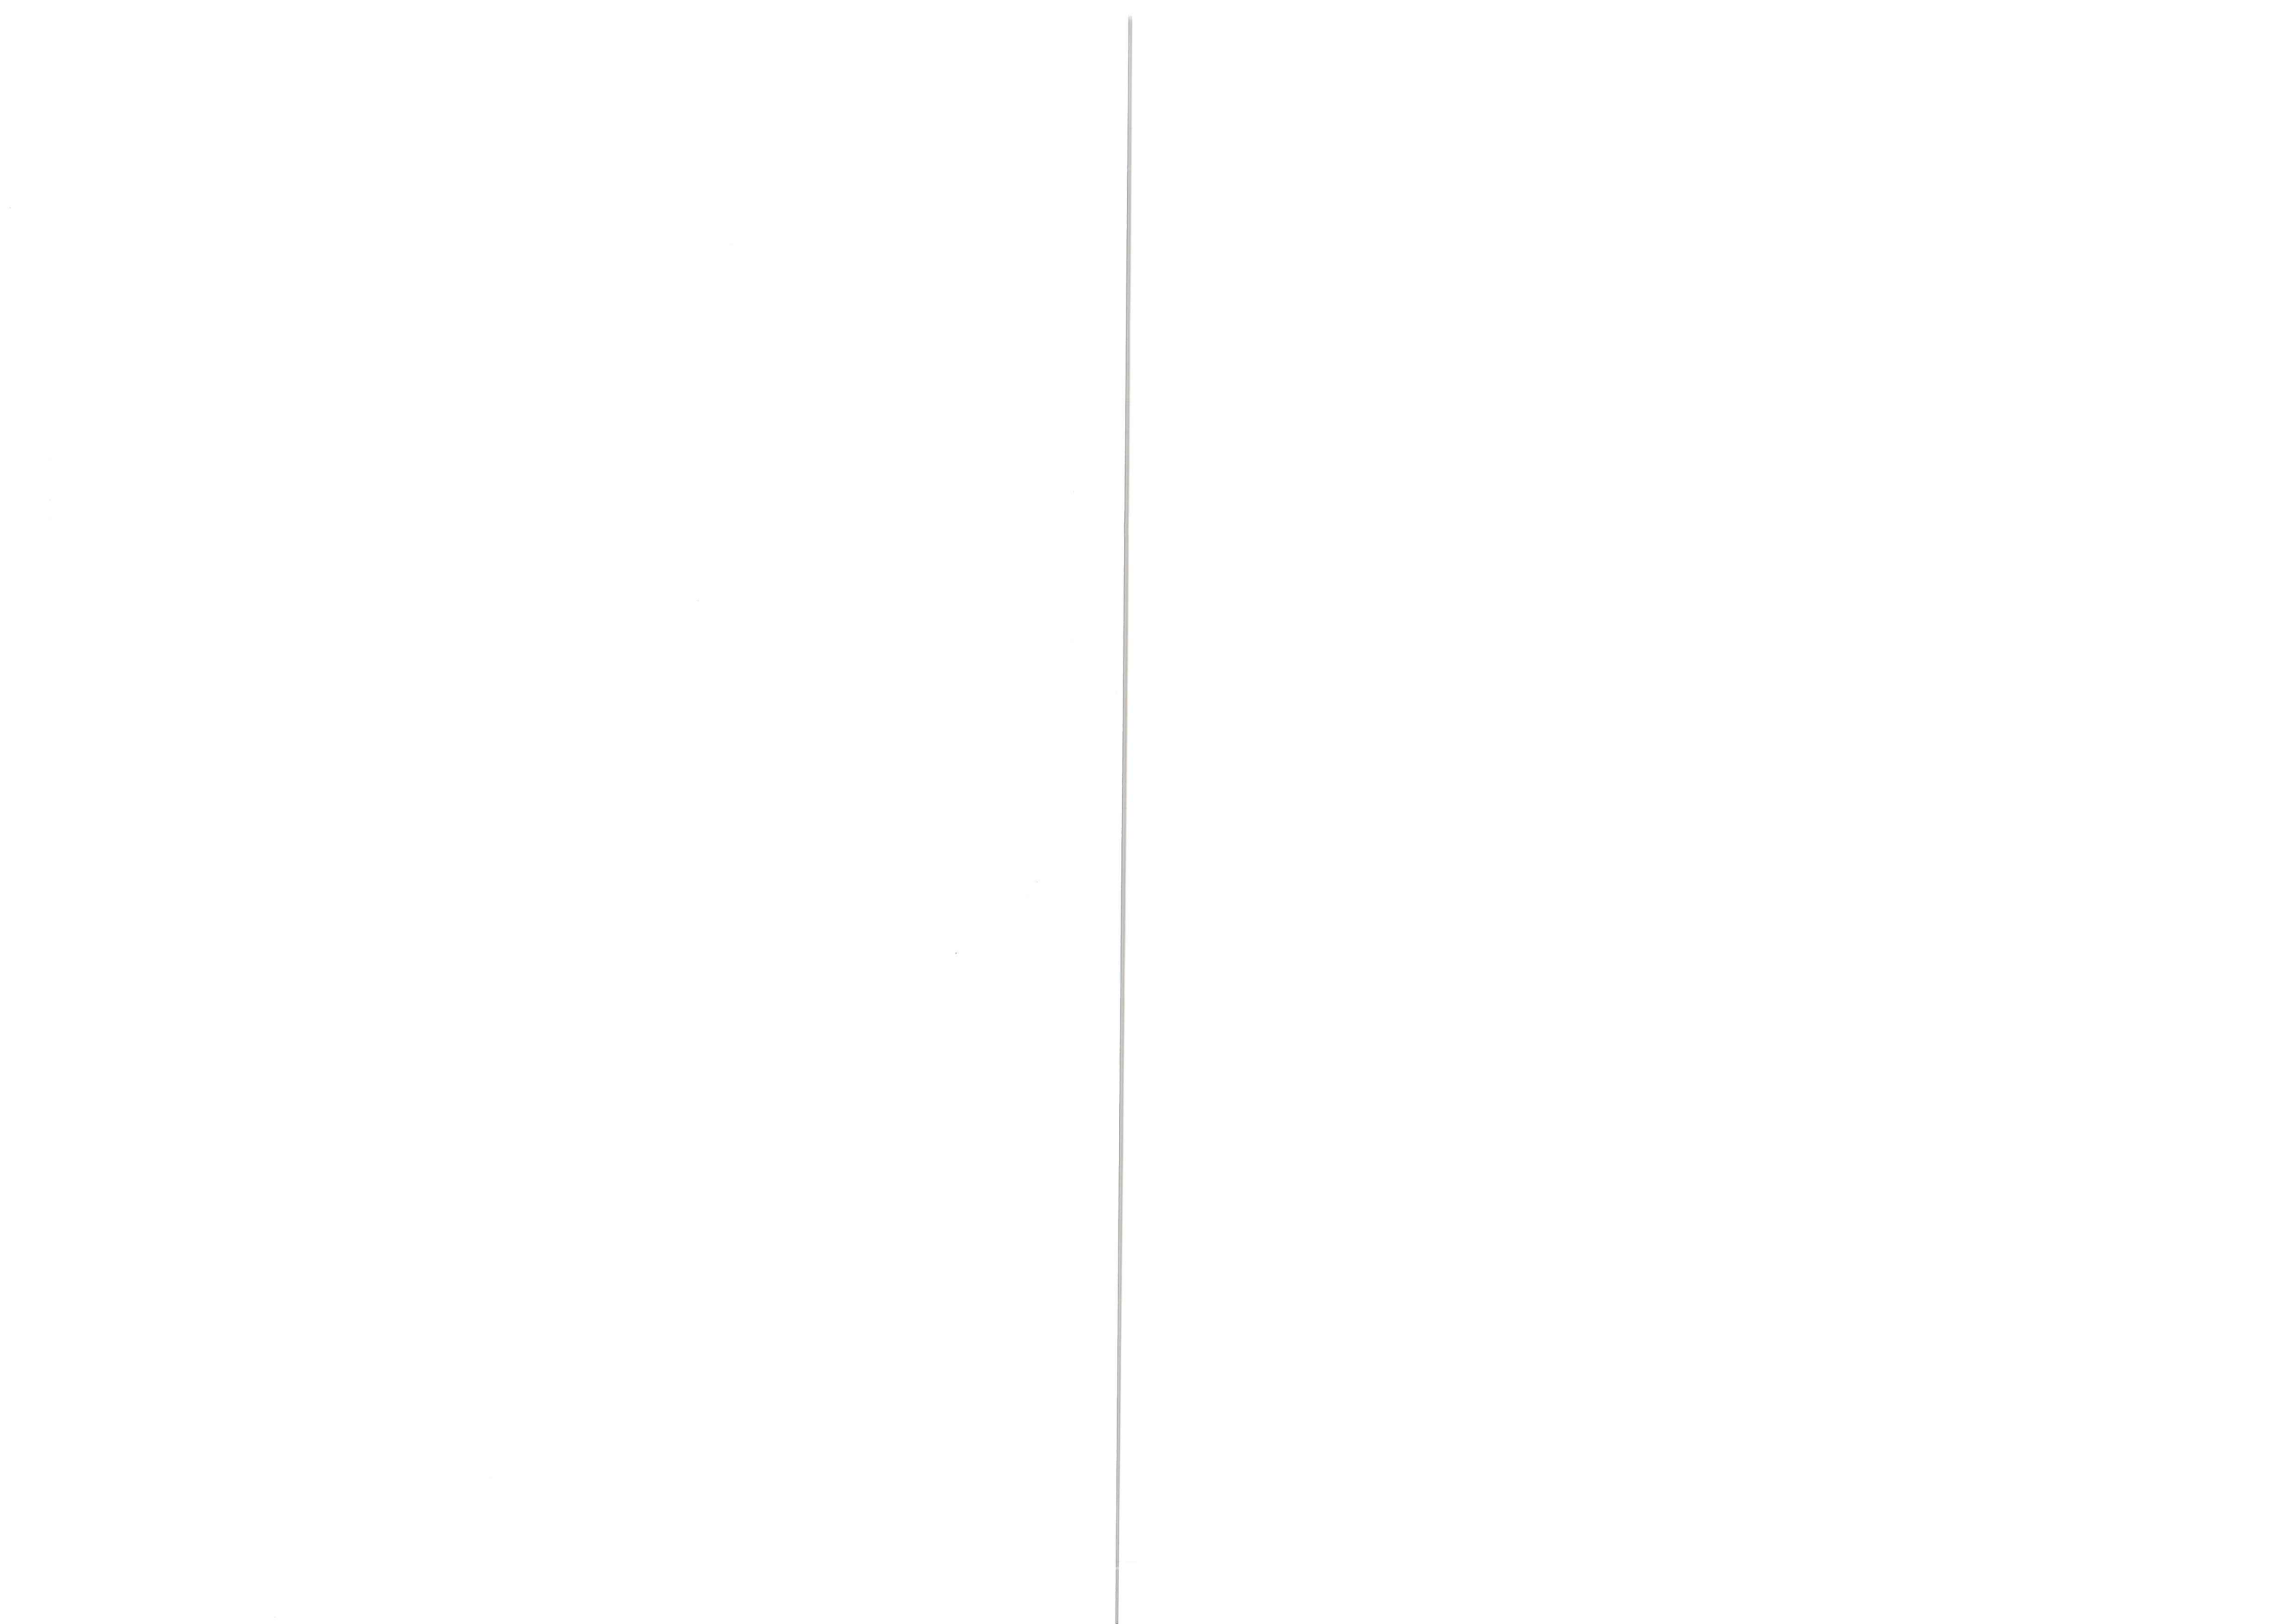

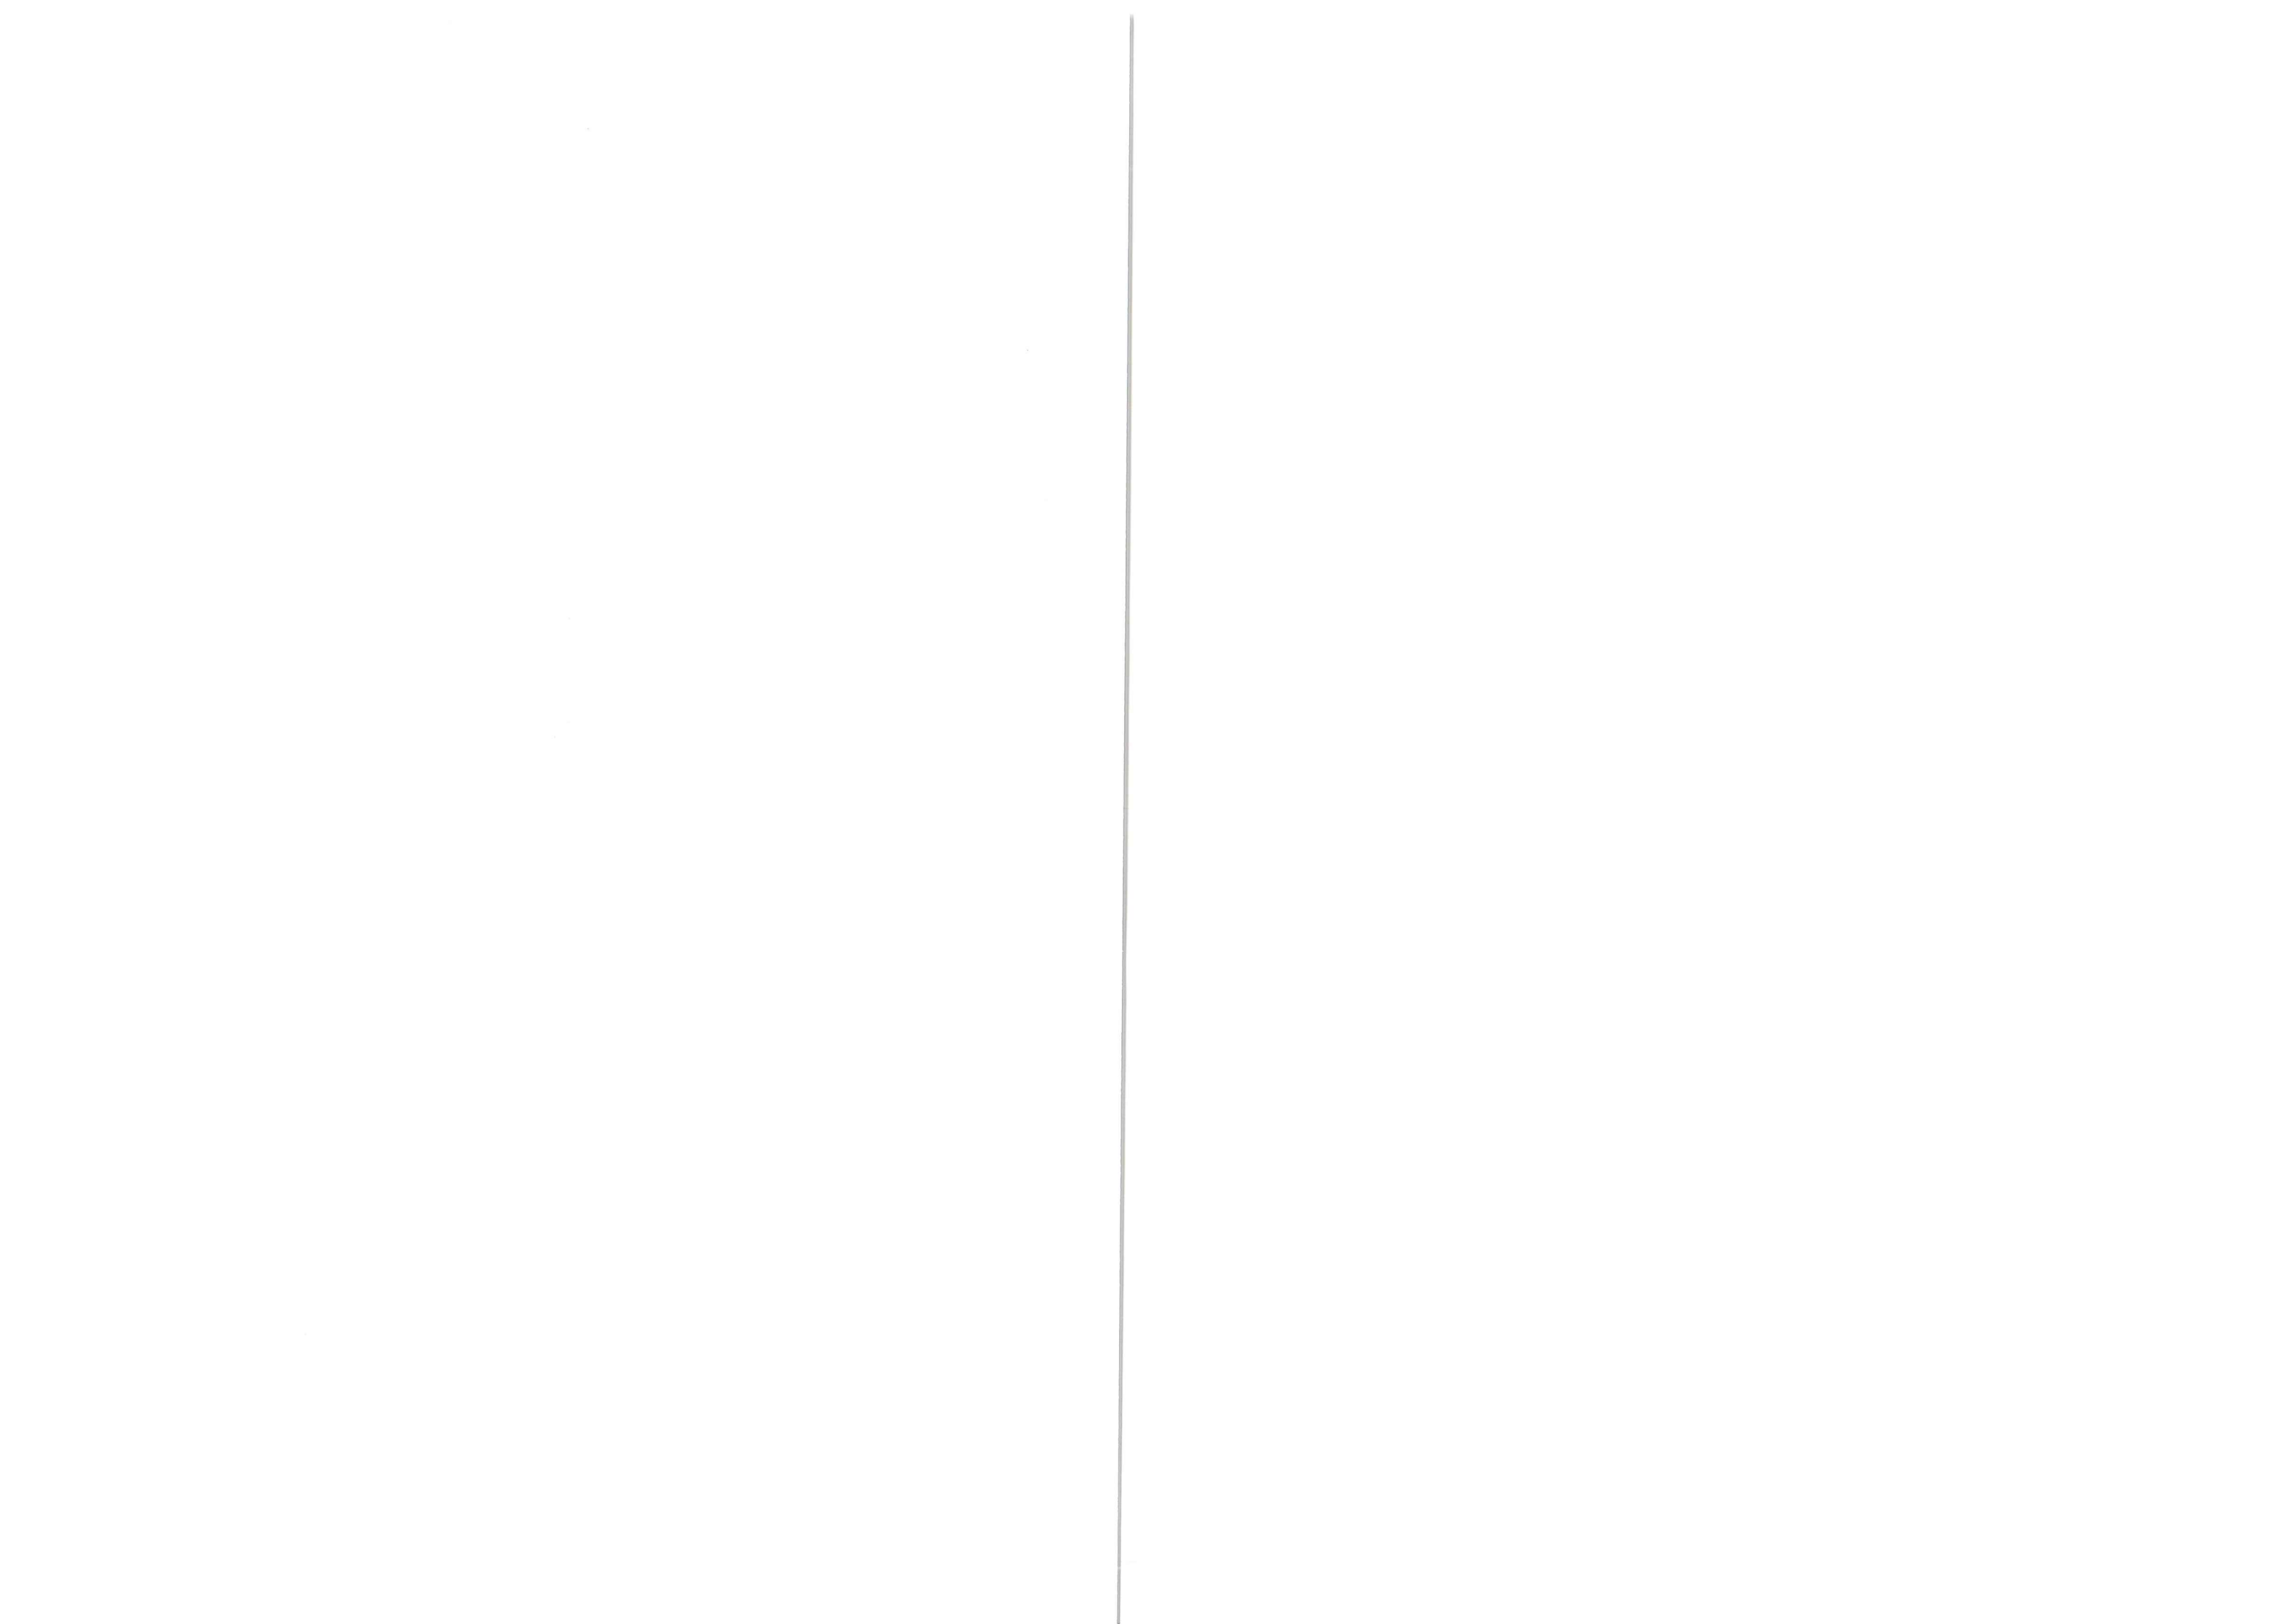


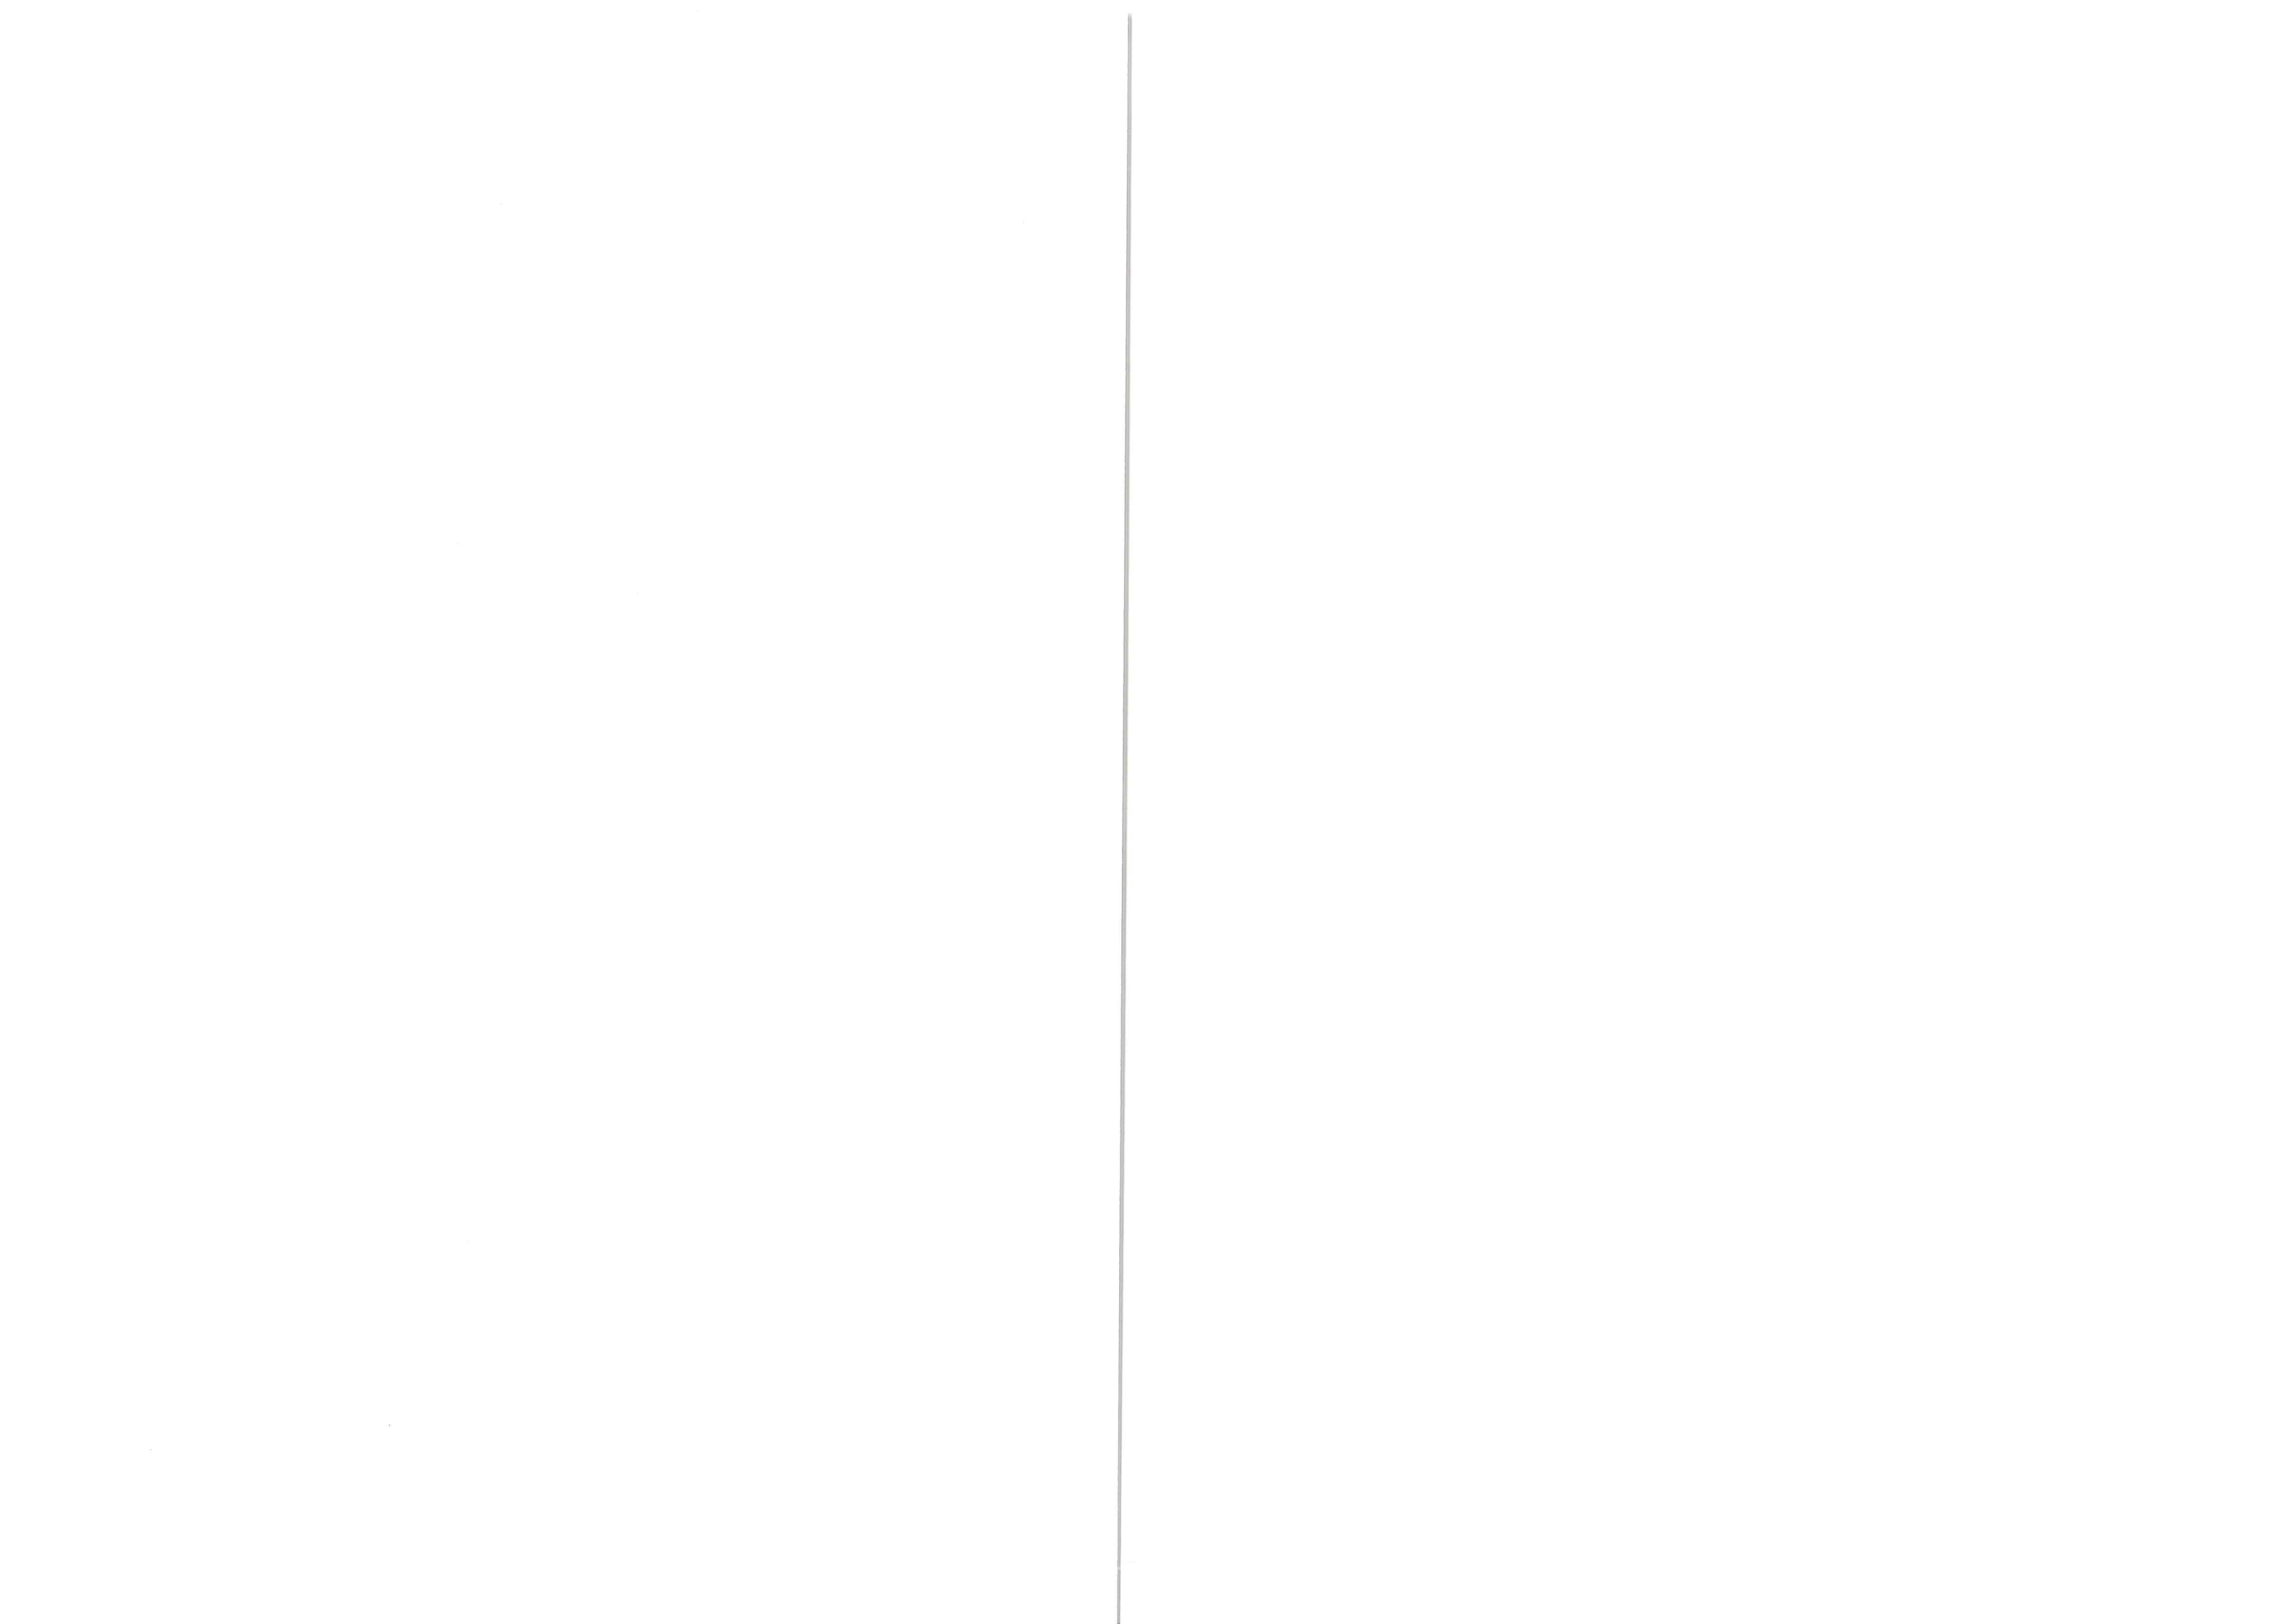


SP1 – SPEVĚNÁ PLOCHA

- ASfaltový betón AC 11 R8Jr. 40mm
- PROSTŘEDNĚ ZHŮBNÝ SPROVIVÁČ PS 0,7 kg/m³Jr. 50mm
- ASfaltový betón AC 22 P 8Jr. 50mm
- PROSTŘEDNĚ ZHŮBNÝ ASFALTOVÝ PS 0,7 kg/m³Jr. 100mm
- KAMENNO SPONOVANÉ ČERHOTOVÉ ČERNÉ GU 10Jr. 50mm
- STŘEDNĚ ZHŮBNÁ S 31 ŠDJr. 50mm
- PŘÍRODNÍ TERČNA


REZ 4 - VZOROVÝ REZ ZDRUŽENÝCH CHODNÍKŮM PŘE CHODCOV A CYKLISTOV PŘI STAV. OBJEKTE

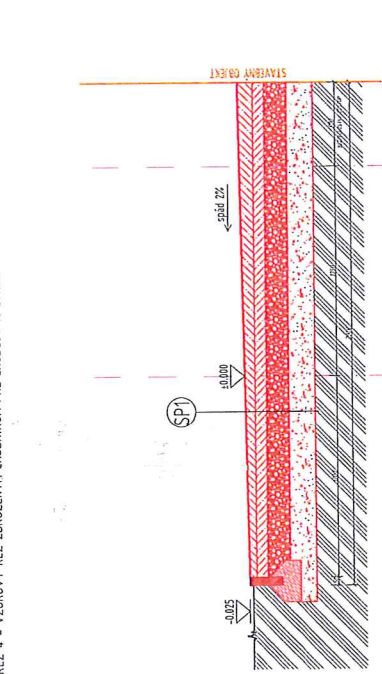


REZ 5 - VZOROVÝ REZ ZDRUŽENÝCH CHODNÍKŮM PŘE CHODCOV A CYKLISTOV Š. 3m V MÍSTĚ VJAZDU

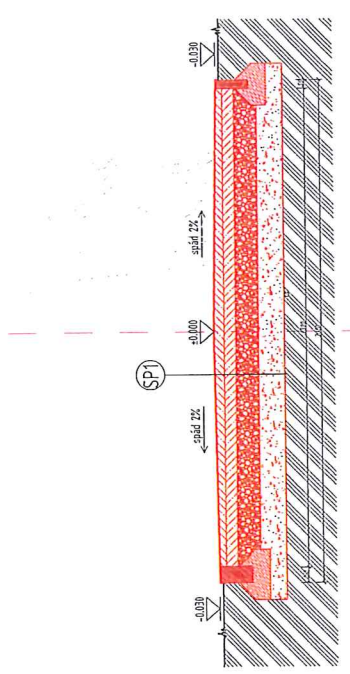


REZ 1 - VZOROVÝ REZ CYKLOTRASOU



REZ 2 - VZOROVÝ REZ CYKLOTRASOU Š. 2,5m V MÍSTĚ VJAZDU





REZ 3 - VZOROVÝ REZ ZDRUŽENÝCH CHODNÍKŮM PŘE CHODCOV A CYKLISTOV



Projekt stavby pre stavebné konanie	
CYKLOTRASA - III. ETAPA, VEĽKÉ ÚJANY	
Stavba Building	
Objekt Part of the	
Miesto stavby Area	INZ-0003, 0007 INZ-0004, 0005, 0006, 0008
Investor Building	OBEC VEĽKÉ ÚJANY
Stavba Projektant Chief Architect	Kováč Architects s.r.o. Súľská 10, 020 01, Čičava, SR IČO: 47323222
Projektant Designer	Ing. Zoltán Zeman, s.l. Kováč Architects s.r.o. Súľská 10, 020 01, Čičava, SR IČO: 47323222
Stavbu Projektant Approved by	Ing. Zoltán Zeman, Ing. Zoltán Zeman Kováč Architects s.r.o. Súľská 10, 020 01, Čičava, SR IČO: 47323222
Stavbu Projektant Completed by and signed	Ing. Zoltán Zeman, Ing. Zoltán Zeman Kováč Architects s.r.o. Súľská 10, 020 01, Čičava, SR IČO: 47323222
VZOROVÉ PRIEČNE REZY	
Etáž Level	Archívne číslo Arch. No.
PS - SK	04
Profesia Profession	Formát Format
DOPRAVA	A4/A4
Revízia Revision	1:50 1:100/1:1

Podľa zákona o autorských právach je bez súhlasu autora zakázané akékoľvek šírenie alebo kopírovanie tohto projektu. Tento projekt je vypracovaný ako PROJEKT PŘE STAVEBNÉ KONANIE. Nepreberáme zodpovednosť za jeho použitie na iný ako tento účel.

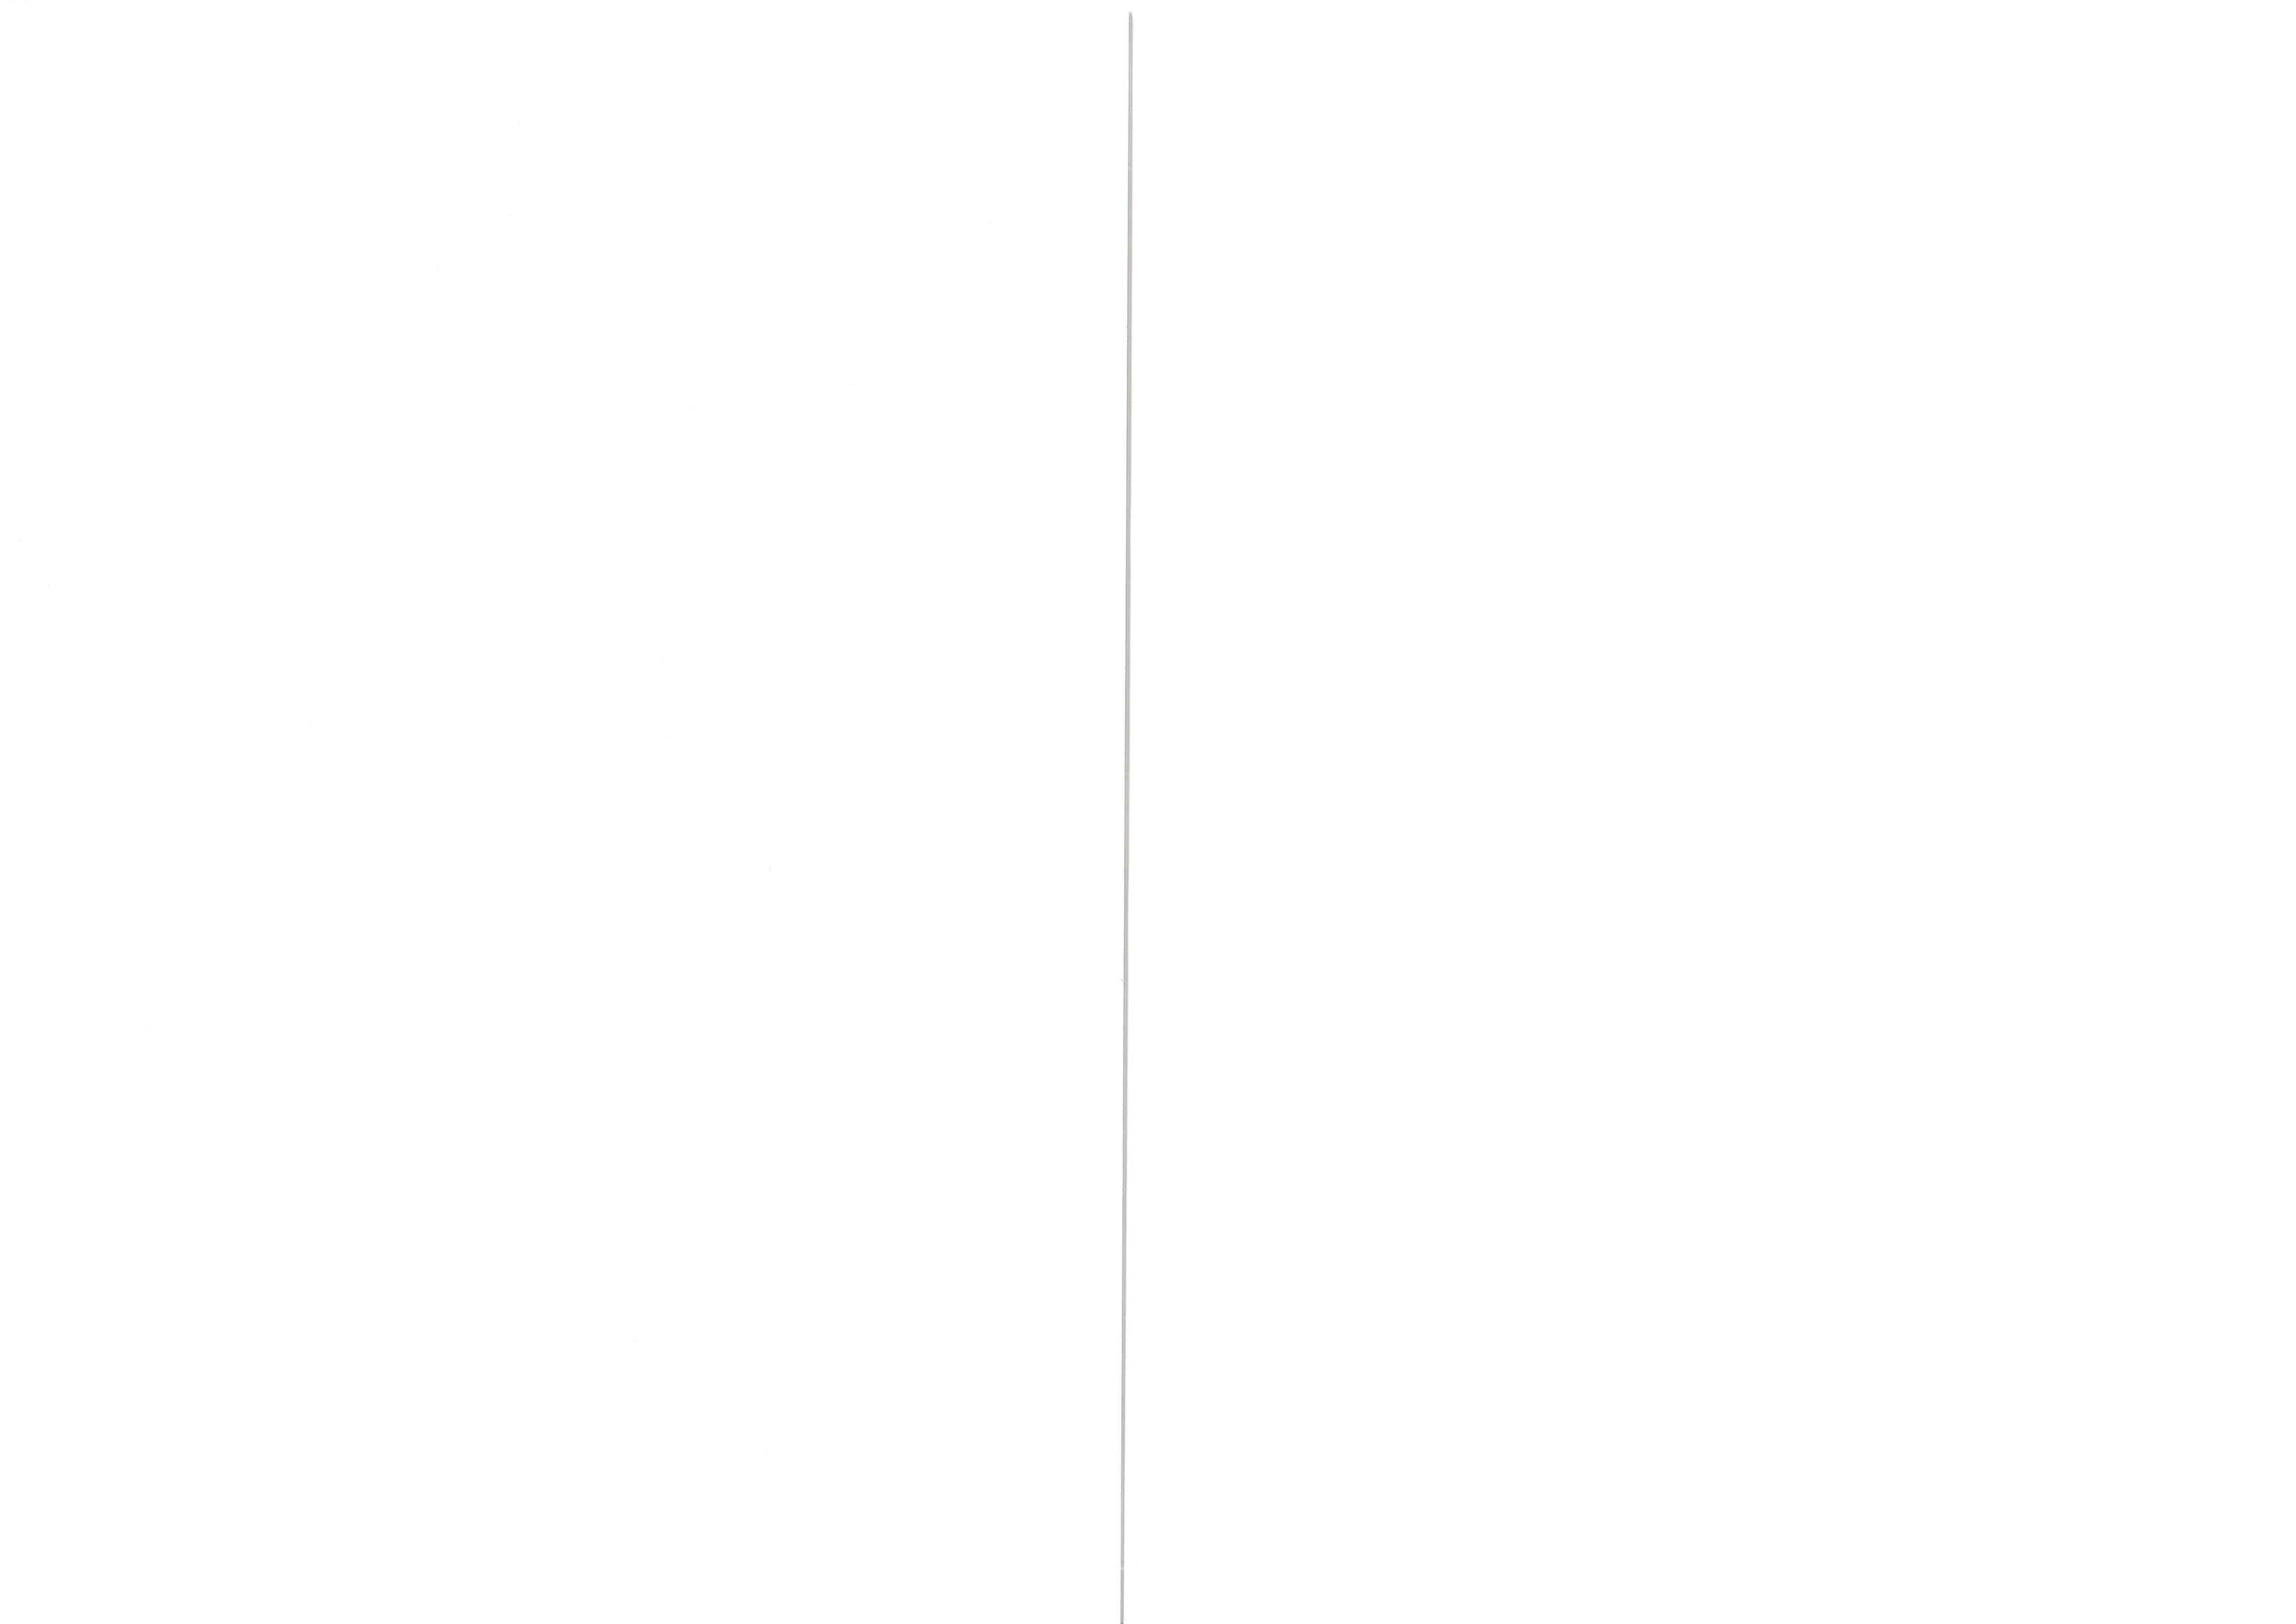

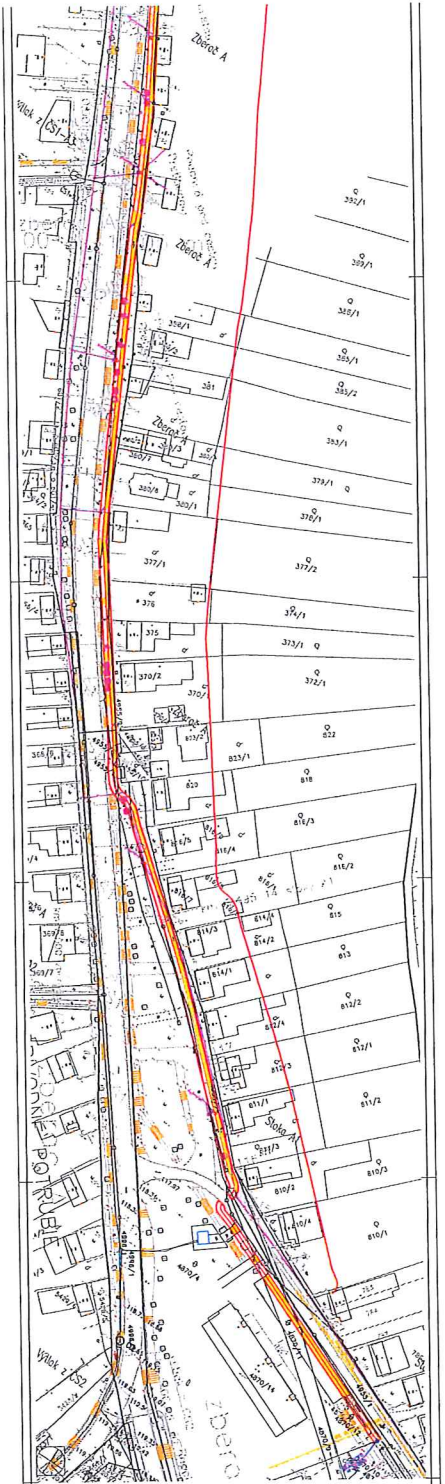


- LEGENDA**
- 1. Línea de demarcación de la zona
 - 2. Línea de demarcación de la parcela
 - 3. Línea de demarcación de la manzana
 - 4. Línea de demarcación de la calle
 - 5. Línea de demarcación de la vía pública
 - 6. Línea de demarcación de la vía privada
 - 7. Línea de demarcación de la vía de servicio
 - 8. Línea de demarcación de la vía de acceso
 - 9. Línea de demarcación de la vía de salida
 - 10. Línea de demarcación de la vía de entrada
 - 11. Línea de demarcación de la vía de salida
 - 12. Línea de demarcación de la vía de entrada
 - 13. Línea de demarcación de la vía de salida
 - 14. Línea de demarcación de la vía de entrada
 - 15. Línea de demarcación de la vía de salida
 - 16. Línea de demarcación de la vía de entrada
 - 17. Línea de demarcación de la vía de salida
 - 18. Línea de demarcación de la vía de entrada
 - 19. Línea de demarcación de la vía de salida
 - 20. Línea de demarcación de la vía de entrada


PROYECTO: Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.

SITUACIÓN: Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.

PROYECTO: Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.

PROYECTO	Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.
SITUACIÓN	Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.
PROYECTO	Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.
SITUACIÓN	Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.
PROYECTO	Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.
SITUACIÓN	Edificio para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios.

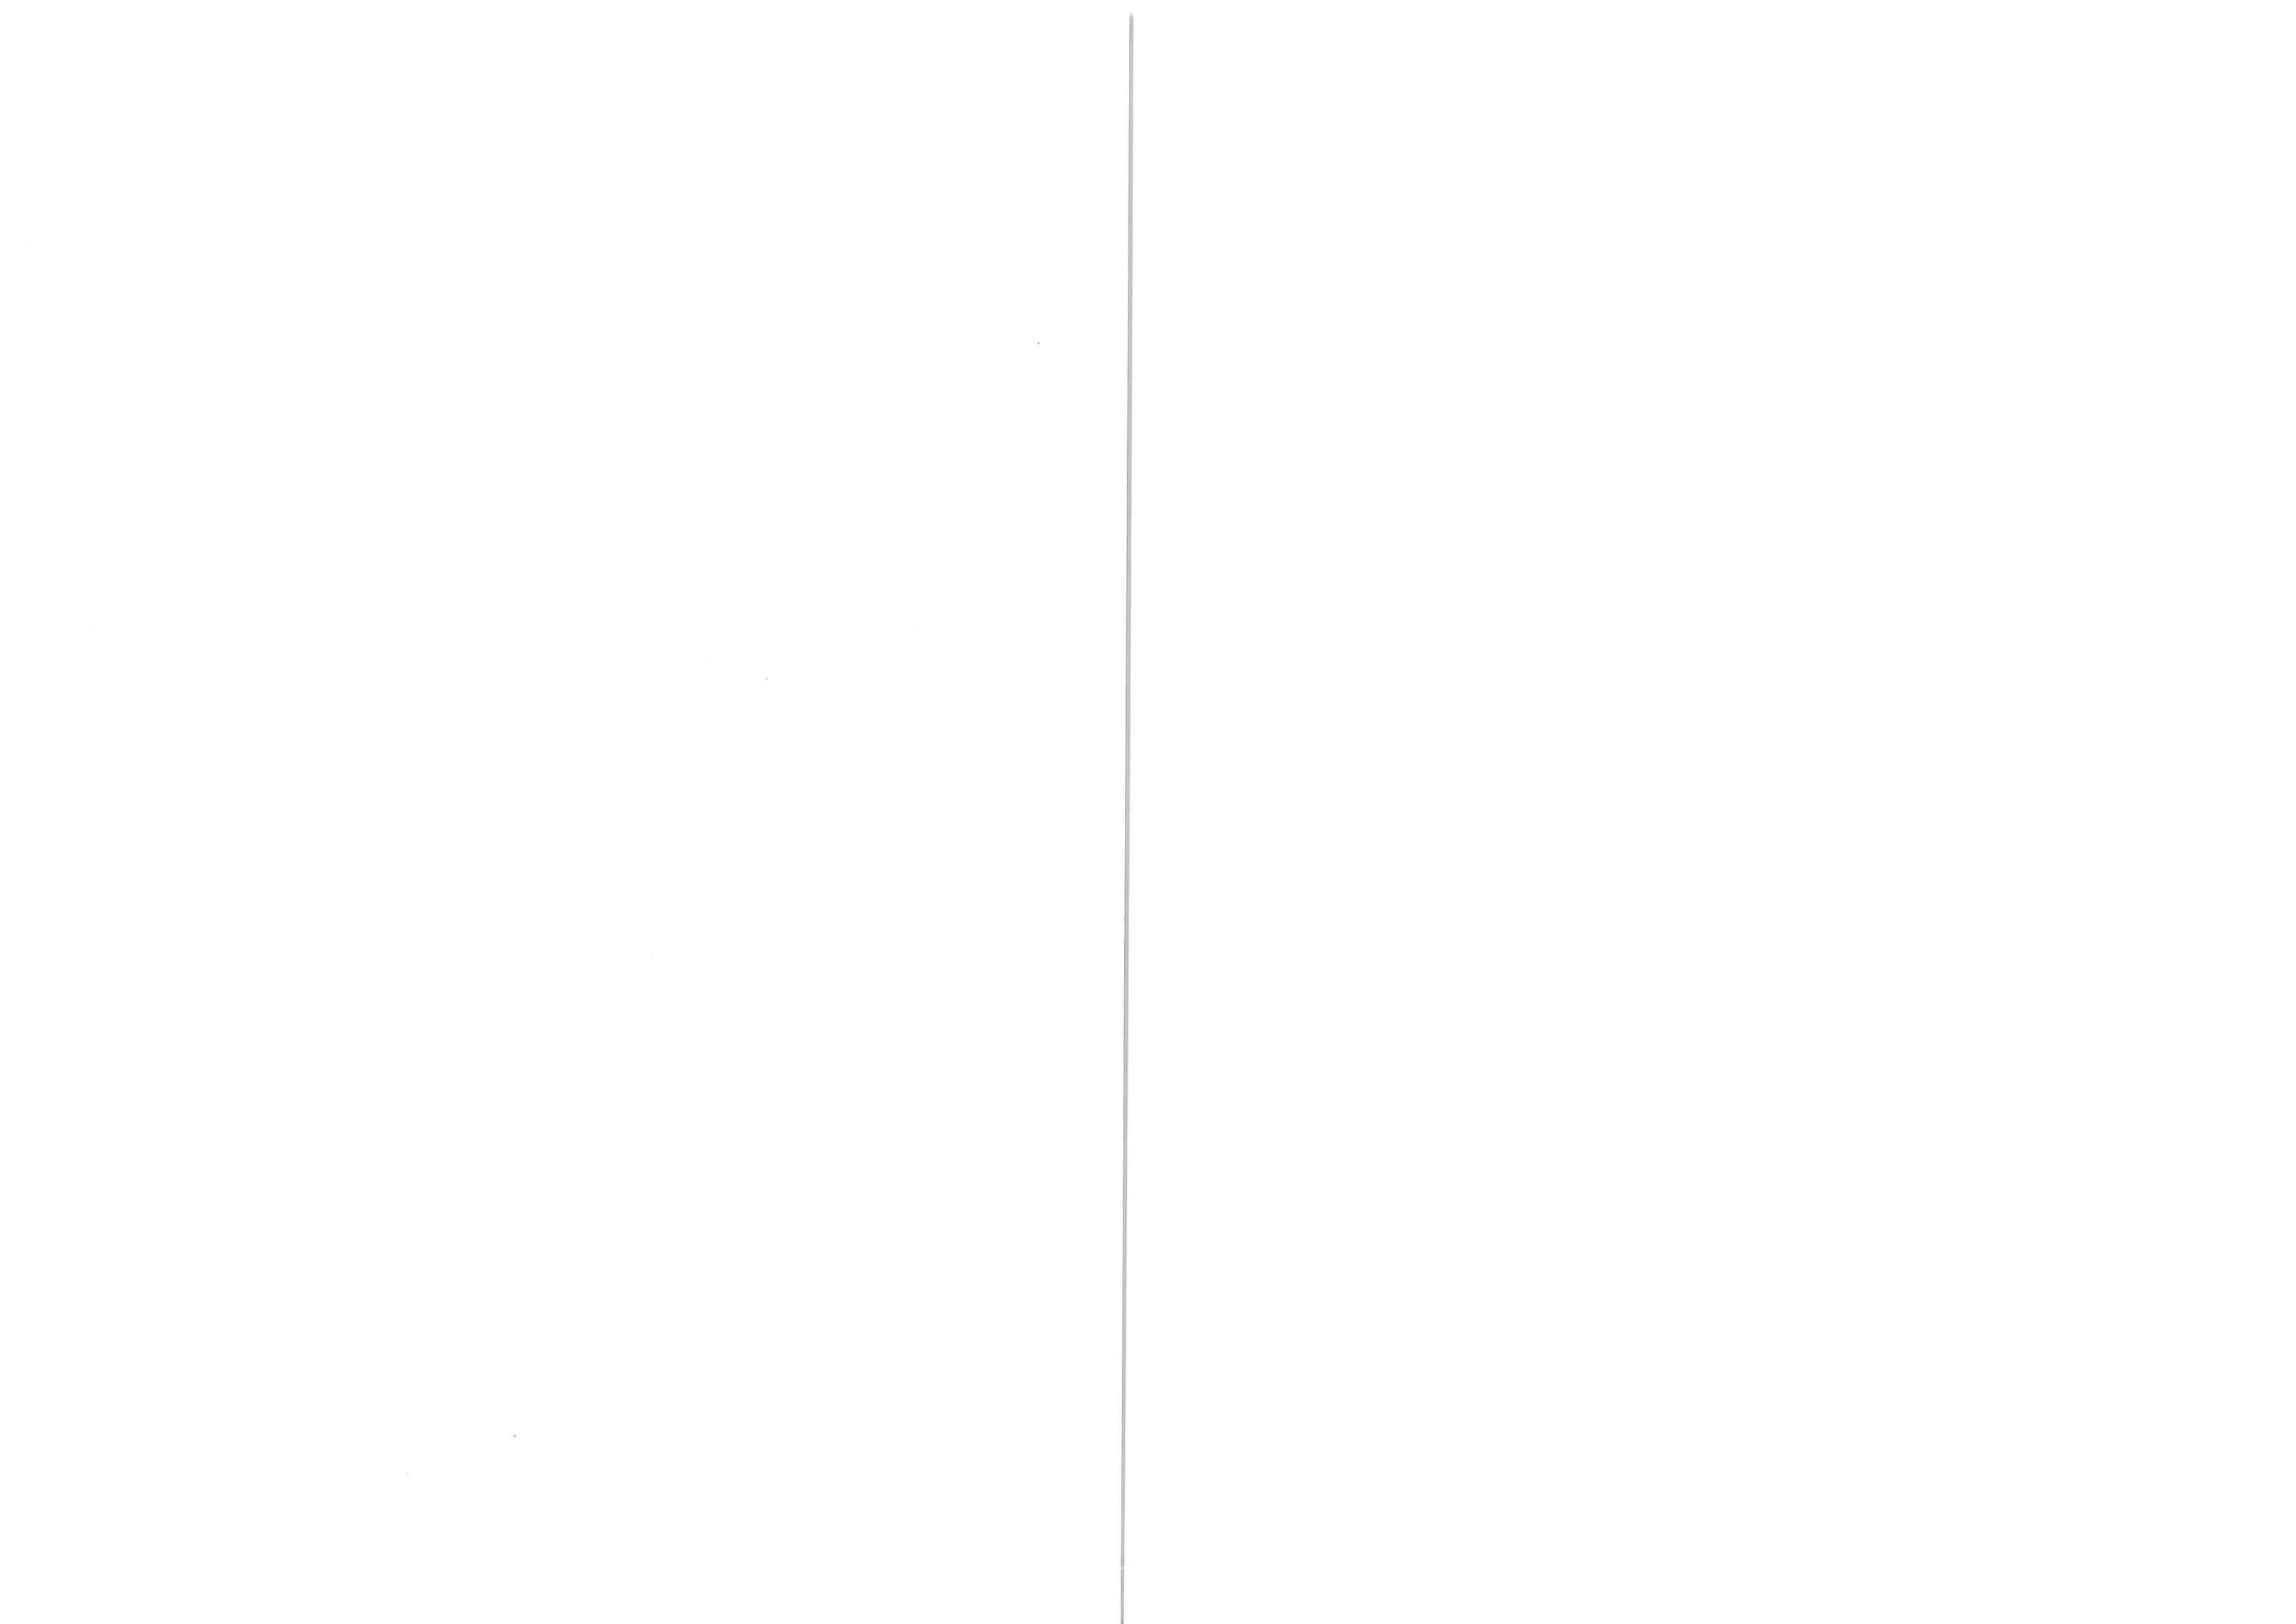

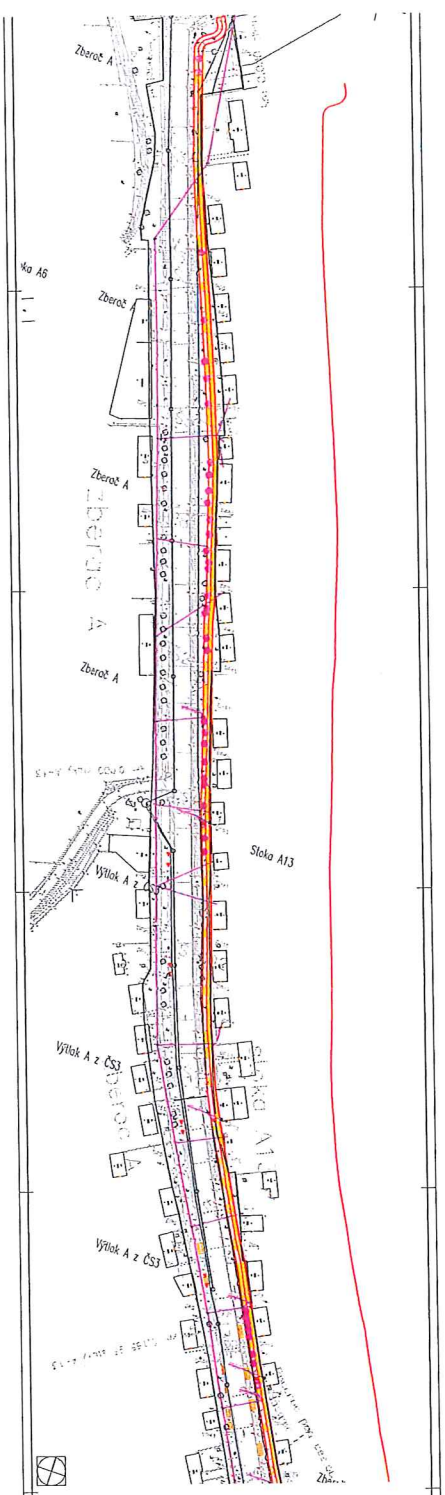

- LEGENDA
- 1. Stĺk
 - 2. Výtok
 - 3. Zberok
 - 4. Prázdny výtok
 - 5. Prázdny zberok
 - 6. Prázdny stĺk
 - 7. Prázdny výtok
 - 8. Prázdny zberok
 - 9. Prázdny stĺk
 - 10. Prázdny výtok
 - 11. Prázdny zberok
 - 12. Prázdny stĺk
 - 13. Prázdny výtok
 - 14. Prázdny zberok
 - 15. Prázdny stĺk
 - 16. Prázdny výtok
 - 17. Prázdny zberok
 - 18. Prázdny stĺk
 - 19. Prázdny výtok
 - 20. Prázdny zberok

Projekt stavby pre Bratislavu	
Stavba: Bratislava - Banská	
Práca: Bratislava - Banská	
Miesto: Bratislava - Banská	
Mierka: 1:1000	
Dátum: 15.12.2010	
Autor: Ing. J. ...	
Schválil: Ing. J. ...	
Projektant: ...	
Staviteľ: ...	
Financiar: ...	
Zmlouva: ...	
Príloha: ...	
Záver: ...	
Poznámky: ...	

